

Zhotoviteľ:

ZIP P BRATISLAVA spol. s r.o.

Mlynské nivy 61/A

820 15 Bratislava

IČO: 31355161 DRČ: 2 020 379 691

IČ DPH: SK2020379691

Bankový ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2622005155/1100



Faktúra č.:

1191150005

Konštantný symbol:

0308

Objednávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Štefánikova 1780

031 80 Liptovský Mikuláš

 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
 SPOLOČNOSŤ, a.s.
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Došlo: 15-06-2011

Číslo: 2727

Pril.:

Príloha: 90 dní od doručenia Objednávateľovi

Obchodný reg: Okresný súd Bratislava I.

Oddiel: Sro

Vložka č.: 5475/B

IČO: 36 672 441

DRČ: 2 022 236 557

IČ DPH: SK2022236557

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV VÝCHODNÁ

Kód ITMS: 24110110046

NS 809/ZAAB

Deň splatnosti

Forma úhrady

p.p.

Dátum vyhotovenia

10.6.2011

Dátum dodania tovaru/služby

31.5.2011

Projekt: Kanalizácia a ČOV Východná

Zmluva: Kanalizácia a ČOV Východná
Zmluva o dielo 09/2010

V zmysle Zmluvy o dielo č. 09/2010 zo dňa 1.10.2010 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.5.2011 do 31.5.2011 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác".

Cena bez DPH	565 903,76 €
Základ pre DPH	565 903,76 €
DPH 20%	113 180,75 €
Cena s DPH	679 084,51 €
Zádržné 10%	56 590,38 €
K úhrade bez DPH	509 313,38 €
DPH 20%	113 180,75 €
K úhrade celkom s DPH	622 494,13 €

Zhotoviteľ:

Dátum:

 Konateľ spoločnosti a riaditeľ
 podnikateľskej oblasti Pozemné a
 inžinierske stavitelstvo CZ/SK

Ing. Juraj Hirner

Razítko:



Podpis:

 ZIP P BRATISLAVA spol. s r.o.
 Mlynské nivy 61/A
 SK - 820 15 Bratislava
 IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161
 - 18 -
Stavebný dozor:

Dátum:

9.6.2011

Hlavný inžinier stavby
Ing. Pavel Klein

Razítko:



Podpis:

Objednávateľ:

Dátum:

15-6-2011

Projektový manažér
p. Ján Bendík

Razítko:



Podpis:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“

MESAČNÁ SPRÁVA

Za obdobie od 1.5.2011 – 31.5.2011



Vydané dňa 6.6.2011



ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161
- 133 -

Ing. Juraj Comorek
PMS

IČ pre DPH :SK 2020379691
DIČ: 2020379691
IČO: 313 55 161

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.5475/B

TEL: 00421-2-3262 2324
FAX: 00421-2-3262 3331
<http://www.zipp.sk>
E-mail: info@zipp.sk



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“
MESAČNÁ SPRÁVA

Obsah

- a) Postup prác
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná)
Projekt
Dokumentácia zhotoviteľa
Vzorky a atesty
Výroba
Stavebné práce
Časový harmonogram
- b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok IV., bod 15, položka b)
- c) Výroba technologických zariadení a materiálov
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná)
- d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná)
- e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok V., bod 7)
- f) Zmeny nároky objednávateľa, a Nároky zhotoviteľa
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná)
- g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok XII., bod 1)
- h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok IV., bod 15, položka c)
- k) Výsledky predpísaných a úspešne vykonaných skúšok
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok IV., bod 15, položka d)
- l) Výsledky monitoringu gravitačných stôk priemyselnou kamerou vrátane vyhodnotenia sklonu
(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok IV., bod 15, položka e)

127



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“

a) Postup prác

(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná)

Projekt:

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa **20.12.2010 uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska. Dňa 06.12.2010** obdržal stavebný dozor pokyn k začatiu prác na uvedenej stavbe.

Dokumentácia zhotoviteľa:

Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná **realizačná projektová dokumentácia** pre daný projekt.

- v sledovanom mesiaci boli dodané ďalšie revízie RPD

Vzorky a atesty:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a atestov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek objednávateľa.

Výroba – realizácia prác:

V priebehu sledovaného obdobia bola realizovaná práce na:

SO 01 Kanalizácia obce Hybe – Zberač A . Konkrétne na pod objektoch.:

SO 01.1 Gravitačné potrubie zberač A – bolo vykonaná pokládka kanalizácie od KŠ 10 po KŠ 20, odstránenie ornice, výkop, drenáž, lôžko, pokládka potrubia PVC DN 300 korug., obsyp, zásyp zo zhutnením, osadenie KŠ, podbetonávka, odvoz zeminy na skládku. Boli zrealizované 3 križovania cez vodný tok Hybica.

SO 02 Kanalizácie obce Východná. Konkrétne na pod objektoch.:

SO 02.1 Gravitačné potrubie – bolo vykonaná pokládka kanalizácie na stokách B4, A0, C2 a zberači B, odstránenie ornice, asfaltov, ŠD, výkop, drenáž, lôžko, pokládka potrubia PVC DN 300 korug., obsyp, zásyp zo zhutnením, osadenie KŠ, podbetonávka, odvoz zeminy na skládku.

SO 02.5 Domové kanalizačné prípojky – bolo zrealizovaných 7 ks kanalizačných prípojk – komplet.

SO 04 Výtlačné potrubie Východná - Hybe

SO 04.1 Výtlačné potrubie Východná – Hybe – boli realizované práce na čistiacich šachtách.

SO 05 ČOV Hybe. Konkrétne na pod objektoch.:

SO 05.2 Vstupná ČS – bola urobená betonáž dna vstupnej ČS

SO 05.4 Združený objekt čistenia – bola zabetónovaná prvá etapa stien nádrže združeného objektu čistenia. Osadené prestupy do stien nádrže.

SO 05.13 Vonkajšie rozvody NN, VN prípojky a trafostanica – bola zrealizovaná komplet prípojka VN, vrátane napojenia na distribučnú sieť a komplet zrealizovaná Trafostanica v areály ČOV.

Časový harmonogram:


V priebehu mesiaca 12/2010 Zhotoviteľ v súlade s čl. III., bod 6 podmienok zmluvy o dielo predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác – revízia č. 00.

Stavebný dozor napísal svoje pripomienky k predloženému harmonogramu, ktoré boli následne zapracované do Harmonogramu prác – revízia č.01

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok IV., bod 15, položka b)

Príloha č.1 – fotodokumentácia postupu prác



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná)

Počas sledovaného obdobia **nebola** výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná)

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci	1. týždeň /22. kal. týždeň/	2. týždeň /23. kal. týždeň/	3. týždeň /24. kal. týždeň/	4. týždeň /25. kal. týždeň/	5. týždeň /26. kal. týždeň/
-	Máj 2011				
Riadiaci pracovníci na stavbe	3	3	3	3	3
Projekt manažéri	1	1	1	1	1
Geodeti	2	2	2	2	2
Ostatní kvalifikovaní pracovníci	5	5	5	5	5
R-pracovníci	30	30	35	35	35

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje	1. týždeň /13. kal. týždeň/	2. týždeň /14. kal. týždeň/	3. týždeň /15. kal. týždeň/	4. týždeň /16. kal. týždeň/	5. týždeň /17. kal. týždeň/
Zariadenia na rýpanie, vrátane drviča kameňa a betónu	6	6	7	7	7
Nákladný automobil na odvoz vykopaného materiálu	4	4	5	5	5
Odvodňovacie a čerpace zariadenia	4	4	5	5	5
Betonárky a domiešavače	-	-	-	6	-
Betónové pumpy a zariadenia na uskladnenie betónu	-	-	-	1	-
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie zariadenie	1	1	1	1	1
Zariadenia na zhutňovanie a valce	4	4	4	4	4
Zváracie zariadenia na spájanie polyetylénových rúr	1	1	1	1	1



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok V., bod 7)

V súlade s čl. V., bod 4 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a atestov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek objednávateľa.

f) Zmeny, Nároky objednávateľa a Nároky zhotoviteľa.

(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná)

V zmysle zápisov z kontrolných dní a výrobných výborov

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok XII., bod 1)

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** žiadna nehoda.

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia práce prebiehali v zmysle RPD a plánu BOZP.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok IV., bod 15, položka c)

Práce prebiehajú v zmysle predloženého harmonogramu.

k) Výsledky predpísaných a úspešne vykonaných skúšok

(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok IV., bod 15, položka d)

Skúšky prebehli v zmysle predloženého plánu kontroly kvality.

- skúška vodotesnosti potrubia a šachiet – bola vykonaná a následne protokol odovzdaný stavebnému dozoru a zástupcovi LVS, a.s.
- skúšky sadnutia betónu, pevnosti kocky a priepustnosti betónu boli vykonané pri betonáži za účasti stavebného dozoru. Protokoly budú dodané do 30 dní.
- skúšky únosnosti rýh boli vykonané podľa požiadavky stavebného dozora každých 100 m jedna skúška LDD. Protokoly boli odovzdané stavebnému dozoru a zástupcovi objednávateľa.

l) Výsledky monitoringu gravitačných stôk priemyselnou kamerou vrátane vyhodnotenia sklonu


(podľa zmluvy Kanalizácia a ČOV Východná, článok IV., bod 15, položka e)

V sledovanom období bol vykonaný monitoring gravitačnej kanalizácie na fakturovaných objektoch, s vyhodnotením sklonov – protokol bol odovzdaný stavebnému dozoru a zástupcovi LVS, a.s., zároveň bolo odovzdané CD TV monitoringu


Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“

Príloha :

- *Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.5.2011 (Príloha č.1)*

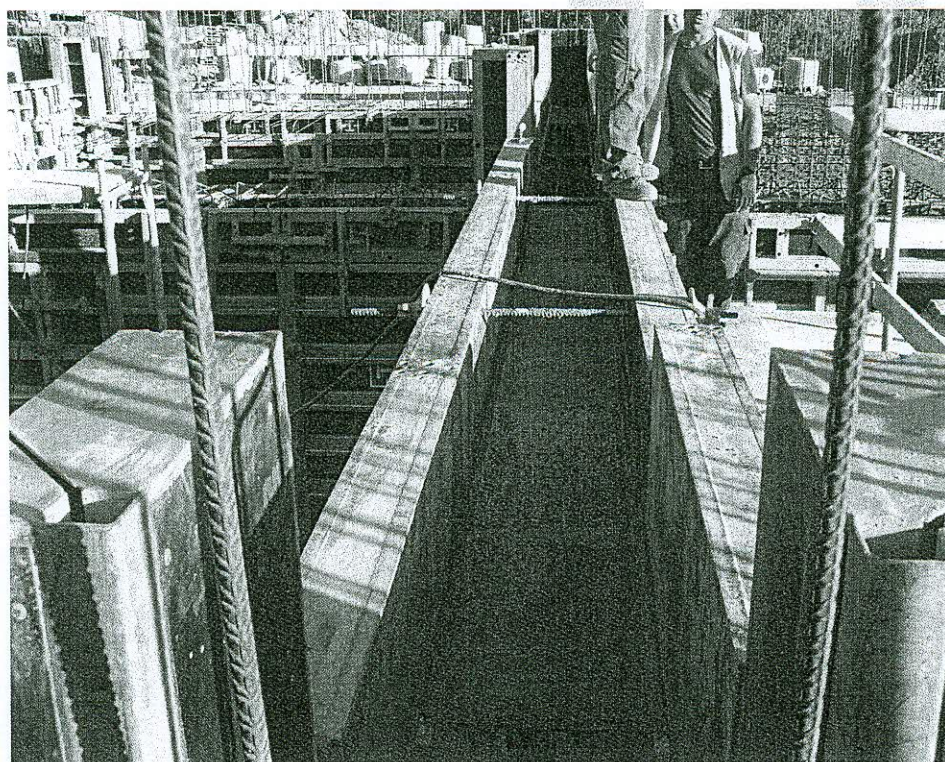



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“

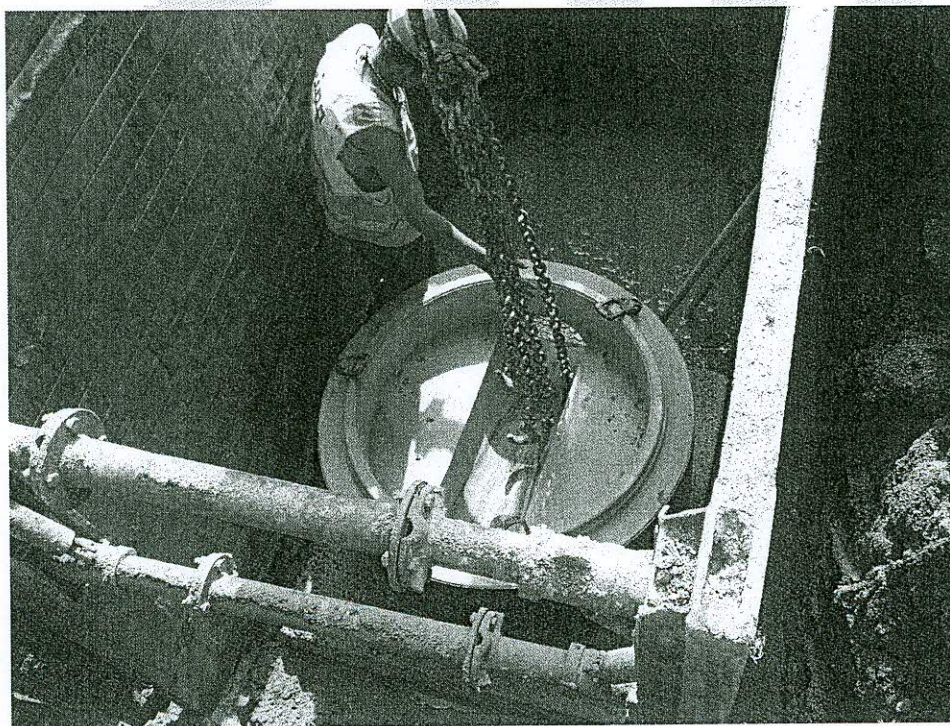

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“

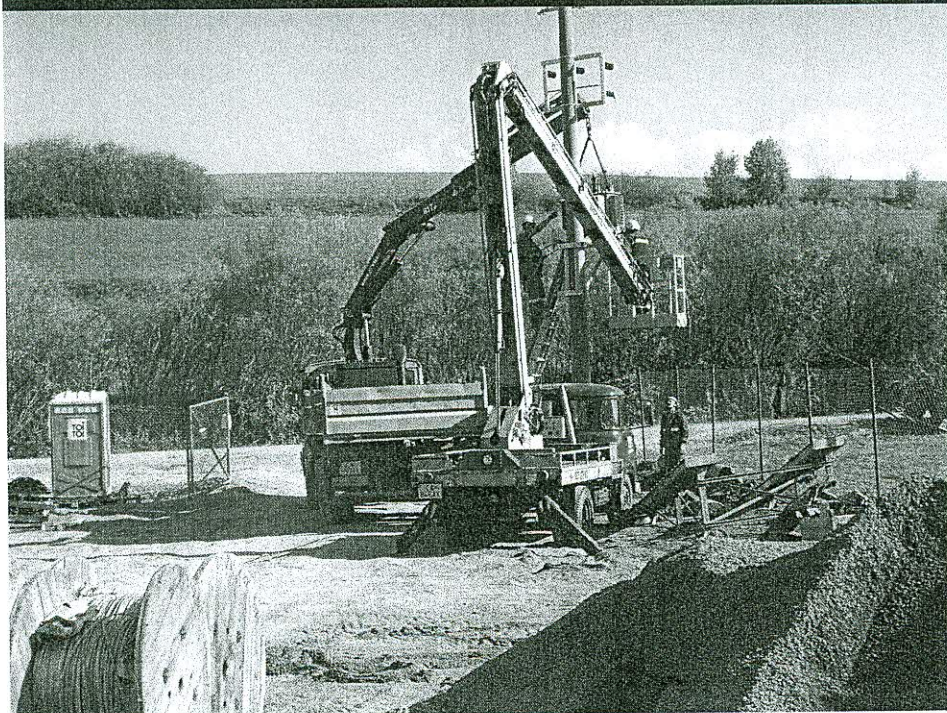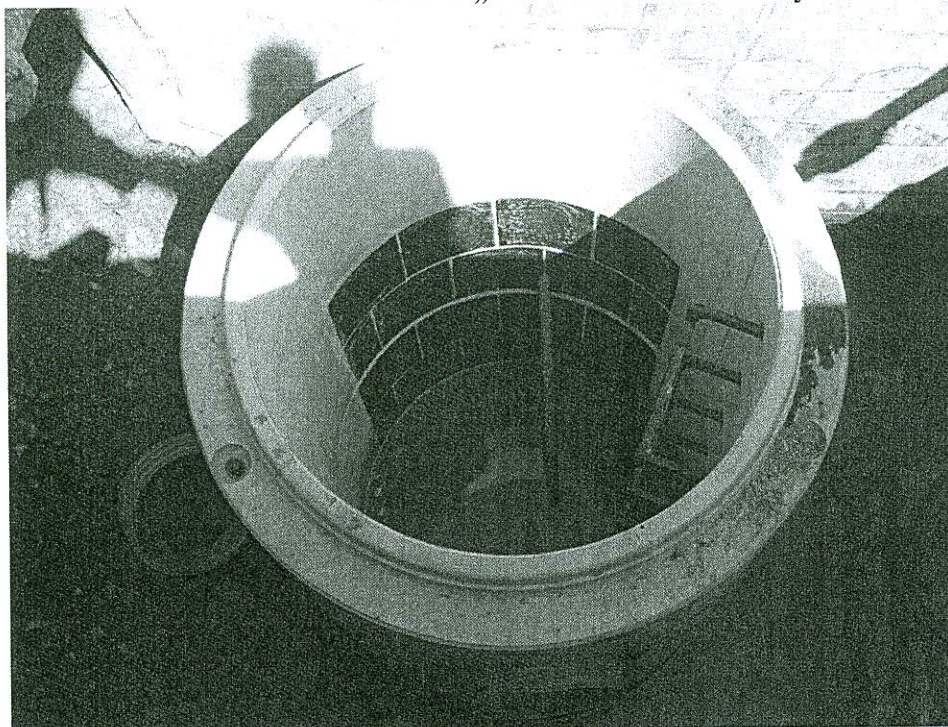

IČ pre DPH :SK 2020379691
DIČ: 2020379691
IČO: 313 55 161

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.5475/B



TEL: 00421-2-3262 2324
FAX: 00421-2-3262 3331
<http://www.zipp.sk>
E-mail: info@zipp.sk

27

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“

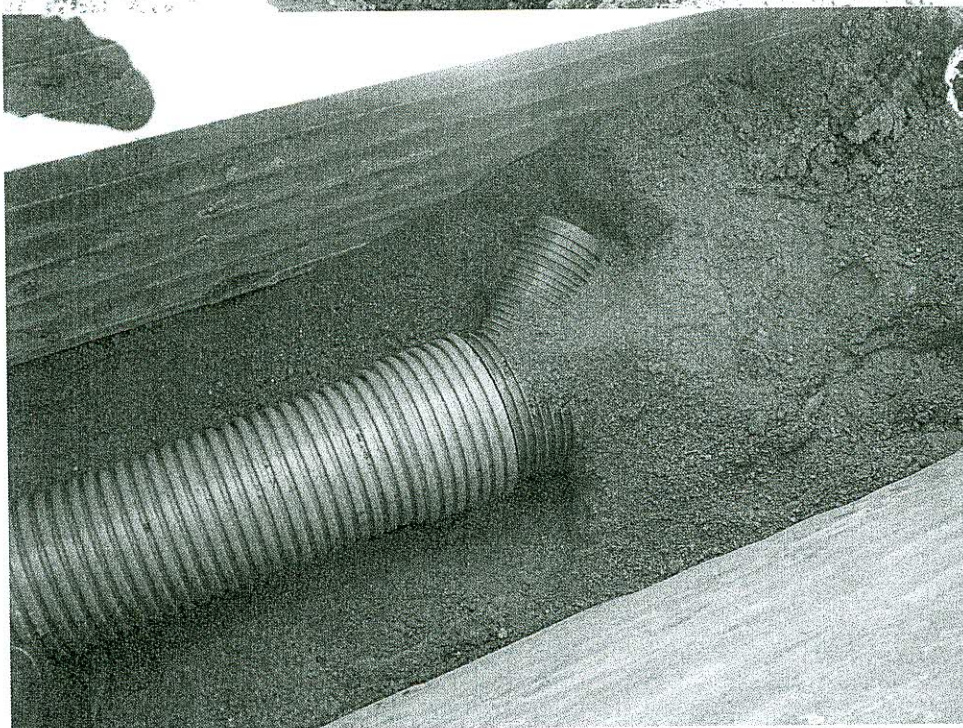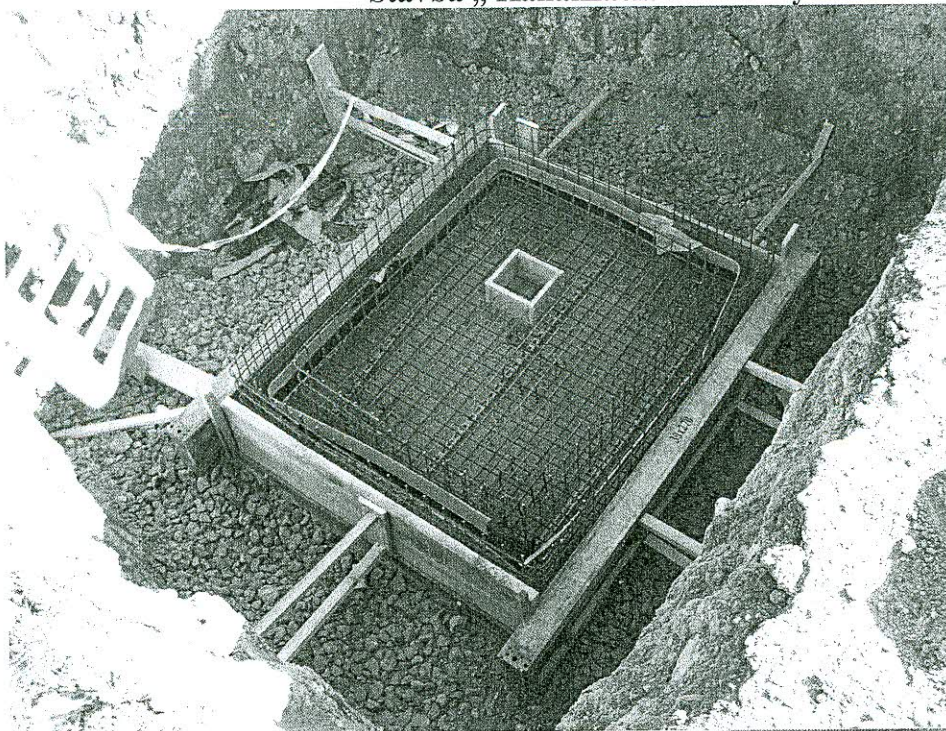

IČ pre DPH :SK 2020379691
DIČ: 2020379691
IČO: 313 55 161

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.5475/B

TEL: 00421-2-3262 2324
FAX: 00421-2-3262 3331
<http://www.zipp.sk>
E-mail: info@zipp.sk

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "K7" or similar, located at the bottom left of the page.

ZIPPP BRATISLAVA spol. s r.o
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“



IČ pre DPH :SK 2020379691
DIČ: 2020379691
IČO: 313 55 161

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.5475/B

TEL: 00421-2-3262 2324
FAX: 00421-2-3262 3331
<http://www.zipp.sk>
E-mail: info@zipp.sk

127

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava



Stavba „Kanalizácia a ČOV Východná“



IČ pre DPH :SK 2020379691
DIČ: 2020379691
IČO: 313 55 161

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.5475/B

TEL: 00421-2-3262 2324
FAX: 00421-2-3262 3331
<http://www.zipp.sk>
E-mail: info@zipp.sk

727
