

Faktúra č. 21104003

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel: Sa, vložka č. register: 339/B	FAKTÚRA číslo 21104003 Variabilný symbol : 21104003 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1760 13-05-2011 031 80 Liptovský Mikuláš Číslo: 215 Pril.: Prídelené ref.:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 08.08.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 10.05.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2011
--	--

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"
 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac apríl 2011
 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	220 768.62 EUR
DPH 20% :	44 153.72 EUR

Celkom s DPH:	264 922.34 EUR
---------------	----------------

Zádržné 10%:	22 076.86 EUR
--------------	---------------

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
 v plnej výške 22 076.86 EUR.

K úhrade bez DPH :	220 768.62 EUR
--------------------	----------------

K úhrade celkom s DPH:	264 922.34 EUR
------------------------	----------------

Akcia č.:212
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY –
 – ekologický podnik a.s.,
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 finančná účtárňa

12 Máj 2011

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 24 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

11-05-2011

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Štefánikova 1760, 031 80 Liptovský Mikuláš

MUDr. Alexander Sľafkovský
 predseda predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Kazár
 člen predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

© Datalock software

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Číslo faktúry:

21104003

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069

Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 949 452,97 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	102 266,35	220 768,62	323 034,97
3	zádržné EUR:	10 226,64	22 076,86	32 303,50
4	vyplatené zádržné EUR:	10 226,64	22 076,86	32 303,50
5	k úhrade EUR:	102 266,35	220 768,62	323 034,97

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacek

podpis:

pečiatka:



Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Olexa 10.05.2011

podpis:

pečiatka:



Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

16 Máj 2011



**Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**

Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	1 789 989,54	75 811,29	61 779,66	137 590,95	1 652 398,59	
		Domové prípojky	402 231,31	16 695,06	0,00	16 695,06	385 536,25	
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	189 069,82	0,00	0,00	0,00	189 069,82	
		Domové prípojky	24 620,01	0,00	0,00	0,00	24 620,01	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	1 030 578,87	0,00	139 493,79	139 493,79	891 085,08	
		Domové prípojky	168 992,57	0,00	19 495,17	19 495,17	149 497,40	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	124 197,29	0,00	0,00	0,00	124 197,29	
		Domové prípojky	34 575,90	0,00	0,00	0,00	34 575,90	
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)			3 764 255,31	92 506,35	220 768,62	313 274,97	3 450 980,34
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			112 927,66	0,00	0,00	0,00	112 927,66
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
Celkový rozpočet Diela								
	[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]		3 949 452,97	102 266,35	220 768,62	323 034,97	3 626 418,00	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

11 -05- 2011



Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek



10 MAY 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Híbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	5 410,00	m3	29,82	161 326,20	540,23	16 109,66	358,63	10 694,35	898,86	26 804,01	4 511,14	134 522,19
2.	Detto, tr.4	4 420,00	m3	32,66	144 357,20	394,39	12 880,78	293,43	9 583,42	687,82	22 464,20	3 732,18	121 893,00
3.	Dolamovanie híbených výkopov	550,00	m3	38,46	21 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	21 153,00
4.	Paženie záťažné do 4 m	9 050,00	m2	9,53	86 246,50	781,19	7 444,74	616,72	5 877,34	1 397,91	13 322,08	7 652,09	72 924,42
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	7 365,00	m2	16,85	124 100,25	639,15	10 769,68	504,61	8 502,68	1 143,76	19 272,36	6 221,24	104 827,89
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9												
7.	Obsyp potrubia	1 636,00	m3	32,93	53 873,48	222,20	7 317,05	200,82	6 613,00	423,02	13 930,05	1 212,98	39 943,43
8.	Dodávka piesku na obsyp	654,00	m3	32,93	21 536,22	90,76	2 988,73	200,82	6 613,00	291,58	9 601,73	362,42	11 934,49
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	6 562,00	m3	27,30	179 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	179 142,60
10.	Štrkodra fr. 0-8	3 050,00	t	16,35	49 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	49 867,50
11.	Čerpanie vody	1 450,00	hod	11,90	17 255,00	11,00	130,90	23,00	273,70	34,00	404,60	1 416,00	16 850,40
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	80,00	m	87,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6 960,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,73	km	800,00	2 184,00	0,31623	252,98	0,30396	243,17	0,62019	496,15	2,10981	1 687,85
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	2 461,00	m2	23,75	58 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,00	58 448,75
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	15 810,00	m2	5,02	79 366,20	0,00	0,00	18,50	92,87	18,50	92,87	15 791,50	79 273,33
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	1 640,00	m2	9,30	15 252,00	0,00	0,00	241,94	2 250,04	241,94	2 250,04	1 398,06	13 001,96
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	180,00	m3	38,50	6 930,00	0,00	0,00	0,50	19,25	0,50	19,25	179,50	6 910,75
18.	Tratvody z drenážnych trubiek DN 150	1 250,00	m	10,12	12 650,00	0,00	0,00	303,96	3 076,08	303,96	3 076,08	946,04	9 573,92
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 728,50	m	3,50	9 549,75	316,23	1 106,81	303,96	1 063,86	620,19	2 170,67	2 108,31	7 379,08
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	15,75	m3	112,50	1 771,88	1,36	153,00	0,00	0,00	1,36	153,00	14,39	1 618,88
21.	Debnenie dosiek	47,25	m2	13,58	641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	641,66
22.	Podklad z kameniva obalov. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8	4 123,00	m2	35,00	144 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	144 305,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	4 123,00	m2	5,77	23 789,71	0,00	0,00	16,30	94,05	16,30	94,05	4 106,70	23 695,66
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	45,00	t	13,09	589,05	0,00	0,00	0,80	10,47	0,80	10,47	44,20	578,58
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	93,00	m2	4,47	415,71	0,00	0,00	0,50	2,24	0,50	2,24	92,50	413,47
27.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	15 810,00	m2	15,00	237 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00	237 150,00
28.	Postrek živичný spojovací	15 810,00	m2	1,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00	15 810,00
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	10 252,00	m	4,52	46 339,04	0,00	0,00	36,22	163,71	36,22	163,71	10 215,78	46 175,33
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt zálievka	335,00	m	2,51	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	840,85
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 750,00
32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 324,50	m	30,50	70 897,25	316,23	9 645,02	30,50	930,25	346,73	10 575,27	1 977,77	60 321,98
32.a	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 500	24,00	m	125,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	3 000,00
32.b	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 150	50,00	m	23,80	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 190,00
32.c	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 80	40,00	m	19,80	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	792,00
32.d	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 63	290,00	m	17,20	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	4 988,00
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	126,00	ks	59,15	7 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	7 452,90
34.	Ďalšie konštr. na potr. vedení dno sáčiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr. c20/25	56,24	m3	115,50	6 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	6 495,72



10 MAY 2011

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	63,00	ks	750,00	47 250,00	8,00	6 000,00	0,00	0,00	8,00	6 000,00	55,00	41 250,00
36.	Skúška tesnosti kanalizácie	2 728,50	m	3,20	8 731,20	316,23	1 011,94	303,96	972,67	620,19	1 984,61	2 108,31	6 746,59
37.	Zabezpečenie koncov	8,00	ks	149,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 192,00
38.	Preložky nadzemných vedení	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	8,00	ks	72,74	581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	581,92
40.	Čerpacia stanica ČS1 - stavebná časť, elektrické pripojka, prevádzkový rozvod silnoprádu vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	23 755,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	23 755,00
41.	Čerpacia stanica ČS1 - strojnotechnologická časť, , meranie a regulácia, napojenie na dispečing,	1,00	kpl	29 734,00	29 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	29 734,00
42.	Čerpacia stanica ČS2 - stavebná časť, elektrické pripojka, vytyčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	24 986,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24 986,00
43.	Čerpacia stanica ČS2 - strojnotechnologická časť, , meranie a regulácia, napojenie na dispečing,	1,00	kpl	31 342,00	31 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31 342,00
44.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				1 789 989,54		75 811,29		61 779,66		137 590,95		1 652 398,59

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek



11-05-2011



10 MAY 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	1 641,00	m3	29,82	48 934,62	85,33	2 544,54		0,00	85,33	2 544,54	1 555,67	46 390,08
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	236,00	m3	41,02	9 680,72	11,94	489,78		0,00	11,94	489,78	224,06	9 190,94
3.	Detto, tr. 4	1 382,00	m3	32,66	45 136,12	73,36	2 395,94		0,00	73,36	2 395,94	1 308,64	42 740,18
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	153,00	m3	38,50	5 890,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	153,00	5 890,50
5.	Paženie príložené do 2m	5 460,00	m2	5,10	27 846,00	379,22	1 934,02		0,00	379,22	1 934,02	5 080,78	25 911,98
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	185,00	m	91,66	16 957,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	185,00	16 957,10
7.	Spätné zásep					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zásep rýh so zhutnením (naloženie, presun)	409,00	m3	27,30	11 165,70	118,12	3 224,68		0,00	118,12	3 224,68	290,88	7 941,02
	- obsyp potrubia	409,00	m3	32,93	13 468,37	37,68	1 240,80		0,00	37,68	1 240,80	371,32	12 227,57
	- pieskové lôžko hr.15 cm	204,00	m3	32,93	6 717,72	12,91	425,13		0,00	12,91	425,13	191,09	6 292,59
	- štrkodra Ø÷8	655,00	t	16,35	10 709,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	655,00	10 709,25
	- štrkopiesok	682,00	m3	32,93	22 458,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	682,00	22 458,26
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	585,00	m2	37,20	21 762,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	585,00	21 762,00
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	1,37	km	800,00	1 096,00	0,09563	76,50		0,00	0,09563	76,50	1,27437	1 019,50
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	780,00	m2	5,05	3 939,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	780,00	3 939,00
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	2 340,00	m	4,52	10 576,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 340,00	10 576,80
12.	Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodre hr. 20+23 cm + kamenivo obalované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrubníkov	585,00	m2	80,33	46 993,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	585,00	46 993,05
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	83,00	t	13,09	1 086,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	83,00	1 086,47
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	1 365,00	m	3,20	4 368,00	95,63	306,02		0,00	95,63	306,02	1 269,37	4 061,98
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	1 365,00	m	12,20	16 653,00	95,63	1 166,69		0,00	95,63	1 166,69	1 269,37	15 486,31
17.	Domová plastová revízia šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - potrebné - skúšky zemné práce - komplet vodotesnosti	195,00	ks	361,37	70 467,15	8,00	2 890,96		0,00	8,00	2 890,96	187,00	67 576,19
18.	Obetonovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	53,20	m3	118,90	6 325,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53,20	6 325,48
19.	Neosadené												
	Celkom				402 231,31		16 695,06		0,00		16 695,06		385 536,25

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

11-05-2011



Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

10 MAY 2011

Handwritten signature of Ing. Jozef Jacek



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-0-2" - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	306,10	m3	29,82	9 127,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	306,10	9 127,90
2.	Detto, tr. 4	312,00	m3	32,66	10 189,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	312,00	10 189,92
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	20,00	m3	38,46	769,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20,00	769,20
4.	Paženie záťažné do 4 m	220,00	m2	9,53	2 096,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220,00	2 096,60
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiacie boxy	275,00	m2	16,85	4 633,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	275,00	4 633,75
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	371,00	m3	27,30	10 128,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	371,00	10 128,30
7.	Obsyp potrubia	371,00	m3	32,93	12 217,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	371,00	12 217,03
8.	Dodávka piesku na obsyp	43,73	m3	32,93	1 440,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	43,73	1 440,03
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	31,50	m3	27,30	859,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31,50	859,95
10.	Štrkodra fr. 0-8	165,00	t	16,35	2 697,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	165,00	2 697,75
11.	Čerpanie vody - dažďovej	504,00	hod	11,90	5 997,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	504,00	5 997,60
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	350,00	m	87,00	30 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350,00	30 450,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,22	km	800,00	176,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,22000	176,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	286,20	m2	23,75	6 797,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	286,20	6 797,25
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	1 722,00	m2	5,02	8 644,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 722,00	8 644,44
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	190,80	m2	9,30	1 774,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	190,80	1 774,44
17.	Oceľová chránička DN 500 chránička dl. 16,0 m montáž - objímky nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním	1,00	ks	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	11 200,00
18.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	15,60	m3	38,50	600,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,60	600,60
19.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	221,50	m	10,12	2 241,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	221,50	2 241,58
20.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	221,50	m	3,50	775,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	221,50	775,25
21.	Dosky podkladné z bet. C15/20	1,45	m3	112,50	163,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,45	163,13
22.	Debnenie dosiek	5,28	m2	13,58	71,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,28	71,70
	Podklad z kameniva oboľov. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8	477,00	m2	35,00	16 695,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	477,00	16 695,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	318,00	m2	5,77	1 834,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	318,00	1 834,86
25.	Upravenie podkladu po prekopych pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom dreveným	2,10	t	13,09	27,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,10	27,49



10 MAY 2011

Handwritten signature

26.	Detto, štrkodrvy hr. 150 mm	4,50	m2	4,47	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	20,12
27.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	1 722,00	m2	15,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	25 830,00
28.	Postrek živčný spojovací	1 722,00	m2	1,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
29.	Rezanie krytu vozovky (2x)	1 060,00	m	4,52	4 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	4 791,20
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	28,00	m	2,51	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	70,28
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	221,50	m	30,50	6 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	6 755,75
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	14,00	ks	59,15	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	828,10
35.	Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	4,20	m3	115,50	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	485,10
36.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	7,00	ks	750,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5 250,00
37.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	221,50	m	3,20	708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	708,80
38.	Zabezpečenie koncov	4,00	ks	149,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	596,00
39.	Obetónovanie potrubia v otvorenom výkope, betón tr. C15/20; dl 1 bm	1,00	kpl	102,70	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	102,70
40.	Neobsadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Čelkom				189 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		189 069,82

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

11-05-2011



10 MAY 2011

[Handwritten signature]



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-0-2" - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	68,40	m3	29,82	2 039,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,40	2 039,69
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	25,00	m3	41,02	1 025,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	1 025,50
3.	Detto, tr. 4	70,20	m3	32,66	2 292,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70,20	2 292,73
4.	Stážení výkop + zaistenie križujúcich vedení	25,00	m3	38,50	962,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	962,50
5.	Paženie príložené do 2m	140,00	m2	5,10	714,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140,00	714,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	10,00	m	91,66	916,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,00	916,60
7.	Spätne zasypy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zasyyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	140,00	m3	27,30	3 822,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140,00	3 822,00
	- obsyp potrubia	5,25	m3	32,93	172,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,25	172,88
	- pieskové lôžko hr.15 cm	18,90	m3	32,93	622,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18,90	622,38
	- štrkodry 0+8	65,00	t	16,35	1 062,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65,00	1 062,75
	- štrkopiesok	37,80	m3	32,93	1 244,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	37,80	1 244,75
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	24,00	m2	37,20	892,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,00	892,80
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,11	km	800,00	88,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,11000	88,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	75,00	m2	5,05	378,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,00	378,75
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	48,00	m	4,52	216,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	48,00	216,96
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	24,00	m2	40,00	960,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,00	960,00
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	2,10	t	13,09	27,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,10	27,49
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	105,00	m	3,20	336,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00	336,00
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	105,00	m	12,20	1 281,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00	1 281,00
16.	Domová plastová revízia šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom - potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	15,00	ks	361,37	5 420,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,00	5 420,55
17.	Obetonovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	1,20	m3	118,90	142,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,20	142,68
18.	Neosadené												
	Čelkom				24 620,01		0,00		0,00		0,00		24 620,01

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

11-05-2011

10 MAY 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	4 131,00	m3	29,82	123 186,42	0,00	0,00	650,36	19 393,74	650,36	19 393,74	3 480,64	103 792,68
2.	Detto, tr.4	2 347,00	m3	32,66	76 653,02	0,00	0,00	365,82	11 947,68	365,82	11 947,68	1 981,18	64 705,34
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	82,00	m3	38,46	3 153,72	0,00	0,00	0,50	19,23	0,50	19,23	81,50	3 134,49
4.	Paženie záťažné do 4 m	2 133,00	m2	9,53	20 327,49	0,00	0,00	510,81	4 868,02	510,81	4 868,02	1 622,19	15 459,47
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	4 324,00	m2	16,85	72 859,40	0,00	0,00	1 037,07	17 474,63	1 037,07	17 474,63	3 286,93	55 384,77
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 730,00	m3	32,93	56 968,90	0,00	0,00	622,55	20 500,57	622,55	20 500,57	1 107,45	36 468,33
7.	Obsyp potrubia	612,00	m3	32,93	20 153,16	0,00	0,00	360,67	11 876,86	360,67	11 876,86	251,33	8 276,30
8.	Dodávka piesku na obsyp	612,00	m3	32,93	20 153,16	0,00	0,00	360,67	11 876,86	360,67	11 876,86	251,33	8 276,30
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	2 595,00	m3	27,30	70 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	70 843,50
10.	Štrkodra fr. 0-8	2 196,00	t	16,35	35 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	35 904,60
11.	Čerpanie vody - daždovej	505,00	hod	11,90	6 009,50	0,00	0,00	175,00	2 082,50	175,00	2 082,50	330,00	3 927,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	35,00	m	87,00	3 045,00	0,00	0,00	6,00	522,00	6,00	522,00	29,00	2 523,00
13.	Vytyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,22	km	800,00	1 776,00	0,00000	0,00	0,36741	293,93	0,36741	293,93	1,85259	1 482,07
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 274,00	m2	23,75	30 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	30 257,50
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	6 941,00	m2	5,02	34 843,82	0,00	0,00	303,50	1 523,57	303,50	1 523,57	6 637,50	33 320,25
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	826,00	m2	9,30	7 681,80	0,00	0,00	456,88	4 248,98	456,88	4 248,98	369,12	3 432,82
17.	Podchody pod štát. cestou pretlačanie potrubia s dodaním chráničky zriadenie a odstránenie pretlačacej jamy, s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy, s čerpaním vody a jej odvedením - zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením, s čerpaním vody a jej odvedením - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním - zatiahnutie potrubia do chráničky	12,00	m	800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	9 600,00



10 MAY 2011

[Handwritten signature]

18.	Podchody pod vodným tokom zemné práce - komplet - osadenie a dodávka oceľ rúry DN 324x8; obetónovanie 800/800 - zriadenie a odstránenie zemných hrádzok - osadenie a odstránenie oceľ. potrubia DN 1000 -2x na prevedenie vody dĺ. 13 m - spevnenie svahov - kamenný zához - spevnenie dna tokov - kamenná rovinanina hr. 500 mm	18,00	m	800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	14 400,00
19.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	521,00	m3	38,50	20 058,50	0,00	0,00	2,50	96,25	2,50	96,25	518,50	19 962,25
20.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	1 520,00	m	10,12	15 382,40	0,00	0,00	367,41	3 718,19	367,41	3 718,19	1 152,59	11 664,21
21.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 223,00	m	3,50	7 780,50	0,00	0,00	367,41	1 285,94	367,41	1 285,94	1 855,59	6 494,56
22.	Dosky podkladné z bet. B 7,5 m3	16,10	m3	112,50	1 811,25	0,00	0,00	1,87	210,38	1,87	210,38	14,23	1 600,87
23.	Debnenie dosiek	54,18	m2	13,58	735,76	0,00	0,00	5,72	77,68	5,72	77,68	48,46	658,08
24.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8 regionálna cesta, miest. kom., bet. Plocha	2 123,00	m2	35,00	74 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,00	74 305,00
25.	Detto, štrkodrvy hr. 200 mm	1 414,80	m2	5,77	8 163,40	0,00	0,00	440,88	2 543,88	440,88	2 543,88	973,92	5 619,52
26.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	51,00	t	13,09	667,59	0,00	0,00	8,00	104,72	8,00	104,72	43,00	562,87
27.	Detto, štrkodrvy hr. 150 mm	149,00	m2	4,47	666,03	0,00	0,00	2,50	11,18	2,50	11,18	146,50	654,85
28.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	6 941,00	m2	15,00	104 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,00	104 115,00
29.	Postrek živичný spojovací	6 941,00	m2	1,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,00	6 941,00
30.	Rezanie krytu vozovky (4x)	4 530,00	m	4,52	20 475,60	0,00	0,00	487,18	2 202,05	487,18	2 202,05	4 042,82	18 273,55
31.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	315,00	m	2,51	790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	790,65
32.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00
33.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 223,00	m	30,50	67 801,50	0,00	0,00	367,41	11 206,01	367,41	11 206,01	1 855,59	56 595,49
34.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	164,00	ks	59,15	9 700,60	0,00	0,00	18,00	1 064,70	18,00	1 064,70	146,00	8 635,90
35.	Ostatné konštr. na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	32,00	m3	115,50	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	3 696,00
36.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	82,00	ks	750,00	61 500,00	0,00	0,00	11,00	8 250,00	11,00	8 250,00	71,00	53 250,00
37.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	2 223,00	m	5,70	12 671,10	0,00	0,00	367,41	2 094,24	367,41	2 094,24	1 855,59	10 576,86
38.	Merný objekt vrátane el. prípojky	1,00	kpl	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 500,00
39.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				1 030 578,87		0,00		139 493,79		139 493,79		891 085,08

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

11-05-2011



Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

10 MAY 2011

Handwritten signature of Ing. Jozef Jacek



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	768,00	m3	29,82	22 901,76	0,00	0,00	45,41	1 354,13	45,41	1 354,13	722,59	21 547,63
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	88,00	m3	41,02	3 609,76	0,00	0,00	5,23	214,53	5,23	214,53	82,77	3 395,23
3.	Detto, tr. 4	620,90	m3	32,66	20 278,59	0,00	0,00	36,67	1 197,64	36,67	1 197,64	584,23	19 080,95
4.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	64,00	m3	38,50	2 464,00	0,00	0,00	16,20	623,70	16,20	623,70	47,80	1 840,30
5.	Paženie príložné do 2m	1 520,00	m2	5,10	7 752,00	0,00	0,00	236,01	1 203,65	236,01	1 203,65	1 283,99	6 548,35
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	28,00	m	91,66	2 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2 566,48
7.	Spätne zasypy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zasyyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 033,00	m3	27,30	28 200,90	0,00	0,00	71,47	1 951,13	71,47	1 951,13	961,53	26 249,77
	- obsyp potrubia	36,00	m3	32,93	1 185,48	0,00	0,00	24,90	819,96	24,90	819,96	11,10	365,52
	- pieskové lôžko hr.15 cm	108,00	m3	32,93	3 556,44	0,00	0,00	8,57	282,21	8,57	282,21	99,43	3 274,23
	- štrkodry 0+8	540,00	t	16,35	8 829,00	0,00	0,00	53,56	875,71	53,56	875,71	486,44	7 953,29
	- štrkopiesok	180,00	m3	32,93	5 927,40	0,00	0,00	21,39	704,37	21,39	704,37	158,61	5 223,03
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	394,24	m2	37,20	14 665,73	0,00	0,00	53,44	1 987,97	53,44	1 987,97	340,80	12 677,76
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,60	km	800,00	480,00	0,00000	0,00	0,06320	50,56	0,06320	50,56	0,53680	429,44
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	591,40	m2	5,05	2 986,57	0,00	0,00	3,44	17,37	3,44	17,37	587,96	2 969,20
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	716,80	m	4,52	3 239,94	0,00	0,00	110,76	500,64	110,76	500,64	606,04	2 739,30
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	394,24	m2	40,00	15 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,24	15 769,60
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	8,50	t	13,09	111,27	0,00	0,00	1,50	19,64	1,50	19,64	7,00	91,63
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150, 200	600,00	m	3,20	1 920,00	0,00	0,00	63,20	202,24	63,20	202,24	536,80	1 717,76
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150, 200	600,00	m	12,20	7 320,00	0,00	0,00	63,20	771,04	63,20	771,04	536,80	6 548,96
16.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom zemné práce - komplet vodotesnosti - potrebné - skúšky	40,00	ks	361,37	14 454,80	0,00	0,00	18,00	6 504,66	18,00	6 504,66	22,00	7 950,14
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	6,50	m3	118,90	772,85	0,00	0,00	1,80	214,02	1,80	214,02	4,70	558,83
18.	Neobsadené												
	Celkom				168 992,57		168 992,57		19 495,17		19 495,17		149 497,40

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

11 -05- 2011

10 MAY 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ - Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	520,30	m3	29,82	15 515,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	520,30	15 515,35
2.	Detto, tr.4	480,40	m3	32,66	15 689,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480,40	15 689,86
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	25,60	m3	38,46	984,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,60	984,58
4.	Paženie rýh hnané do 4 m	239,25	m2	9,53	2 280,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	239,25	2 280,05
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	717,75	m2	16,85	12 094,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	717,75	12 094,09
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	202,00	m3	32,93	6 651,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202,00	6 651,86
7.	Obsyp potrubia	202,00	m3	32,93	6 651,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202,00	6 651,86
8.	Dodávka piesku na obsyp	35,10	m3	32,93	1 155,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,10	1 155,84
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	456,00	m3	27,30	12 448,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	456,00	12 448,80
10.	Štrkodra fr. 0-8	210,54	t	16,35	3 442,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	210,54	3 442,33
11.	Čerpanie vody - dažďovej	520,00	hod	11,90	6 188,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	520,00	6 188,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	25,00	m	87,00	2 175,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	2 175,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,28	km	800,00	224,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,28000	224,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	75,60	m2	23,75	1 795,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,60	1 795,50
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	385,00	m2	5,02	1 932,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,00	1 932,70
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	50,40	m2	9,30	468,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,40	468,72
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	45,20	m3	38,50	1 740,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,20	1 740,20
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	120,50	m	10,12	1 219,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120,50	1 219,46
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	278,00	m	3,50	973,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,00	973,00
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	1,73	m3	112,50	194,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,73	194,63
21.	Debnenie dosiek	5,76	m2	13,58	78,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,76	78,22
22.	Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 ø8	126,00	m2	35,00	4 410,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	126,00	4 410,00
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	84,00	m2	5,77	484,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	84,00	484,68
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	4,20	t	13,09	54,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4,20	54,98
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	10,20	m2	4,47	45,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,20	45,59
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	385,00	m2	15,00	5 775,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,00	5 775,00
27.	Postrek živичný spojovací	385,00	m2	1,00	385,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	160,00	m	4,52	723,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	160,00	723,20
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	55,00	m	2,51	138,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55,00	138,05
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	278,00	m	30,50	8 479,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,00	8 479,00



10 MAY 2011

32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	35,00	ks	59,15	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2 070,25
33.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr. c20/25	2,30	m3	115,50	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	265,65
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	8,00	ks	750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6 000,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	278,00	m	3,20	889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	889,60
36.	Zabezpečenie koncov	1,00	kpl	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	149,00
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	1,20	m3	102,70	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	123,24
38.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Čelkom				124 197,29		0,00		0,00		0,00	124 197,29

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

11 -05- 2011



Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

10 MAY 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	122,00	m3	29,82	3 638,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	122,00	3 638,04
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	18,20	m3	41,02	746,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18,20	746,56
3.	Delto, tr. 4	108,00	m3	32,66	3 527,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	108,00	3 527,28
4.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	28,00	m3	38,50	1 078,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28,00	1 078,00
5.	Paženie príložné do 2m	448,00	m2	5,10	2 284,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	448,00	2 284,80
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	15,00	m	91,66	1 374,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,00	1 374,90
7.	Spätné zásypy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	193,00	m3	27,30	5 268,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	193,00	5 268,90
	- obsyp potrubia	6,72	m3	32,93	221,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,72	221,29
	- pieskové lôžko hr.15 cm	20	m3	32,93	658,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20,00	658,60
	- štrkodra 0-8	100	t	16,35	1 635,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	1 635,00
	- štrkopiesok	40	m3	32,93	1 317,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40,00	1 317,20
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry	36,00	m2	37,20	1 339,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36,00	1 339,20
9.	Vytyčenie trasy kanalizácie v rovine	0,11	km	800,00	88,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,11000	88,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	98,00	m2	5,05	494,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	98,00	494,90
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	134,00	m	4,52	605,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	134,00	605,68
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodra hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	67,00	m2	40,00	2 680,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	67,00	2 680,00
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	1,20	t	13,09	15,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,20	15,71
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	112,00	m	3,20	358,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112,00	358,40
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	112,00	m	12,20	1 366,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112,00	1 366,40
16.	Domová plastová revizná šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - potrebné - skúšky	16,00	ks	361,37	5 781,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16,00	5 781,92
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	0,80	m3	118,90	95,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,80	95,12
18.	Neosadené												
	Celkom				34 575,90	0,00	0,00		0,00		0,00		34 575,90

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

11-05-2011

10 MAY 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie – Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	NÁZOV		Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za mesiac EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	1,00	kpl	9 760,00	9 760,00	1,00	9 760,00		0,00	1,00	9 760,00	0,00	0,00
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	1,00	kpl	29 510,00	29 510,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	29 510,00
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	1,00	kpl	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	33 000,00
Celkom:						72 270,00		9 760,00		0,00		9 760,00		62 510,00

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

11-05-2011



10 MAY 2011



MESAČNÁ SPRÁVA
(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



Obdobie od 01.04.2011 do 30.04.2011



Vydané dňa 30.04.2011

Ing. Jozef Jacek

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jacek', written over the printed name.



MESAČNÁ SPRÁVA

Obsah

- a) Postup prác
 - Projekt
 - Dokumentácia zhotoviteľa
 - Vzorky a atesty
 - Výroba
 - Dodávka na stavenisko
 - Stavebné práce
 - Časový harmonogram
- b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
- c) Výroba technologických zariadení a materiálov
- d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
- e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
- f) Zmeny voči pôvodnej dokumentácie
- g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
- h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
- i) Geodetický elaborát
- j) Skúšky tesností
- k) Monitoring stôk

a) Postup prác

Projekt:

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa **24.11.2010 uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska**. Následne bol vydaný **pokyn k začatiu prác** na uvedenej stavbe dňa **24.11.2010**.

Dokumentácia zhotoviteľa:

Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná **realizačná projektová dokumentácia** pre daný projekt.

Vzorky a atesty:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:

V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko..

Bobrovec VII.etapa – kanalizácia

Bobrovec VII.etapa – domové prípojky

Jalovec - kanalizácia

Jalovec – domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode vid'. príloha „Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie“

Stavebné práce realizované v období od **01.04.2011 do 30.04.2011**

(vid'. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Bobrovec VII.etapa – kanalizácia

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača EA-0-3-1-1 DN 300mm v dĺžke 30,50m a výtlačné potrubie EA-0-3-1-V3 HDPE DN v dĺžke 273,46 m.

Jalovec – kanalizácia

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača JA DN 300mm v dĺžke 279,25m včítane 8 kanalizačných šácht DN 1000 a časť kanalizačného zberača JD DN 300mm v dĺžke 88,16m včítane 3 kanalizačných šácht DN 1000.

Jalovec – domové prípojky

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači JA v počte 14 ks dĺžky 55,38 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami a časť prípojok na zberači JD v počte 4 ks a dĺžky 7,82m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami.

Časový harmonogram:

V priebehu mesiaca 04/2011 Zhotoviteľ v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác – revízia č. 1 Výstavba kanalizácie – Bobrovec, Jalovec, Trstené.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V období apríl 2011 bola vykonaná Fotodokumentácia pred začatím prác – pôvodný stav trasy všetkých zberačov na SO Bobrovec VII. etapa, VI. Etapa a na SO Jalovec.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:

(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

- V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Bobrovec VII. etapa a Jalovec

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia **nebola** výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci kalendárny týždeň/	13. kal. týždeň/	14. kal. týždeň/	15. kal. týždeň/	16. kal. týždeň/	17. kal. týždeň/
-	apríl				
Riadiaci pracovníci na stavbe	1	1	1	1	1
Projekt manažéri	1	1	1	1	1
Geodeti	1	1	1	1	1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci	2	2	2	2	2

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje	13. kal. týždeň/	14. kal. týždeň/	15. kal. týždeň/	16. kal. týždeň/	17. kal. týždeň/
Zariadenia na rýpanie vrátane drviča kameňa a betónu	5	5	5	5	5
Nákladný automobil na odvoz vykopaného materiálu	6	6	6	6	6
Odvodňovacie a čerpacie zariadenia	3	3	3	3	3
Betonárky a domiešavače	-	-	-	-	-
Betónové pumpy a zariadenia na uskladnenie betónu	-	-	-	-	-
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie zariadenie	-	1	-	1	-
Zariadenia na zhutňovanie	3	3	3	3	3

a valce					
Zváračie zariadenia na spájanie polyetylénových rúr	0	0	0	1	0

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek objednávateľa.

- Vid'. príloha „**Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním stavebnému dozoru na odsúhlasenie**“

f) Zmeny, Nároky objednávateľa a Nároky zhotoviteľa.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Zberač EA0-3-1-1 – vypustenie kanal. šachty č.5

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Zberač EA0-3-1-1 – vypustenie kanal. šachty č.5

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** žiadna nehoda.

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hľadiska kvality sa **proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.**

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

- Vid'. príloha „**Plán finančného plnenia**“

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných dôvodov:

- na doposiaľ odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

l) Geodetický elaborát:

- Vid'. príloha „**Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných prípojk**“

j) Skúšky tesností:

- Vid'. príloha „**Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revíznych šácht a kanalizačných prípojk**“

k) Monitoring stôk:

- Vid'. príloha „**Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov**“

Príloha:

- Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 30.04.2011 (Príloha 1)
- Monitoring prác, stav k 30.04.2011 (Príloha 2)
- Plán finančného plnenia, stav k 30.04.2011 (Príloha 3)
- Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
- Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revízných šácht a prípojok (Príloha 5)
- Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov (Príloha 6)



Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 30.04.2011

Obdobie od 01.04.2011 do 30.04.2011




Vydané dňa 30.04.2011






Fotografia č. 1 – SO Bobrovec – zriadenie lôžka pre výtlačné potrubie

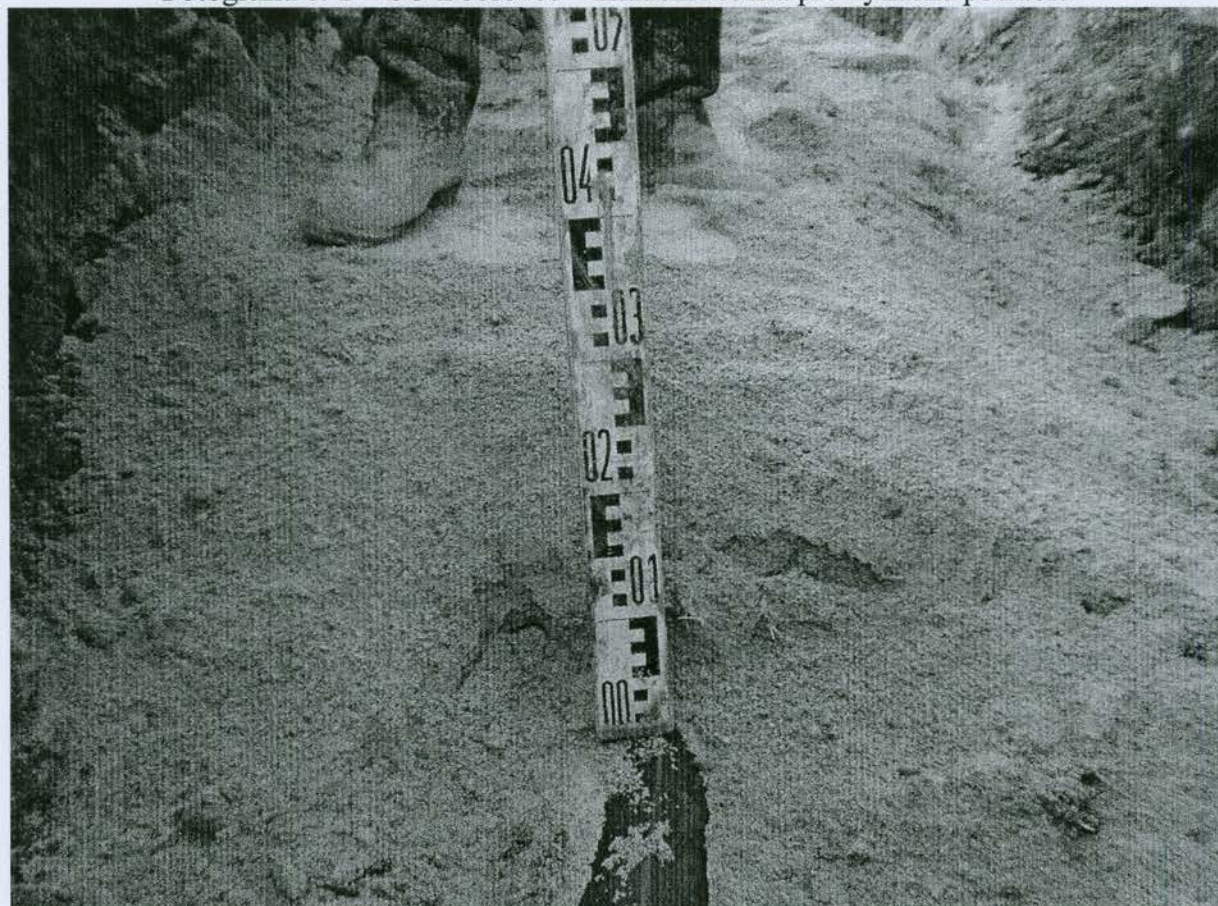


Fotografia č. 2 – SO Bobrovec – meranie hrúbky obsypu výtlačného potrubia fr. 0-4 mm

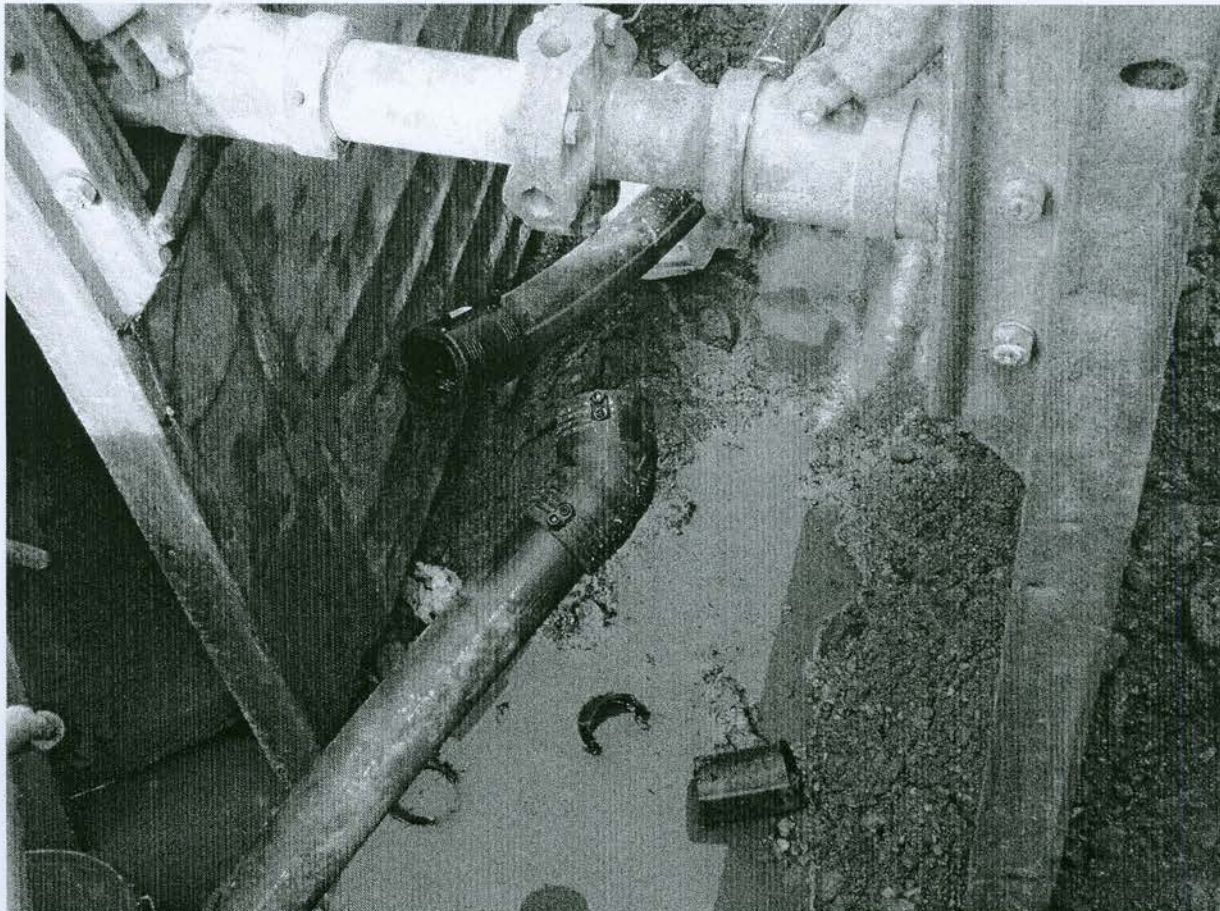

Fotografia č. 3 – SO Bobrovec – zváranie výtlačného potrubia HDPE DN 90



Fotografia č. 4 – SO Bobrovec – zozvárané výtlačné potrubie s vyhľadavacím vodičom

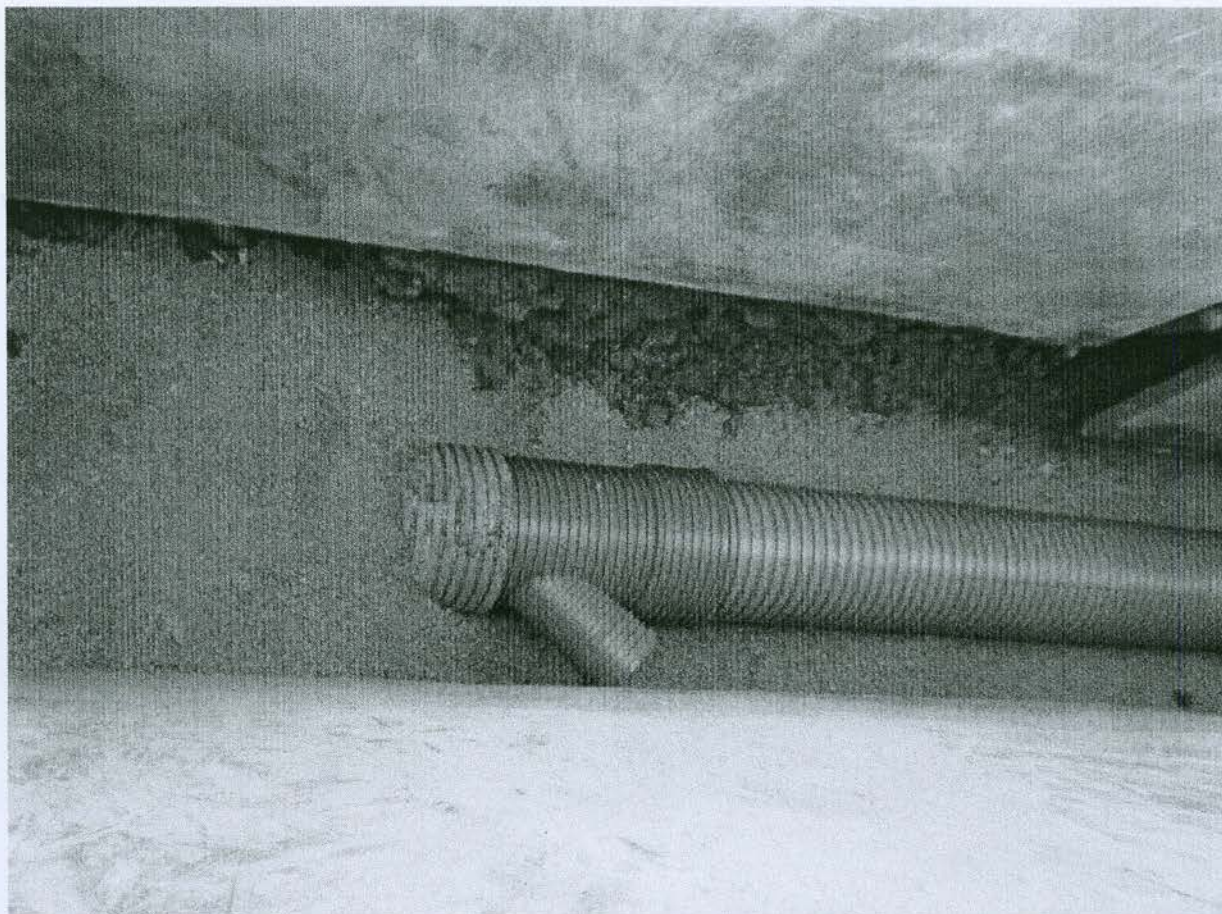

Fotografia č. 5 – SO Jalovec – vysadenie odbočky pre zriadenie kanalizačnej prípojky



Fotografia č. 6 – dosypanie rýh kamenivom fr. 0-63 mm hrúbky 400 mm



Fotografia č. 7 – SO Jalovec – budovanie kanalizačného zberača „JD“ s drenážou



Fotografia č. 8 – SO Jalovec - čerpacia studňa na odčerpávanie spodnej vody z výkopu
