

Faktúra č. 21101005

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486		FAKTÚRA číslo 21101005 Variabilný symbol : 21101005 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :				
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš				
Konečný príjemca (2.odberateľ):						
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ						
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Došlo: - 8 -03- 2011 <table border="1"> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Príloha ref.:</td> </tr> </table>	Číslo:	Pril.:	Príloha ref.:		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 12.05.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 11.02.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.01.2011
Číslo:	Pril.:					
Príloha ref.:						

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené " Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za stavebné práce skupina výdavkov 717 001 realizácia nových stavieb za mesiac január 2011 podľa priložených dokladov:

Základ	20% DPH :	92 506.35 EUR
DPH	20% :	18 501.27 EUR
Celkom s DPH:		111 007.62 EUR
zadržné 10%:		9 250.64 EUR
k úhrade bez DPH a zadržného:		83 255.71 EUR
K úhrade:		101 756.98 EUR

Akcia č.:212
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY –
 – ekologický podnik a.s.,
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 finančná účtarená

11 MAR. 2011

ING. OLEXA 14.2.2011
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2/4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
spoločnosť, a.s.**
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
 © Datalock software

MUDr. Alexander Sľafkovský
 predseda predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť

Ing. Ján Kazár
 člen predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

Obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Číslo faktúry: 21101005

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069
Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 877 182,97 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	0,00	92 506,35	92 506,35
3	zádržné EUR:	0,00	9 250,64	9 250,64
4	vyplatené zádržné EUR:	0,00	0,00	0,00
5	k úhrade EUR:	0,00	83 255,71	83 255,71

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacek

podpis:

pečiatka:

V L.Mikuláši 31.01.2011

Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.01.2011 do 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	1 789 989,54	0,00	75 811,29	75 811,29	1 714 178,25	
		Domové prípojky	402 231,31	0,00	16 695,06	16 695,06	385 536,25	
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	189 069,82	0,00	0,00	0,00	189 069,82	
		Domové prípojky	24 620,01	0,00	0,00	0,00	24 620,01	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	1 030 578,87	0,00	0,00	0,00	1 030 578,87	
		Domové prípojky	168 992,57	0,00	0,00	0,00	168 992,57	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	124 197,29	0,00	0,00	0,00	124 197,29	
		Domové prípojky	34 575,90	0,00	0,00	0,00	34 575,90	
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)			3 764 255,31	0,00	92 506,35	92 506,35	3 671 748,96
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			112 927,66	0,00	0,00	0,00	112 927,66
CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2]			3 877 182,97	0,00	92 506,35	92 506,35	3 784 676,62	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



Za zhotoviteľa :



Za objednávateľa :

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené


za obdobie : od 1.01.2011 do 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	5 410,00	m3	29,82	161 326,20	0,00	0,00	540,23	16 109,66	540,23	16 109,66	4 869,77	145 216,54
2.	Detto, tr. 4	4 420,00	m3	32,66	144 357,20	0,00	0,00	394,39	12 880,78	394,39	12 880,78	4 025,61	131 476,42
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	550,00	m3	38,46	21 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	21 153,00
4.	Paženie záťažné do 4 m	9 050,00	m2	9,53	86 246,50	0,00	0,00	781,19	7 444,74	781,19	7 444,74	8 268,81	78 801,76
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	7 365,00	m2	16,85	124 100,25	0,00	0,00	639,15	10 769,68	639,15	10 769,68	6 725,85	113 330,57
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9												
7.	Obsyp potrubia	1 636,00	m3	32,93	53 873,48	0,00	0,00	222,20	7 317,05	222,20	7 317,05	1 413,80	46 556,43
8.	Dodávka piesku na obsyp	654,00	m3	32,93	21 536,22	0,00	0,00	90,76	2 988,73	90,76	2 988,73	563,24	18 547,49
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	6 562,00	m3	27,30	179 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	179 142,60
10.	Štrkodra fr. 0-8	3 050,00	t	16,35	49 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	49 867,50
11.	Čerpanie vody	1 450,00	hod	11,90	17 255,00	0,00	0,00	11,00	130,90	11,00	130,90	1 439,00	17 124,10
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	80,00	m	87,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6 960,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,73	km	800,00	2 184,00	0,00000	0,00	0,31623	252,98	0,31623	252,98	2,41377	1 931,02
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	2 461,00	m2	23,75	58 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,00	58 448,75
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	15 810,00	m2	5,02	79 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00	79 366,20
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	1 640,00	m2	9,30	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	15 252,00
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	180,00	m3	38,50	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	6 930,00
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	1 250,00	m	10,12	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	12 650,00
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 728,50	m	3,50	9 549,75	0,00	0,00	316,23	1 106,81	316,23	1 106,81	2 412,27	8 442,94
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	15,75	m3	112,50	1 771,88	0,00	0,00	1,36	153,00	1,36	153,00	14,39	1 618,88
21.	Debnenie dosiek	47,25	m2	13,58	641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	641,66
22.	Podklad z kameniva obafov. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8	4 123,00	m2	35,00	144 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	144 305,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	4 123,00	m2	5,77	23 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	23 789,71
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	45,00	t	13,09	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	589,05
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	93,00	m2	4,47	415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	415,71
27.	Asfaltobetón ABS hr. 5cm I tr.	15 810,00	m2	15,00	237 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00	237 150,00
28.	Postrek živичný spojovací	15 810,00	m2	1,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00	15 810,00
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	10 252,00	m	4,52	46 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252,00	46 339,04
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt zálievka	335,00	m	2,51	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	840,85
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 750,00
32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 324,50	m	30,50	70 897,25	0,00	0,00	316,23	9 645,02	316,23	9 645,02	2 008,27	61 252,23
32.a	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 500	24,00	m	125,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	3 000,00
32.b	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 150	50,00	m	23,80	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 190,00
32.c	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 80	40,00	m	19,80	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	792,00
32.d	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 63	290,00	m	17,20	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	4 988,00
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	126,00	ks	59,15	7 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	7 452,90
34.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 trc20/25	56,24	m3	115,50	6 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	6 495,72



Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	63,00	ks	750,00	47 250,00	0,00	0,00	8,00	6 000,00	8,00	6 000,00	55,00	41 250,00
36.	Skúška tesnosti kanalizácie	2 728,50	m	3,20	8 731,20	0,00	0,00	316,23	1 011,94	316,23	1 011,94	2 412,27	7 719,26
37.	Zabezpečenie koncov	8,00	ks	149,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 192,00
38.	Preložky nadzemných vedení	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	8,00	ks	72,74	581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	581,92
40.	Čerpacia stanica CS1 - stavebná časť, elektrické prípojka, prevádzkový rozvod silnoprádu vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	23 755,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	23 755,00
41.	Čerpacia stanica CS1 - strojnotechnologická časť, , meranie a regulácia, napojenie na dispečing,	1,00	kpl	29 734,00	29 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	29 734,00
42.	Čerpacia stanica CS2 - stavebná časť, elektrické prípojka, vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	24 986,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24 986,00
43.	Čerpacia stanica CS2 - strojnotechnologická časť, , meranie a regulácia, napojenie na dispečing,	1,00	kpl	31 342,00	31 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31 342,00
44.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				1 789 989,54		0,00		75 811,29		75 811,29		1 714 178,25

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



9.2.2011

Za zhotoviteľa :



31.1.2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.01.2011 do 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hilbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	1 641,00	m3	29,82	48 934,62	0,00	0,00	85,33	2 544,54	85,33	2 544,54	1 555,67	46 390,08
2.	Hilbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	236,00	m3	41,02	9 680,72	0,00	0,00	11,94	489,78	11,94	489,78	224,06	9 190,94
3.	Detto, tr. 4	1 382,00	m3	32,66	45 136,12	0,00	0,00	73,36	2 395,94	73,36	2 395,94	1 308,64	42 740,18
4.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	153,00	m3	38,50	5 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	5 890,50
5.	Paženie príložené do 2m	5 460,00	m2	5,10	27 846,00	0,00	0,00	379,22	1 934,02	379,22	1 934,02	5 080,78	25 911,98
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	185,00	m	91,66	16 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	16 957,10
7.	Spätne zasypy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zasyyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	409,00	m3	27,30	11 165,70	0,00	0,00	118,12	3 224,68	118,12	3 224,68	290,88	7 941,02
	- obsyp potrubia	409,00	m3	32,93	13 468,37	0,00	0,00	37,68	1 240,80	37,68	1 240,80	371,32	12 227,57
	- pieskové lôžko hr.15 cm	204,00	m3	32,93	6 717,72	0,00	0,00	12,91	425,13	12,91	425,13	191,09	6 292,59
	- štrkodry 0+8	655,00	t	16,35	10 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	10 709,25
	- štrkopiesok	682,00	m3	32,93	22 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	22 458,26
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	585,00	m2	37,20	21 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	21 762,00
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	1,37	km	800,00	1 096,00	0,00000	0,00	0,09563	76,50	0,09563	76,50	1,27437	1 019,50
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	780,00	m2	5,05	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	3 939,00
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	2 340,00	m	4,52	10 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	10 576,80
12.	Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodry hr. 20+23 cm + kamenivo obalované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrubníkov	585,00	m2	80,33	46 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	46 993,05
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	83,00	t	13,09	1 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	1 086,47
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	1 365,00	m	3,20	4 368,00	0,00	0,00	95,63	306,02	95,63	306,02	1 269,37	4 061,98
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	1 365,00	m	12,20	16 653,00	0,00	0,00	95,63	1 166,69	95,63	1 166,69	1 269,37	15 486,31
17.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - potrebné podsyyp a obsyp pieskom zemné práce - komplet - skúšky vodosťnosti	195,00	ks	361,37	70 467,15	0,00	0,00	8,00	2 890,96	8,00	2 890,96	187,00	67 576,19
18.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	53,20	m3	118,90	6 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	6 325,48
19.	Neobsaďené												
	Celkom				402 231,31		0,00		16 695,06		16 695,06		385 536,25

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.01.2011 do 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-0-2" - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	306,10	m3	29,82	9 127,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	306,10	9 127,90
2.	Detto, tr.4	312,00	m3	32,66	10 189,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	312,00	10 189,92
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	20,00	m3	38,46	769,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20,00	769,20
4.	Paženie záťažné do 4 m	220,00	m2	9,53	2 096,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220,00	2 096,60
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	275,00	m2	16,85	4 633,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	275,00	4 633,75
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	371,00	m3	27,30	10 128,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	371,00	10 128,30
7.	Obsyp potrubia	371,00	m3	32,93	12 217,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	371,00	12 217,03
8.	Dodávka piesku na obsyp	43,73	m3	32,93	1 440,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	43,73	1 440,03
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	31,50	m3	27,30	859,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31,50	859,95
10.	Štrkodra fr. 0-8	165,00	t	16,35	2 697,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	165,00	2 697,75
11.	Čerpanie vody - dažďovej	504,00	hod	11,90	5 997,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	504,00	5 997,60
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	350,00	m	87,00	30 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350,00	30 450,00
13.	Výtyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,22	km	800,00	176,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,22000	176,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	286,20	m2	23,75	6 797,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	286,20	6 797,25
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	1 722,00	m2	5,02	8 644,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 722,00	8 644,44
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	190,80	m2	9,30	1 774,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	190,80	1 774,44
17.	Ocelová chránička DN 500 chránička dl. 16,0 m montáž - objímky nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním	1,00	ks	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	11 200,00
18.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	15,60	m3	38,50	600,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,60	600,60
19.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	221,50	m	10,12	2 241,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	221,50	2 241,58
20.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	221,50	m	3,50	775,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	221,50	775,25
21.	Dosky podkladné z bet. C15/20	1,45	m3	112,50	163,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,45	163,13
22.	Debnenie dosiek	5,28	m2	13,58	71,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,28	71,70
	Podklad z kameniva oboľov. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8	477,00	m2	35,00	16 695,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	477,00	16 695,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	318,00	m2	5,77	1 834,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	318,00	1 834,86
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	2,10	t	13,09	27,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,10	27,49



26.	Delto, štrkodrvy hr. 150 mm	4,50	m2	4,47	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	20,12
27.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	1 722,00	m2	15,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	25 830,00
28.	Postrek živичný spojovací	1 722,00	m2	1,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
29.	Rezanie krytu vozovky (2x)	1 060,00	m	4,52	4 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	4 791,20
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	28,00	m	2,51	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	70,28
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	221,50	m	30,50	6 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	6 755,75
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	14,00	ks	59,15	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	828,10
35.	Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	4,20	m3	115,50	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	485,10
36.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	7,00	ks	750,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5 250,00
37.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	221,50	m	3,20	708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	708,80
38.	Zabezpečenie koncov	4,00	ks	149,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	596,00
39.	Obetónovanie potrubia v otvorenom výkope, betón tr. C15/20; dl 1 bm	1,00	kpl	102,70	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	102,70
40.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Čelkom				189 069,82		0,00		0,00		0,00	189 069,82

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.01.2011 do 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava


Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-0-2" - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	68,40	m3	29,82	2 039,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,40	2 039,69
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	25,00	m3	41,02	1 025,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	1 025,50
3.	Detto, tr. 4	70,20	m3	32,66	2 292,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70,20	2 292,73
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	25,00	m3	38,50	962,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	962,50
5.	Paženie príložené do 2m	140,00	m2	5,10	714,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140,00	714,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	10,00	m	91,66	916,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,00	916,60
7.	Spätne zasypy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zasyyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	140,00	m3	27,30	3 822,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140,00	3 822,00
	- obsyp potrubia	5,25	m3	32,93	172,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,25	172,88
	- pieskové lôžko hr. 15 cm	18,90	m3	32,93	622,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18,90	622,38
	- štrkodry 0+8	65,00	t	16,35	1 062,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65,00	1 062,75
	- štrkopiesok	37,80	m3	32,93	1 244,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	37,80	1 244,75
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry	24,00	m2	37,20	892,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,00	892,80
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,11	km	800,00	88,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,11000	88,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	75,00	m2	5,05	378,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,00	378,75
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	48,00	m	4,52	216,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	48,00	216,96
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr. 5cm	24,00	m2	40,00	960,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,00	960,00
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	2,10	t	13,09	27,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,10	27,49
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	105,00	m	3,20	336,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00	336,00
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	105,00	m	12,20	1 281,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00	1 281,00
16.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom - potrebné zemné práce - komplet vodotesnosti - skúšky	15,00	ks	361,37	5 420,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,00	5 420,55
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	1,20	m3	118,90	142,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,20	142,68
18.	Neosadené												
	Celkom				24 620,01		0,00		0,00		0,00		24 620,01

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené


za obdobie : od 1.01.2011 do 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	4 131,00	m3	29,82	123 186,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 131,00	123 186,42
2.	Detto, tr.4	2 347,00	m3	32,66	76 653,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 347,00	76 653,02
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	82,00	m3	38,46	3 153,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	82,00	3 153,72
4.	Paženie záťažné do 4 m	2 133,00	m2	9,53	20 327,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 133,00	20 327,49
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiacie boxy	4 324,00	m2	16,85	72 859,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 324,00	72 859,40
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 730,00	m3	32,93	56 968,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 730,00	56 968,90
7.	Obsyp potrubia	612,00	m3	32,93	20 153,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	612,00	20 153,16
8.	Dodávka piesku na obsyp	612,00	m3	32,93	20 153,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	612,00	20 153,16
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	2 595,00	m3	27,30	70 843,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 595,00	70 843,50
10.	Štrkodra fr. 0-8	2 196,00	t	16,35	35 904,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 196,00	35 904,60
11.	Čerpanie vody - dažďovej	505,00	hod	11,90	6 009,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	505,00	6 009,50
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	35,00	m	87,00	3 045,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,00	3 045,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,22	km	800,00	1 776,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	2,22000	1 776,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 274,00	m2	23,75	30 257,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 274,00	30 257,50
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	6 941,00	m2	5,02	34 843,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 941,00	34 843,82
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	826,00	m2	9,30	7 681,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	826,00	7 681,80
17.	Podchody pod štát. cestou pretláčanie potrubia s dodaním chráničky zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy, s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy, s čerpaním vody a jej odvedením - zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením, s čerpaním vody a jej odvedením - nasunutie potrubia do chráničky pomocou kĺzných objímok - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním - zatiahnutie potrubia do chráničky	12,00	m	800,00	9 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12,00	9 600,00



18.	Pochoďový pod vodným tokom zemné práce - komplet - osadenie a dodávka oceľ rúry DN 324x8; obetónovanie 800/800 - zriadenie a odstránenie zemných hrádzok - osadenie a odstránenie oceľ. potrubia DN 1000 -2x na prevedenie vody dĺ. 13 m - spevnenie svahov - kamenný zához - spevnenie dna tokov - kamenná rovnalina hr. 500 mm	18,00	m	800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	14 400,00
19.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	521,00	m3	38,50	20 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	20 058,50
20.	Tratvody z drenážnych trubiek DN 150	1 520,00	m	10,12	15 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	15 382,40
21.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 223,00	m	3,50	7 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	7 780,50
22.	Dosky podkladné z bet. B 7,5 m3	16,10	m3	112,50	1 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	1 811,25
23.	Debne dosiek	54,18	m2	13,58	735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	735,76
24.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8 regionálna cesta, miest. kom., bet. Plocha	2 123,00	m2	35,00	74 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,00	74 305,00
25.	Detto, štrkodrvy hr. 200 mm	1 414,80	m2	5,77	8 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,80	8 163,40
26.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	51,00	t	13,09	667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	667,59
27.	Detto, štrkodrvy hr. 150 mm	149,00	m2	4,47	666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	666,03
28.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	6 941,00	m2	15,00	104 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,00	104 115,00
29.	Postrek živичný spojovací	6 941,00	m2	1,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,00	6 941,00
30.	Rezanie krytu vozovky (4x)	4 530,00	m	4,52	20 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	20 475,60
31.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	315,00	m	2,51	790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	790,65
32.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00
33.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 223,00	m	30,50	67 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	67 801,50
34.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	164,00	ks	59,15	9 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	9 700,60
35.	Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	32,00	m3	115,50	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	3 696,00
36.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	82,00	ks	750,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	61 500,00
37.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	2 223,00	m	5,70	12 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	12 671,10
38.	Memný objekt vrátane el. pripojky	1,00	kpl	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 500,00
39.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Čelkom				1 030 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 030 578,87

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



9.2.2011

Za zhotoviteľa :



31.1.2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.01.2011 do 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	768,00	m3	29,82	22 901,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	768,00	22 901,76
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	88,00	m3	41,02	3 609,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	88,00	3 609,76
3.	Detto, tr. 4	620,90	m3	32,66	20 278,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	620,90	20 278,59
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	64,00	m3	38,50	2 464,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	64,00	2 464,00
5.	Paženie príložné do 2m	1 520,00	m2	5,10	7 752,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 520,00	7 752,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	28,00	m	91,66	2 566,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28,00	2 566,48
7.	Spätne zásep					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zásep rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 033,00	m3	27,30	28 200,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 033,00	28 200,90
	- obsyp potrubia	36,00	m3	32,93	1 185,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36,00	1 185,48
	- pieskové lôžko hr. 15 cm	108,00	m3	32,93	3 556,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	108,00	3 556,44
	- štrkodry 0+8	540,00	t	16,35	8 829,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540,00	8 829,00
	- štrkopiesok	180,00	m3	32,93	5 927,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	180,00	5 927,40
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	394,24	m2	37,20	14 665,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	394,24	14 665,73
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,60	km	800,00	480,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,60000	480,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	591,40	m2	5,05	2 986,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	591,40	2 986,57
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	716,80	m	4,52	3 239,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	716,80	3 239,94
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr. 5cm	394,24	m2	40,00	15 769,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	394,24	15 769,60
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	8,50	t	13,09	111,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,50	111,27
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150, 200	600,00	m	3,20	1 920,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600,00	1 920,00
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150, 200	600,00	m	12,20	7 320,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600,00	7 320,00
16.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - potrebné - skúšky zemné práce - komplet vodotesnosti	40,00	ks	361,37	14 454,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40,00	14 454,80
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	6,50	m3	118,90	772,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,50	772,85
18.	Neosadené												
	Čelkom				168 992,57		0,00		0,00		0,00		168 992,57

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.01.2011 do 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ - Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	520,30	m3	29,82	15 515,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	520,30	15 515,35
2.	Detto, tr.4	480,40	m3	32,66	15 689,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480,40	15 689,86
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	25,60	m3	38,46	984,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,60	984,58
4.	Paženie záťažné do 4 m	239,25	m2	9,53	2 280,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	239,25	2 280,05
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	717,75	m2	16,85	12 094,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	717,75	12 094,09
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	202,00	m3	32,93	6 651,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202,00	6 651,86
7.	Obsyp potrubia	202,00	m3	32,93	6 651,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202,00	6 651,86
8.	Dodávka piesku na obsyp	35,10	m3	32,93	1 155,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,10	1 155,84
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	456,00	m3	27,30	12 448,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	456,00	12 448,80
10.	Štrkodra fr. 0-8	210,54	t	16,35	3 442,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	210,54	3 442,33
11.	Čerpanie vody - daždovej	520,00	hod	11,90	6 188,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	520,00	6 188,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	25,00	m	87,00	2 175,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	2 175,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,28	km	800,00	224,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,28000	224,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	75,60	m2	23,75	1 795,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,60	1 795,50
	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	385,00	m2	5,02	1 932,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,00	1 932,70
15.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	50,40	m2	9,30	468,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,40	468,72
16.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	45,20	m3	38,50	1 740,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,20	1 740,20
17.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	120,50	m	10,12	1 219,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120,50	1 219,46
18.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	278,00	m	3,50	973,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,00	973,00
19.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	1,73	m3	112,50	194,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,73	194,63
20.	Debnenie dosiek	5,76	m2	13,58	78,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,76	78,22
21.	Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 ø8	126,00	m2	35,00	4 410,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	126,00	4 410,00
22.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	84,00	m2	5,77	484,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	84,00	484,68
23.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	4,20	t	13,09	54,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4,20	54,98
24.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	10,20	m2	4,47	45,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,20	45,59
25.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	385,00	m2	15,00	5 775,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,00	5 775,00
26.	Postrek živичný spojovací	385,00	m2	1,00	385,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
27.	Rezanie krytu vozovky (4x)	160,00	m	4,52	723,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	160,00	723,20
28.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	55,00	m	2,51	138,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55,00	138,05
29.	Dopravné značenie	1,00	kpl	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
30.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	278,00	m	30,50	8 479,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,00	8 479,00



32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	35,00	ks	59,15	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2 070,25
33.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr. c20/25	2,30	m3	115,50	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	265,65
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	8,00	ks	750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6 000,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	278,00	m	3,20	889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	889,60
36.	Zabezpečenie koncov	1,00	kpl	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	149,00
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	1,20	m3	102,70	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	123,24
38.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Celkom				124 197,29		0,00		0,00		0,00	124 197,29

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



9.2.2011

Za zhotoviteľa :



30.9.2010

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.01.2011 do 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	122,00	m3	29,82	3 638,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	122,00	3 638,04
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	18,20	m3	41,02	746,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18,20	746,56
3.	Detto, tr. 4	108,00	m3	32,66	3 527,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	108,00	3 527,28
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	28,00	m3	38,50	1 078,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28,00	1 078,00
5.	Paženie príložné do 2m	448,00	m2	5,10	2 284,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	448,00	2 284,80
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	15,00	m	91,66	1 374,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,00	1 374,90
7.	Spätné zásypy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	193,00	m3	27,30	5 268,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	193,00	5 268,90
	- obsyp potrubia	6,72	m3	32,93	221,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,72	221,29
	- pieskové lôžko hr.15 cm	20	m3	32,93	658,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20,00	658,60
	- štrkodry 0+8	100	t	16,35	1 635,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	1 635,00
	- štrkopiesok	40	m3	32,93	1 317,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40,00	1 317,20
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	36,00	m2	37,20	1 339,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36,00	1 339,20
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,11	km	800,00	88,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,11000	88,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	98,00	m2	5,05	494,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	98,00	494,90
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	134,00	m	4,52	605,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	134,00	605,68
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	67,00	m2	40,00	2 680,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	67,00	2 680,00
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	1,20	t	13,09	15,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,20	15,71
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	112,00	m	3,20	358,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112,00	358,40
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	112,00	m	12,20	1 366,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112,00	1 366,40
16.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom - potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	16,00	ks	361,37	5 781,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16,00	5 781,92
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	0,80	m3	118,90	95,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,80	95,12
18.	Neosadené												
	Celkom				34 575,90		0,00		0,00		0,00		34 575,90

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



9.2.2011

Za zhotoviteľa



31.1.2011

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



Obdobie od 01.01.2011 do 31.01.2011



Vydané dňa 31.01.2011

Ing. Daniel Oravec



MESAČNÁ SPRÁVA

Obsah

- a) Postup prác
 - Projekt
 - Dokumentácia zhotoviteľa
 - Vzorky a atesty
 - Výroba
 - Dodávka na stavenisko
 - Stavebné práce
 - Časový harmonogram
- b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
- c) Výroba technologických zariadení a materiálov
- d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
- e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
- f) Zmeny voči pôvodnej dokumentácie
- g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
- h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
- i) Geodetický elaborát
- j) Skúšky tesností
- k) Monitoring stôk



a) Postup prác

Projekt:

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa **24.11.2010** uskutočnilo **odovzdanie a prevzatie staveniska**. Následne bol vydaný **pokyn k začatiu prác** na uvedenej stavbe dňa **24.11.2010**.

Dokumentácia zhotoviteľa:

Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná **realizačná projektová dokumentácia** pre daný projekt.

Vzorky a atesty:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:

V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Bobrovec VII.etapa – kanalizácia

Bobrovec VII.etapa – domové prípojky

Jalovec - kanalizácia

Jalovec – domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode vid'. príloha „Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie“

Stavebné práce realizované v období od **01.01.2011** do **31.01.2011**

(vid'. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Bobrovec VII.etapa – kanalizácia

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača EA-4 DN 300mm v dĺžke 150,65m včítane 4 kanalizačných šácht DN 1000 a časť kanalizačného zberača EA-0-3-1-1 DN 300mm v dĺžke 165,58m včítane 4 kanalizačných šácht DN 1000.

Bobrovec VII.etapa – domové prípojky

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojek na zberači EA-4 v počte 10 ks a dĺžky 46,2m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami a časť prípojek na zberači EA-0-3-1-1 v počte 6 ks a dĺžky 49,43m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami.

Časový harmonogram:

V priebehu mesiaca 12/2010 Zhotoviteľ v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác – Výstavba kanalizácie – Bobrovec, Jalovec, Trstené.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V dňoch 24.11. – 25.11. 2010 bola vykonaná Fotodokumentácia pred začatím prác – pôvodný stav na Bobrovec VII. etapa, zberač EA-4 a zberač EA-0-3-1-1 a v dňoch 02.12. – 08.11.2010 bola vykonaná Fotodokumentácia pred začatím prác – pôvodný stav na stavebnom objekte Jalovec, zberač JA a JD.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:

(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

- V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Bobrovec VII.etapa

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia **nebola** výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci kalendárny týždeň/	52. kal. týždeň/	01. kal. týždeň/	02. kal. týždeň/	03. kal. týždeň/	04. kal. týždeň/
-	Január				
Riadiaci pracovníci na stavbe	0	1	1	1	1
Projekt manažéri	0	1	1	1	0
Geodeti	0	0	1	1	1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci	0	1	1	1	0

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje	52. kal. týždeň/	01. kal. týždeň/	02. kal. týždeň/	03. kal. týždeň/	04. kal. týždeň/
Zariadenia na rýpanie vrátane drviča kameňa a betónu	0	2	2	2	2
Nákladný automobil na odvoz vykopaného materiálu	0	1	1	1	1
Odvodňovacie a čerpacie zariadenia	0	1	1	1	1
Betonárky a domiešavače	-	-	-	-	-
Betónové pumpy a zariadenia na uskladnenie betónu	-	-	-	-	-
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie zariadenie	-	-	-	-	-
Zariadenia na zhutňovanie	0	1	1	2	2

a valce					
Zvracie zariadenia na spájanie polyetylénových rúr	-	-	-	-	-

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek objednávateľa.

- Vid'. príloha „*Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním stavebnému dozoru na odsúhlasenie*“

f) Zmeny, Nároky objednávateľa a Nároky zhotoviteľa.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Žiadne

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Žiadne

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** žiadna nehoda.

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hľadiska kvality sa **proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.**

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

- Vid'. príloha „*Plán finančného plnenia*“

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných dôvodov:

- na doposiaľ odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

l) Geodetický elaborát:

- Vid'. príloha „*Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných prípojk*“

j) Skúšky tesností:

- Vid'. príloha „*Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revízných šácht a kanalizačných prípojk*“

k) Monitoring stôk:


- Vid'. príloha „*Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov*“

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.01.2011

Obdobie od 01.01.2011 do 31.01.2011

Vydané dňa 31.01.2011



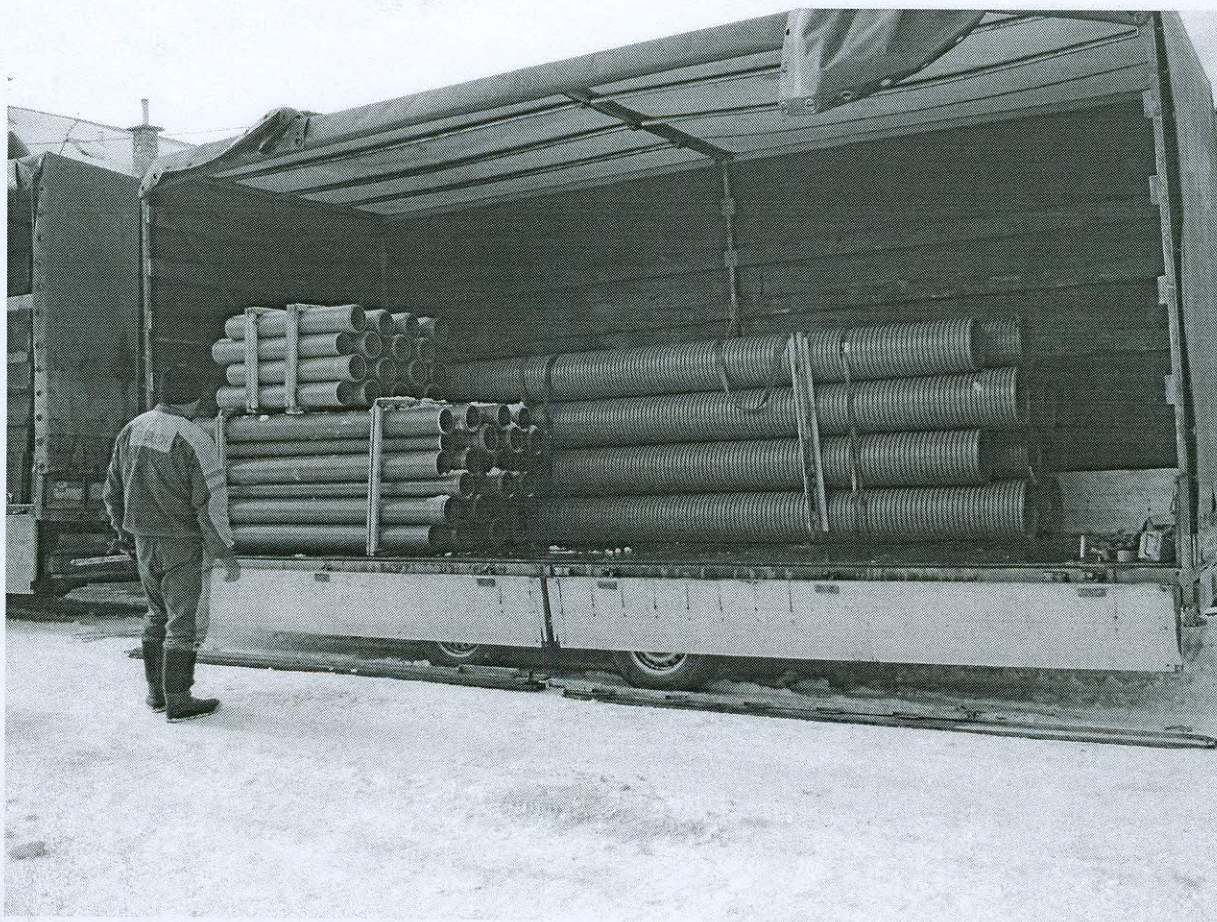

Fotografia č. 1 – dodávka materiálu



Fotografia č. 2 – dodávka obsypového materiálu fr. 0-8 mm



Fotografia č. 3 – hĺbenie rýh v pažení (pažiacie boxy)




Fotografia č. 4 – zriaďovanie lôžka



Fotografia č. 5 – zriaďovanie lôžka – detail



Fotografia č. 6 – uloženie kanalizačného potrubia

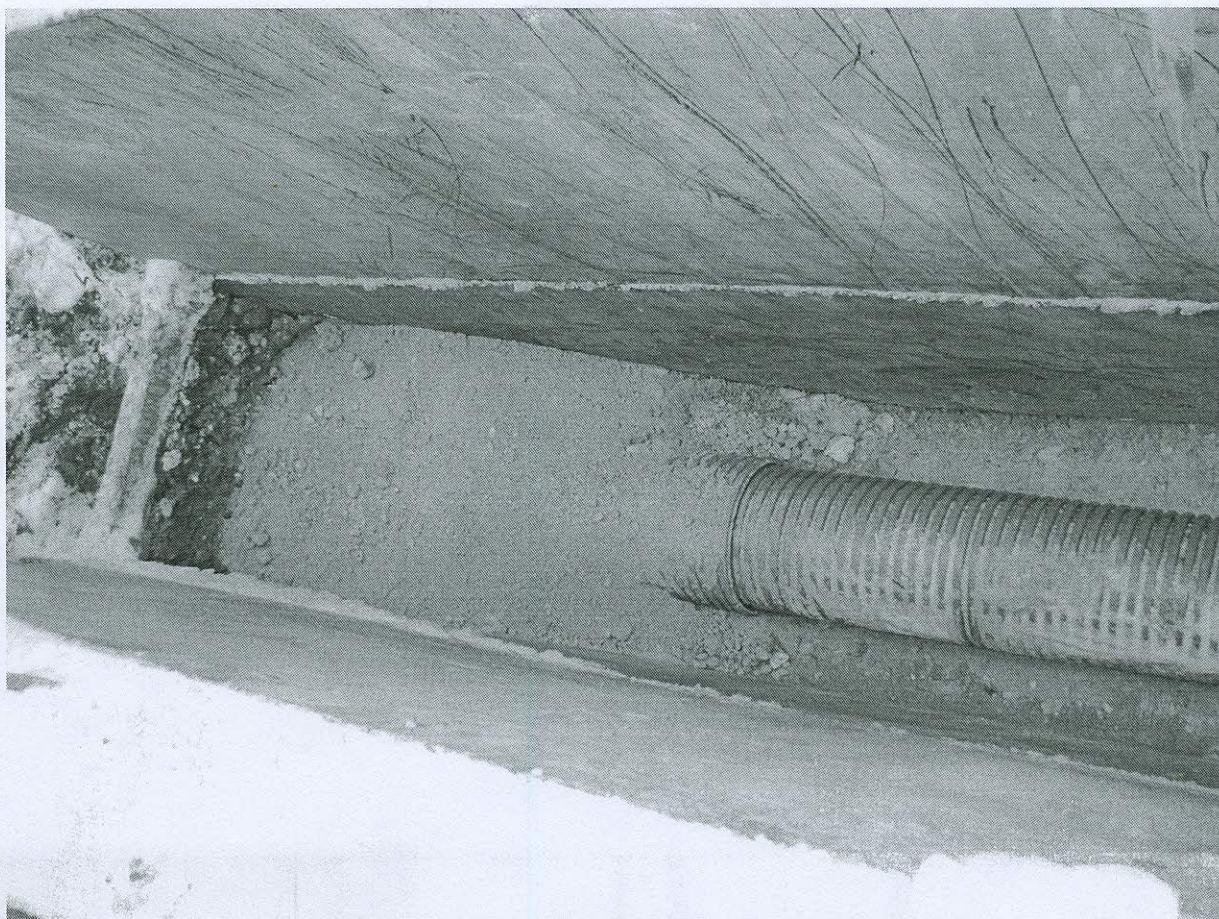

Fotografia č. 7 – obsyp kanalizačného potrubia



Fotografia č. 8 – meranie hrúbky obsypu

Objekt	Realizácia (skutočných prác)								Fakturácia					
	zmluvné množstvo	MJ	množstvo v sledovanom období od 01.01.2011 do 31.01.2011	množstvo za predchádzajúce obdobie od 24.11.2010 do 31.12.2010	množstvo od začiatku výstavby od 24.11.2010 do 31.01.2011	zostatok množstvo (-) prekročenie zmluvného množstva	% plnenie (stav k 01/2011)	% plnenie podľa obci	fakturované množstvo v sledovanom období od 01.01.2011 do 31.01.2011	fakturované množstvo za predchádzajúce obdobie od 24.11.2010 do 31.12.2010	fakturované množstvo od začiatku od 24.11.2010 do 31.01.2011	zostatok fakturované množstvo	% plnenie (stav k 01/2011)	% plnenie podľa obci
KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa														
Kanalizačné potrubie	2348,5	m	316,23	0,00	316,23	2 032,27	13,47%	4,34%	316,23	0,00	316,23	2 032,27	13,47%	4,34%
Výtlačné potrubie	380	m	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00%	
Domové prípojky	195	ks	16,00	0,00	16,00	179,00	8,21%		16,00	0,00	16,00	179,00	8,21%	
Čerpace stanice - stavebná časť	2	kpl	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	
Čerpace stanice - strojnotechnologická časť	2	kpl	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	
KANALIZÁCIA BOBROVEC VI. Etapa - Zb. "EA-0-2"														
Kanalizačné potrubie	221,5	m	0,00	0,00	0,00	221,50	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	221,50	0,00%	0,00%
Domové prípojky	15	ks	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	15,00	0,00%	
KANALIZÁCIA JALOVEC														
Kanalizačné potrubie	2223	m	0,00	0,00	0,00	2 223,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 223,00	0,00%	0,00%
Domové prípojky	40	ks	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00%	
KANALIZÁCIA TRSTENÉ														
Kanalizačné potrubie	278	m	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00%	0,00%
Domové prípojky	16	ks	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%	

Objekt	Realizácia (skutočných prác)								Fakturácia					
	zmluvné množstvo	MJ	množstvo v sledovanom období od 01.01.2011 do 31.01.2011	množstvo za predchádzajúce obdobie od 24.11.2010 do 31.12.2010	množstvo od začiatku výstavby od 24.11.2010 do 31.01.2011	zostatok množstvo (-) prekročenie zmluvného množstva	% plnenie (stav k 01/2011)	% plnenie podľa obci	fakturované množstvo v sledovanom období od 01.01.2011 do 31.01.2011	fakturované množstvo za predchádzajúce obdobie od 24.11.2010 do 31.12.2010	fakturované množstvo od začiatku výstavby od 24.11.2010 do 31.01.2011	zostatok fakturované množstvo	% plnenie (stav k 01/2011)	% plnenie podľa obci
Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené														
Kanalizačné potrubie	5071	m	316,23	0	316,23	4 754,77	6,24%	2,45%	316,23	0	316,23	4 754,77	6,24%	2,45%
Výtlačné potrubie	380	m	0	0	0,00	380,00	0,00%		0	0	0	380	0,00%	
Domové prípojky	266	ks	16	0	16,00	250,00	6,02%		16	0	16	250	6,02%	
Čerpace stanice - stavebná časť	2	kpl	0	0	0,00	2,00	0,00%		0	0	0	2	0,00%	
Čerpace stanice - strojnotechnologická časť	2	kpl	0	0	0,00	2,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	




FINANČNÉ PLNENIE projektu:

Výstavba kanalizácie – Bobrovec, Jalovec, Trstené

PLÁN FINANČNÉHO PLNENIA

stav k

Rok	Mesiac	Plánovaná mesačná fakturácia (EUR)	Plánovaná mesačná fakturácia (EUR) (kumulatívna)	Skutočná mesačná fakturácia (EUR)	Skutočná kumulatívna fakturácia (EUR)	Poznámka
		HMG rev.00	HMG rev.00			
2010	IX - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	X - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XI - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XII - 10	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2011	I - 11	60 000,00	290 000,00	92 506,35	92 506,35	
	II - 11	60 000,00	350 000,00	0,00	92 506,35	
	III - 11	100 000,00	450 000,00	0,00	92 506,35	
	IV - 11	230 000,00	680 000,00	0,00	92 506,35	
	V - 11	230 000,00	910 000,00	0,00	92 506,35	
	VI - 11	230 000,00	1 140 000,00	0,00	92 506,35	
	VII - 11	230 000,00	1 370 000,00	0,00	92 506,35	uplynutie 40 % Lehoty výstavby
	VIII - 11	230 000,00	1 600 000,00	0,00	92 506,35	
	IX - 11	230 000,00	1 830 000,00	0,00	92 506,35	
	X - 11	100 000,00	1 930 000,00	0,00	92 506,35	
	XI - 11	50 000,00	1 980 000,00	0,00	92 506,35	
	XII - 11	20 000,00	2 000 000,00	0,00	92 506,35	
2012	I - 12	0,00	2 000 000,00	0,00	92 506,35	
	II - 12	0,00	2 000 000,00	0,00	92 506,35	
	III - 12	0,00	2 000 000,00	0,00	92 506,35	uplynutie 70 % Lehoty výstavby
	IV - 12	352 000,00	2 352 000,00	0,00	92 506,35	
	V - 12	352 000,00	2 704 000,00	0,00	92 506,35	
	VI - 12	352 000,00	3 056 000,00	0,00	92 506,35	
	VII - 12	352 000,00	3 408 000,00	0,00	92 506,35	
	VIII - 12	356 000,00	3 764 000,00	0,00	92 506,35	
	IX - 12	0,00	3 764 000,00	0,00	92 506,35	
	X - 12	0,00	3 764 000,00	0,00	92 506,35	
	XI - 12	0,00	3 764 000,00	0,00	92 506,35	
	Celkom	3 764 000,00		92 506,35		



Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šacht Bobrovec k 12.01.2011

Zberač EA-0-3-1-1

čís.	šachty	Y	X	V - dna šachty	V - poklopu šachty	hlbka šachty	spad	vzd. šacht
EA-0-3-1-1	4	379915,02	1188327,22	636,69	0	2,21		
	4	379914,79	1188327,14	0	638,9			
							47,35	49,84
EA-0-3-1-1	3	379923,41	1188278,09	639,05	0	1,96		
	3	379923,68	1188278,12	0	641,01			
							19,15	59,53
EA-0-3-1-1	2	379921,28	1188218,6	640,19	0	2,13		
	2	379921,5	1188218,66	0	642,32			
							24,73	56,21
EA-0-3-1-1	1	379919,98	1188162,41	641,58	0	1,92		
	1	379920,16	1188162,36	0	643,5			

165,58



Zoznam kanalizačných prípojek - Bobrovec k 12.01.2011

Zberač EA-0-3-1-1

číslo prípojky	Y	X	V potrubia	V terénu	spad promile	dĺžka m	hlbka m	poznámka
			V dna	V poklopu				
4								
508/5 p.č.	379916,911	1188316,15	637,42	639,23	27,61	13,04	1,81	bod napojenia prípojky
508/5	379904,06	1188313,95	637,78	639,47			1,69	revízná šachta prípojky
508/6 p.č.	379920,346	1188296,03	638,39	640,51	19,7	12,18	2,12	bod napojenia prípojky
508/6	379908,34	1188293,98	638,63	640,19			1,56	revízná šachta prípojky
3								
508/7 p.č.	379922,851	1188262,47	639,45	641,35	16,2	9,26	1,9	bod napojenia prípojky
508/7	379913,61	1188261,91	639,6	641,45			1,85	revízná šachta prípojky
600 s.č.	379922,621	1188256,05	639,57	641,5	22,67	8,38	1,93	bod napojenia prípojky
600	379914,28	1188255,3	639,76	641,18			1,42	revízná šachta prípojky
511 p.č.	379921,326	1188219,88	640,17	642,29	23,68	3,8	2,12	bod napojenia prípojky
511	379917,53	1188220,02	640,26	642,31			2,05	revízná šachta prípojky
2								
633 s.č.	379920,536	1188186,44	641,09	643	111,91	2,77	1,91	bod napojenia prípojky
633	379923,31	1188186,38	641,4	643			1,6	revízná šachta prípojky
1								

49,43



Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šacht Bobrovec k 18.12.2010

Stoka EA-4

čís. šachty	Y	X	V - dna šachty	V - poklopu šachty	hlbka šachty	spad	vzd. šacht
EA-4	4	380601,846	1188413,768	629,83	0	2,15	
	4	380601,81	1188413,758	0	631,98		
						29,59	49
EA-4	5	380572,76	1188374,34	631,28	0	2,18	
	5	380572,93	1188374,26	0	633,46		
						22,65	51,65
EA-4	6	380542,37	1188332,58	632,45	0	2,17	
	6	380542,549	1188332,593	0	634,62		
						18,8	50
EA-4	7	380507,379	1188296,869	633,39	0	1,97	
	7	380507,53	1188296,78	0	635,36		

150,65



Zoznam kanalizačných prípojek - Bobrovec k 18.12.2010

stoka EA-4

číslo prípojky	Y	X	V potrubia	V terénu	spad promile	dĺžka m	hlbka m	poznámka
			V dna	V poklopu				
4								
698/2 p.č.	380588,839	1188396,14	630,53	632,47	581,82	2,2	1,94	bod napojenia prípojky
698/2	380587,03	1188397,47	631,81	633,01			1,2	revizná šachta prípojky
5								
707/3 p.č.	380568,805	1188368,91	631,43	633,46	84	2,5	2,03	bod napojenia prípojky
707/3	380566,82	1188370,35	631,64	633,76			2,12	revizná šachta prípojky
713 p.č.	380559,029	1188355,47	631,86	633,89	36,84	3,8	2,03	bod napojenia prípojky
713	380555,94	1188357,72	632	634,27			2,27	revizná šachta prípojky
624 s.č.	380550,655	1188343,97	632,24	364,26	140	2,5	-267,98	bod napojenia prípojky
624	380548,6	1188345,46	632,59	634,59			2	revizná šachta prípojky
690 s.č.	380550,074	1188343,17	632,26	634,28	49,15	5,9	2,02	bod napojenia prípojky
690	380554,85	1188339,69	632,55	634,65			2,1	revizná šachta prípojky
6								
649 s.č.	380534,826	1188324,88	632,8	634,78	191,67	1,2	1,98	bod napojenia prípojky
649	380533,97	1188325,72	633,03	635,03			2	revizná šachta prípojky
939/2 p.č.	380521,787	1188311,57	633,15	635,05	30,77	13	1,9	bod napojenia prípojky
939/2	380529,21	1188300,95	633,55	635,19			1,64	revizná šachta prípojky
732/2 p.č.	380517,499	1188307,2	633,27	635,15	254,55	1,1	1,88	bod napojenia prípojky
732/2	380516,69	1188307,99	633,55	635,44			1,89	revizná šachta prípojky
205 s.č.	380512,449	1188302,04	633,4	635,25	52,59	11,6	1,85	bod napojenia prípojky
205	380513,29	1188290,44	634,01	635,6			1,59	revizná šachta prípojky
735/1 p.č.	380508,733	1188298,25	633,5	635,33	83,33	2,4	1,83	bod napojenia prípojky
735/1	380507,03	1188299,92	633,7	635,45			1,75	revizná šachta prípojky
7								



[Handwritten signature]

**ZOZNAM SKÚŠOK TESNOSTÍ KANALIZAČNÉHO POTRUBIA,
 KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT, REVÍZNYCH ŠÁCHT A PRÍPOJOK**

Stavebný objekt: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa				
Stoka	Monitorovaný úsek /od š-po š/		Číslo protokolu	Dátum
EA - 4	4	5	03/2011	14.1.2011
EA - 4	5	6	02/2011	14.1.2011
EA - 4	6	7	01/2011	14.1.2011
EA-0-3-1-1	1	2	06/2011	14.1.2011
EA-0-3-1-1	2	3	05/2011	14.1.2011
EA-0-3-1-1	3	4	04/2011	18.1.2011

Stavebný objekt: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa				
Stoka	Monitorovaný úsek /od š-po š/		Číslo protokolu	Dátum
EA - 4	4		1/š/2011	14.1.2011
EA - 4	5		2/š/2011	14.1.2011
EA - 4	6		3/š/2011	14.1.2011
EA - 4	7		4/š/2011	14.1.2011
EA-0-3-1-1	1		5/š/2011	14.1.2011
EA-0-3-1-1	2		6/š/2011	14.1.2011
EA-0-3-1-1	3		7/š/2011	14.1.2011
EA-0-3-1-1	4		8/š/2011	14.1.2011

