

Faktúra č. 21105004

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B		DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo 21105004 Variabilný symbol : 21105004 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš	
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 13.09.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 15.06.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.05.2011	

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac máj 2011 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	265 675.91 EUR
DPH 20% :	53 135.18 EUR

Celkom s DPH:	318 811.09 EUR
=====	
Zádržné 10%:	26 567.59 EUR
Doteraz zadržané 10%	
z čiastkových faktúr 21101003	12 438.46 EUR
21101004	2 995.75 EUR
21102006	2 995.75 EUR

Neuhradené zádržné spolu:	18 429.96 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 44 997.55 EUR

K úhrade bez DPH :	284 105.87 EUR
K úhrade celkom s DPH:	337 241.05 EUR
=====	

Akcia č.:213
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

22 JUN 2011

MUDr. Alexander Štefkovský
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -
 - ekologický podnik a.s.,
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 finančná účtárka

Liptovská
 vodárenská
 spoločnosť, a.s.
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

24 JUN 2011

Ing. Ján Kazár
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

© Datalock software

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Číslo faktúry:

21105003

ZHOTOVITEL: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEL:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068

Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		4 649 882,73 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	194 059,57	265 675,91	459 735,48
3	zádržné EUR:	19 405,96	26 567,59	45 973,55
4	vyplatené zádržné EUR:	976,00	44 997,55	45 973,55
5	k úhrade EUR:	175 629,61	284 105,87	459 735,48

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatú prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:



Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:



Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:



Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	850 740,61	0,00	0,00	0,00	850 740,61
		Domové prípojky	119 630,86	0,00	0,00	0,00	119 630,86
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	633 854,09	101 447,98	117 470,29	218 918,27	414 935,82
		Domové prípojky	162 070,37	22 936,59	39 367,81	62 304,40	99 765,97
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	783 963,75	0,00	0,00	0,00	783 963,75
		Domové prípojky	145 827,99	0,00	0,00	0,00	145 827,99
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	1 447 380,67	0,00	86 738,41	86 738,41	1 360 642,26
		Domové prípojky	241 480,91	0,00	22 099,40	22 099,40	219 381,51
	[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH)		4 384 949,25	124 384,57	265 675,91	390 060,48	3 994 888,77
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		131 548,48	0,00	0,00	0,00	131 548,48
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00
Celkový rozpočet Diela							
	CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2]		4 649 882,73	194 059,57	265 675,91	459 735,48	4 190 147,25

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš



22 JUN 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	2 183,00	m3	29,82	65 097,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 183,00	65 097,06
2.	Detto, tr.4	2 150,00	m3	32,66	70 219,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 150,00	70 219,00
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	265,00	m3	38,46	10 191,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	265,00	10 191,90
4.	Paženie záťažné do 4 m	4 415,00	m2	9,53	42 074,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 415,00	42 074,95
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	4 206,00	m2	16,85	70 871,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 206,00	70 871,10
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9		m3			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Obsyp potrubia	795,40	m3	32,93	26 192,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	795,40	26 192,52
8.	Dodávka piesku na obsyp	249,00	m3	32,93	8 199,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	249,00	8 199,57
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	3 620,00	m3	27,80	100 636,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 620,00	100 636,00
10.	Štrkodra fr. 0-8	1 714,00	t	16,65	28 538,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 714,00	28 538,10
11.	Čerpanie vody	660,00	hod	11,90	7 854,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	660,00	7 854,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	60,00	m	87,00	5 220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60,00	5 220,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,31	km	800,00	1 048,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	1,31000	1 048,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 240,00	m2	23,75	29 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 240,00	29 450,00
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	7 125,00	m2	5,02	35 767,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125,00	35 767,50
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	824,00	m2	9,30	7 663,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	824,00	7 663,20
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	100,00	m3	38,50	3 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	3 850,00
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	612,00	m	10,12	6 193,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	612,00	6 193,44
19.	Výčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 313,50	m	3,50	4 597,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 313,50	4 597,25
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	9,80	m3	112,50	1 102,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9,80	1 102,50
21.	Debnenie dosiek	33,80	m2	13,58	459,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33,80	459,00
22.	Podklad z kameniva obalov. tr. 2, hr. 20 cm	480,00	m2	36,22	17 385,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480,00	17 385,60
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 ø8	2 059,00	m2	35,00	72 065,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 059,00	72 065,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	1 372,00	m2	5,77	7 916,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 372,00	7 916,44
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	33,00	t	13,09	431,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33,00	431,97
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	45,00	m2	4,47	201,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	201,15
27.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	7 125,00	m2	15,00	106 875,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125,00	106 875,00
28.	Postrek živичný spojovací	7 125,00	m2	1,00	7 125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	5 254,00	m	4,52	23 748,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 254,00	23 748,08
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt, zálievka	216,00	m	2,51	542,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	216,00	542,16
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1 200,00
32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 313,50	m	28,55	37 500,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 313,50	37 500,43
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	82,00	ks	59,15	4 850,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	82,00	4 850,30



22 JUN 2011



22 JUN 2011

34.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	20,50	m3	115,50	2 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	2 367,75
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	41,00	ks	750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	30 750,00
36.	Skuška tesnosti kanalizácie DN 300	1 313,50	m	3,20	4 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,50	4 203,20
37.	Zabezpečenie koncov	33,00	ks	149,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	4 917,00
38.	Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dĺžky vodovodu	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	6,00	ks	72,74	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	436,44
40.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				850 740,61		0,00		0,00		0,00		850 740,61

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



22 JUN 2011
22 JUN 2011



22 JUN 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	325,00	m3	29,82	9 691,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	325,00	9 691,50
2.	Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	72,00	m3	41,02	2 953,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	72,00	2 953,44
3.	Detto, tr. 4	308,00	m3	32,66	10 059,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	308,00	10 059,28
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	61,10	m3	38,50	2 352,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61,10	2 352,35
5.	Paženie príložené do 2m	642,00	m2	4,90	3 145,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	642,00	3 145,80
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	63,00	m	91,66	5 774,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	63,00	5 774,58
7.	Spätné zasypy												
	- zasyyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	103,00	m3	27,80	2 863,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	103,00	2 863,40
	- obsyp potrubia	103,00	m3	32,93	3 391,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	103,00	3 391,79
	- pieskové lôžko hr.15 cm	62,00	m3	32,93	2 041,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	62,00	2 041,66
	- štrkodra 0+8	278,00	t	16,65	4 628,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,00	4 628,70
	- štrkopiesok	202,00	m3	32,93	6 651,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202,00	6 651,86
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	195,00	m2	37,20	7 254,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195,00	7 254,00
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,53	km	800,00	424,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,53000	424,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	162,00	m2	5,05	818,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	162,00	818,10
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	355,00	m	4,52	1 604,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	355,00	1 604,60
12.	Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodre hr. 20+23 cm + kamenivo obaľované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrubníkov	195,00	m2	80,33	15 664,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195,00	15 664,35
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	26,00	t	13,09	340,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26,00	340,34
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	532,00	m	3,20	1 702,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	532,00	1 702,40
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	532,00	m	12,20	6 490,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	532,00	6 490,40
16.	Domová revízia šachty DN 1000	8,00	ks	700,00	5 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,00	5 600,00
17.	Domová plastová revízia šachty DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyyp a obsyp pieskom - potrebné zemné práce - komplet - skúšky	68,00	ks	361,37	24 573,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,00	24 573,16
18.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón	13,50	m3	118,90	1 605,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13,50	1 605,15
19.	Neosadené												
	Celkom				119 630,86		0,00		0,00		0,00		119 630,86

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa:

22 JUN 2011

22 JUN 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	1 791,80	m3	29,82	53 431,48	479,11	14 287,06	437,79	13 054,90	916,90	27 341,96	874,90	26 089,52
2.	Detto, tr.4	1 791,80	m3	32,66	58 520,19	482,19	15 748,33	437,79	14 298,22	919,98	30 046,55	871,82	28 473,64
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	24,50	m3	38,46	942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	942,27
4.	Paženie záťažné do 4 m	698,90	m2	9,53	6 660,52	312,72	2 980,22	318,72	3 037,40	631,44	6 017,62	67,46	642,90
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	2 795,12	m2	16,85	47 097,77	1 250,86	21 076,99	1 274,92	21 482,40	2 525,78	42 559,39	269,34	4 538,38
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	850,50	m3	27,80	23 643,90	622,70	17 311,06	220,00	6 116,00	842,70	23 427,06	7,80	216,84
7.	Obsyp potrubia	850,50	m3	32,93	28 006,97	208,57	6 868,21	278,58	9 173,64	487,15	16 041,85	363,35	11 965,12
8.	Dodávka piesku na obsyp	137,28	m3	32,93	4 520,63	33,95	1 117,97	100,00	3 293,00	133,95	4 410,97	3,33	109,66
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	1 769,77	m3	27,80	49 199,61	0,00	0,00	444,23	12 349,59	444,23	12 349,59	1 325,54	36 850,02
10.	Štrkodra fr. 0-8	728,73	t	16,65	12 133,35	0,00	0,00	353,18	5 880,45	353,18	5 880,45	375,55	6 252,90
11.	Čerpanie vody - dažďovej	125,00	hod	11,90	1 487,50	10,00	119,00	0,00	0,00	10,00	119,00	115,00	1 368,50
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	25,00	m	87,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2 175,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,25	km	800,00	1 000,00	0,30068	240,54	0,34865	278,92	0,64933	519,46	0,60067	480,54
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 347,90	m2	23,75	32 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,90	32 012,63
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	6 234,50	m2	5,02	31 297,19	112,50	564,75	288,09	1 446,21	400,59	2 010,96	5 833,91	29 286,23
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	898,60	m2	9,30	8 356,98	112,50	1 046,25	432,78	4 024,85	545,28	5 071,10	353,32	3 285,88
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	135,00	m3	38,50	5 197,50	3,08	118,58	16,50	635,25	19,58	753,83	115,42	4 443,67
18.	Trativedy z drenážnych trubiek DN 150	430,50	m	10,12	4 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	4 356,66
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 248,00	m	3,50	4 368,00	300,68	1 052,38	348,65	1 220,28	649,33	2 272,66	598,67	2 095,34
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	8,64	m3	112,50	972,00	2,05	230,63	1,70	191,25	3,75	421,88	4,89	550,12
21.	Debne dosiek	30,24	m2	13,58	410,66	5,40	73,33	5,20	70,62	10,60	143,95	19,64	266,71
22.	Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm, miest. kom., bet. plocha	2 246,50	m2	19,51	43 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,50	43 829,22
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	1 497,60	m2	5,77	8 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,60	8 641,15
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	14,20	t	13,09	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	185,88
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	20,20	m2	4,47	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	90,29
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	6 234,50	m2	15,00	93 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,50	93 517,50
27.	Postrek živичný spojovací	6 234,50	m2	1,00	6 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,50	6 234,50
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	4 992,00	m	4,52	22 563,84	190,16	859,52	115,40	521,61	305,56	1 381,13	4 686,44	21 182,71
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	315,00	m	2,51	790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	790,65
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 100,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 248,00	m	28,55	35 630,40	300,68	8 584,41	338,03	9 650,76	638,71	18 235,17	609,29	17 395,23
32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	80,00	ks	59,15	4 732,00	17,00	1 005,55	28,00	1 656,20	45,00	2 661,75	35,00	2 070,25
33.	Ostatné konštr.na potrubí vedení dno sagiet hr. nad 200 mm z betónu vodostaj v 4.k.c20/25	5,50	m3	115,50	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	635,25



22 JUN 2011

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	40,00	ks	750,00	30 000,00	9,00	6 750,00	10,00	7 500,00	19,00	14 250,00	21,00	15 750,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 248,00	m	4,70	5 865,60	300,68	1 413,20	338,03	1 588,74	638,71	3 001,94	609,29	2 863,66
36.	Spádisková časť šachty - dodávka a montáž	2,00	ks	1189,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2 378,00
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	1,20	m3	102,70	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	123,24
38.	Porealizačné zameranie, geometrický plán, dokumentácia skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
39.	Osadenie orientačných stĺpkov	24,00	ks	72,74	1 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1 745,76
39.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				633 854,09		101 447,98		117 470,29		218 918,27		414 935,82

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



22 JUN 2011

22 JUN 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	474,32	m3	29,82	14 144,22	88,97	2 653,09	116,17	3 464,19	205,14	6 117,28	269,18	8 026,94
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	125,20	m3	41,02	5 135,70	21,88	897,52	29,05	1 191,63	50,93	2 089,15	74,27	3 046,55
3.	Detto, tr. 4	484,64	m3	32,66	15 828,34	90,47	2 954,75	118,81	3 880,33	209,28	6 835,08	275,36	8 993,26
4.	Staženie výkop + zaistenie križujúcich vedení	68,60	m3	38,50	2 641,10	0,00	0,00	8,67	333,80	8,67	333,80	59,93	2 307,30
5.	Paženie príložné do 2m	985,60	m2	4,90	4 829,44	450,00	2 205,00	530,00	2 597,00	980,00	4 802,00	5,60	27,44
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	35,00	m	91,66	3 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3 208,10
7.	Spätné zasypy												
	- zasyyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	765,00	m3	27,80	21 267,00	137,42	3 820,28	140,27	3 899,51	277,69	7 719,79	487,31	13 547,21
	- obsyp potrubia	36,96	m3	32,93	1 217,09	36,01	1 185,81	0,00	0,00	36,01	1 185,81	0,95	31,28
	- pieskové lôžko hr.15 cm	110,00	m3	32,93	3 622,30	13,67	450,15	20,32	669,14	33,99	1 119,29	76,01	2 503,01
	- štrkodry 0+8	554,00	t	16,65	9 224,10	0,00	0,00	127,47	2 122,38	127,47	2 122,38	426,53	7 101,72
	- štrkoplesok	220,00	m3	32,93	7 244,60	0,00	0,00	101,04	3 327,25	101,04	3 327,25	118,96	3 917,35
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	271,60	m2	37,20	10 103,52	23,40	870,48	104,22	3 876,98	127,62	4 747,46	143,98	5 356,06
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,62	km	800,00	496,00	0,09390	75,12	0,15060	120,48	0,24450	195,60	0,37550	300,40
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	406,00	m2	5,05	2 050,30	0,00	0,00	31,32	158,17	31,32	158,17	374,68	1 892,13
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	1 478,40	m	4,52	6 682,37	52,00	235,04	211,60	956,43	263,60	1 191,47	1 214,80	5 490,90
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	271,04	m2	46,43	12 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,04	12 584,39
13.	Upravenie podkladu po prekopych pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	9,50	t	13,09	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	124,36
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	616,00	m	3,20	1 971,20	93,90	300,48	150,60	481,92	244,50	782,40	371,50	1 188,80
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	616,00	m	12,20	7 515,20	93,90	1 145,58	150,60	1 837,32	244,50	2 982,90	371,50	4 532,30
16.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - podsyp a obsyp pieskom potrebné zemné práce - komplet - skúšku vodotesnosti	88,00	ks	361,37	31 800,56	17,00	6 143,29	28,00	10 118,36	45,00	16 261,65	43,00	15 538,91
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	3,20	m3	118,90	380,48	0,00	0,00	2,80	332,92	2,80	332,92	0,40	47,56
18.	Neosadené												
	Celkom				162 070,37		22 936,59		39 367,81		62 304,40		99 765,97

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa:

22 JÚN 2011

22 JUN 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obýtný súbor Stošice-Západ - Okoličné - Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	3 394,20	m3	29,82	101 215,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 394,20	101 215,04
2.	Detto, tr.4	2 262,80	m3	32,66	73 903,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 262,80	73 903,05
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	46,00	m3	38,46	1 769,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46,00	1 769,16
4.	Paženie záťažné do 4 m	3 270,75	m2	9,53	31 170,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 270,75	31 170,25
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	6 074,30	m2	16,85	102 351,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 074,30	102 351,96
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 125,40	m3	27,80	31 286,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 125,40	31 286,12
7.	Obsyp potrubia	1 125,40	m3	32,93	37 059,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 125,40	37 059,42
8.	Dodávka piesku na obsyp	224,30	m3	32,93	7 386,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	224,30	7 386,20
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	1 691,40	m3	27,80	47 020,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 691,40	47 020,92
10.	Štrkodra fr. 0-8	1 122,70	t	16,65	18 692,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 122,70	18 692,96
11.	Čerpanie vody - dažďovej	195,00	hod	11,90	2 320,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195,00	2 320,50
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	45,00	m	87,00	3 915,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	3 915,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,87	km	800,00	1 496,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	1,87000	1 496,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	0,00	m2	23,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	0,00	m2	5,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	0,00	m2	9,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	231,00	m3	38,50	8 893,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	231,00	8 893,50
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	1 869,00	m	10,12	18 914,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 869,00	18 914,28
19.	Výčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 869,00	m	3,50	6 541,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 869,00	6 541,50
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	11,25	m3	112,50	1 265,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11,25	1 265,63
21.	Debnenie dosiek	34,25	m2	13,58	465,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34,25	465,12
22.	Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm, miest. kom., bet. plocha	0,00	m2	19,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	0,00	m2	5,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	41,00	t	13,09	536,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	41,00	536,69
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	104,00	m2	4,47	464,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	104,00	464,88
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	0,00	m2	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Postrek živичný spojovací	0,00	m2	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	0,00	m	4,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt zálievka	0,00	m	2,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1 600,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 224,00	m	28,55	34 945,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 224,00	34 945,20
31.a	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 250	0,00	m	17,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.b	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PE DN 100	645,00	m	51,48	33 204,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	645,00	33 204,60



22 JUN 2011

31.c	Pretlačanie rúr v hor. tr. 1 - 4 - pretlačanie potrubia s dodaním chráničky, zriadenie a odstránenie pretlačacej jamy s čerpaním vody a jej odvedením, zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením, s čerpaním vody a jej odvedením, nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním, utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním, zatiahnutie potrubia do chráničky	1,00	kpl	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 480,00
32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	78,00	ks	59,15	4 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	4 613,70
33.	Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachtiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	7,40	m3	115,50	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	854,70
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	39,00	ks	750,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	29 250,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 224,00	m	5,64	6 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	6 903,36
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 100, DN150, DN250	645,00	m	2,81	1 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	1 812,45
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	6,80	m3	102,70	698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	698,36
38.	Cerpacia stanica CS1 Stošice - stavebná časť, vodovodná prípojka, elektrické pripojka, oplotenie, spevnená plocha, strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprádu, meranie a regulácia, napojenie na dispečing, vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	36 614,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	36 614,00
39.	Cerpacia stanica CS1 Stošice - , strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprádu, meranie a regulácia, napojenie na dispečing,	1,00	kpl	130 319,20	130 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	130 319,20
40.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie, montáže											
	Celkom				783 963,75	0,00		0,00		0,00		783 963,75

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



22 JUN 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	762,30	m3	29,82	22 731,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	762,30	22 731,79
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	277,00	m3	41,02	11 362,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	277,00	11 362,54
3.	Detto, tr. 4	346,00	m3	32,66	11 300,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	346,00	11 300,36
4.	Sŕažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	105,00	m3	38,50	4 042,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00	4 042,50
5.	Paženie príložné do 2m	2 110,00	m2	4,90	10 339,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 110,00	10 339,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	35,00	m	91,66	3 208,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,00	3 208,10
7.	Spätné zasypy												
	- zasyyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 040,00	m3	27,80	28 912,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 040,00	28 912,00
	- obsyp potrubia	31	m3	32,93	1 020,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31,00	1 020,83
	- pieskové lôžko hr.15 cm	95	m3	32,93	3 128,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95,00	3 128,35
	- štrkodry 0+8	470	t	16,65	7 825,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	470,00	7 825,50
	- štrkopiesok	170	m3	32,93	5 598,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170,00	5 598,10
8.	Odstánenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	0,00	m2	37,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Výčinenie trasy kanalizácie v rovine	0,53	km	800,00	424,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,53000	424,00
10.	Odstánenie a znovuzriadenie zeleného pásu	0,00	m2	5,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	0,00	m	4,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	0,00	m2	46,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	10,30	t	13,09	134,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,30	134,83
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	525,00	m	3,20	1 680,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	525,00	1 680,00
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	525,00	m	12,20	6 405,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	525,00	6 405,00
16.	Domová plastová revízia šachta DN 400 v.cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom potrebné zemné práce - komplet skúšky vodotesnosti	75,00	ks	361,37	27 102,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,00	27 102,75
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	5,15	m3	118,90	612,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,15	612,34
18.	Neobsadené												
	Celkom				145 827,99		0,00		0,00		0,00		145 827,99

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



22 JUN 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hibenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	4 079,90	m3	29,82	121 662,62	0,00	0,00	386,75	11 532,89	386,75	11 532,89	3 693,15	110 129,73
2.	Detto, tr.4	3 679,90	m3	32,66	120 185,53	0,00	0,00	342,98	11 201,73	342,98	11 201,73	3 336,92	108 983,80
3.	Dolamovanie hibených výkopov	680,00	m3	38,46	26 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	26 152,80
4.	Paženie záťažné do 4 m	7 114,00	m2	9,53	67 796,42	0,00	0,00	729,55	6 952,61	729,55	6 952,61	6 384,45	60 843,81
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	5 819,00	m2	16,85	98 050,15	0,00	0,00	596,91	10 057,93	596,91	10 057,93	5 222,09	87 992,22
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9												
7.	Obsyp potrubia	1 755,00	m3	32,93	57 792,15	0,00	0,00	254,98	8 396,49	254,98	8 396,49	1 500,02	49 395,66
8.	Dodávka piesku na obsyp	542,00	m3	32,93	17 848,06	0,00	0,00	254,98	8 396,49	254,98	8 396,49	287,02	9 451,57
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	6 652,00	m3	27,80	184 925,60	0,00	0,00	158,37	4 402,69	158,37	4 402,69	6 493,63	180 522,91
10.	Štrkodra fr. 0-8	3 077,00	t	16,65	51 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	51 232,05
11.	Čerpanie vody	1 450,00	hod	11,90	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	17 255,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	80,00	m	87,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6 960,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,75	km	800,00	2 200,00	0,00000	0,00	0,32003	256,02	0,32003	256,02	2,42997	1 943,98
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	2 128,00	m2	23,75	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	50 540,00
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	10 187,80	m2	5,02	51 142,76	0,00	0,00	398,44	2 000,17	398,44	2 000,17	9 789,36	49 142,59
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	1 418,60	m2	9,30	13 192,98	0,00	0,00	398,44	3 705,49	398,44	3 705,49	1 020,16	9 487,49
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	160,00	m3	38,50	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	6 160,00
18.	Trativedy z drenážnych trubiek DN 150	543,00	m	10,12	5 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	5 495,16
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 754,00	m	3,50	9 639,00	0,00	0,00	320,03	1 120,11	320,03	1 120,11	2 433,97	8 518,89
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	26,50	m3	112,50	2 981,25	0,00	0,00	1,53	172,13	1,53	172,13	24,97	2 809,12
21.	Debnenie dosiek	78,40	m2	13,58	1 064,67	0,00	0,00	4,68	63,55	4,68	63,55	73,72	1 001,12
22.	Podklad z kameniva obalov. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8	3 546,60	m2	35,00	124 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,60	124 131,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	2 364,40	m2	5,77	13 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,40	13 642,59
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	45,00	t	13,09	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	589,05
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	93,00	m2	4,47	415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	415,71
27.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	10 187,80	m2	15,00	152 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,80	152 817,00
28.	Postrek živičný spojovací	10 187,80	m2	1,00	10 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,80	10 187,80
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	7 881,20	m	4,52	35 623,02	0,00	0,00	160,03	723,34	160,03	723,34	7 721,17	34 899,68
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt zálievka	352,00	m	2,51	883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	883,52
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 300,00



22 JUN 2011

32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 754,00	m	28,55	78 626,70	0,00	0,00	309,41	8 833,66	309,41	8 833,66	2 444,59	69 793,04
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	208,00	ks	59,15	12 303,20	0,00	0,00	20,00	1 183,00	20,00	1 183,00	188,00	11 120,20
34.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šacht hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	56,24	m3	115,50	6 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	6 495,72
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	104,00	ks	750,00	78 000,00	0,00	0,00	9,00	6 750,00	9,00	6 750,00	95,00	71 250,00
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	2 754,00	m	3,20	8 812,80	0,00	0,00	309,41	990,11	309,41	990,11	2 444,59	7 822,69
37.	Zabezpečenie koncov	42,00	ks	149,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	6 258,00
38.	Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dĺžky vodovodu	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	14,00	ks	72,74	1 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 018,36
40.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				1 447 380,67		0,00		86 738,41		86 738,41		1 360 642,26

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



22 JUN 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	563,00	m3	29,82	16 788,66	0,00	0,00	58,24	1 736,72	58,24	1 736,72	504,76	15 051,94
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	118,00	m3	41,02	4 840,36	0,00	0,00	11,92	488,96	11,92	488,96	106,08	4 351,40
3.	Delto, tr. 4	612,00	m3	32,66	19 987,92	0,00	0,00	62,21	2 031,78	62,21	2 031,78	549,79	17 956,14
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	103,00	m3	38,50	3 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	3 965,50
5.	Paženie príložné do 2m	1 120,00	m2	4,90	5 488,00	0,00	0,00	299,00	1 465,10	299,00	1 465,10	821,00	4 022,90
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	78,40	m	91,66	7 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	7 186,14
7.	Spätné zasypy												
	- zasypanie rýh so zhutnením (naloženie, presun)	213,50	m3	27,80	5 935,30	0,00	0,00	66,43	1 846,75	66,43	1 846,75	147,07	4 088,55
	- obsyp potrubia	213,50	m3	32,93	7 030,56	0,00	0,00	34,88	1 148,60	34,88	1 148,60	178,62	5 881,96
	- pieskové lôžko hr. 15 cm	130,80	m3	32,93	4 307,24	0,00	0,00	11,97	394,17	11,97	394,17	118,83	3 913,07
	- štrkodry 0+8	485,30	t	16,65	8 080,25	0,00	0,00	74,96	1 248,08	74,96	1 248,08	410,34	6 832,17
	- štrkopiesok	528,00	m3	32,93	17 387,04	0,00	0,00	17,62	580,23	17,62	580,23	510,38	16 806,81
8.	Odstánenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	512,00	m2	37,20	19 046,40	0,00	0,00	44,01	1 637,17	44,01	1 637,17	467,99	17 409,23
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,81	km	800,00	648,00	0,00000	0,00	0,08854	70,83	0,08854	70,83	0,72146	577,17
10.	Odstánenie a znovuzriadenie zeleného pásu	364,00	m2	5,05	1 838,20	0,00	0,00	35,69	180,23	35,69	180,23	328,31	1 657,97
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	1 861,00	m	4,52	8 411,72	0,00	0,00	97,80	442,06	97,80	442,06	1 763,20	7 969,66
12.	Podklad zo štrkopiesku hr. 60 cm, štrkodry hr. 20+23 cm + kamenivo obaľované hr. 4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrubníkov	512,00	m2	80,33	41 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	41 128,96
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom dreveným	62,70	t	13,09	820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	820,74
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	802,00	m	3,20	2 566,40	0,00	0,00	88,54	283,33	88,54	283,33	713,46	2 283,07
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	802,00	m	12,20	9 784,40	0,00	0,00	88,54	1 080,19	88,54	1 080,19	713,46	8 704,21
17.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m - podsyp osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	145,00	ks	361,37	52 398,65	0,00	0,00	20,00	7 227,40	20,00	7 227,40	125,00	45 171,25
18.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	32,30	m3	118,90	3 840,47	0,00	0,00	2,00	237,80	2,00	237,80	30,30	3 602,67
19.	Neosadené												
Celkom					241 480,91		0,00		22 099,40		22 099,40		219 381,51

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa:



22 JUN 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Názov		Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za mesiac EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	1,00	kpl	59 915,00	59 915,00	1,00	59 915,00		0,00	1,00	59 915,00	0,00	0,00
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	1,00	kpl	9 760,00	9 760,00	1,00	9 760,00		0,00	1,00	9 760,00	0,00	0,00
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	1,00	kpl	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	29 850,00
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	1,00	kpl	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	33 860,00
Celkom:						133 385,00		69 675,00		0,00		69 675,00		63 710,00

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš



22 JUN 2011



22 JUN 2011

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



Obdobie od 01.05.2011 do 31.05.2011



Vydané dňa 31.05.2011

22 JÚN 2011



p. Mutiš Albín



MESAČNÁ SPRÁVA

Obsah

- a) Postup prác
 - Projekt
 - Dokumentácia zhotoviteľa
 - Vzorky a atesty
 - Výroba
 - Dodávka na stavenisko
 - Stavebné práce
 - Časový harmonogram
- b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
- c) Výroba technologických zariadení a materiálov
- d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
- e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
- f) Zmeny nároky objednávateľa, a Nároky zhotoviteľa
- g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
- h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
- i) Geodetický elaborát
- j) Skúšky tesností
- k) Monitoring stôk

a) Postup prác

Projekt:

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa **24.11.2010 uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska**. Následne bol vydaný **pokyn k začatiu prác** na uvedenej stavbe dňa **24.11.2010**.

Dokumentácia zhotoviteľa:

Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná **realizačná projektová dokumentácia** pre daný projekt.

Vzorky a atesty:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:

V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Liptovský Mikuláš – Stošice - kanalizácia

Liptovský Mikuláš – Stošice - domové prípojky

Závažná Poruba - kanalizácia

Závažná Poruba - domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode vid'. príloha „Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie“

Stavebné práce realizované v období od **01.05.2011 do 31.05.2011**

(vid'. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Liptovský Mikuláš – Stošice - kanalizácia

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A DN 300mm v dĺžke 215,74m včítane 6ks kanalizačných šácht DN 1000, zberača B1 v dĺžke 31,21m včítane 2 ks kanalizačných šácht DN 1000 a zberača A-1 DN 300 v dĺžke 101,7m včítane 2 ks kanalizačných šácht DN 1000.

Liptovský Mikuláš – Stošice - domové prípojky

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači A v počte 20 ks, na zberači A-1 v počte 4 ks, na zberači B-1 v počte 4 ks. Spolu bolo na tomto objekte zrealizovaných 28 ks domových prípojok v celkovej dĺžke 150,6m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami.

Závažná Poruba - kanalizácia

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača B1 DN 300mm v dĺžke 170,03m včítane 5ks kanalizačných šácht DN 1000 a časť kanalizačného zberača F2 DN 300mm v dĺžke 150,0 m včítane 4ks kanalizačných šácht DN 1000.

Závažná Poruba – domové prípojky

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojek na zberači B1 v počte 10 ks a na zberači F2 v počte 10 prípojek. Spolu bolo na tomto objekte zrealizovaných 20 ks domových prípojek v celkovej dĺžke 88,54 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami.

Časový harmonogram:

V priebehu mesiaca 05/2011 Zhotoviteľ v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác – Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V dňoch 01.05. – 31.05. 2011 bola vykonaná Fotodokumentácia pred začatím prác – pôvodný stav na objekte Liptovský Mikuláš Stošice zberač A a v dňoch 01.05. – 31.05.2011 bola vykonaná Fotodokumentácia pred začatím prác – pôvodný stav na stavebnom objekte Liptovský Mikuláš Stošice - zberač A-1 a B-1 a na stavebnom objekte Závažná Poruba – zberač F2 a B.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:

(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

- V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Liptovský Mikuláš Stošice a Závažná Poruba

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia **nebola** výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci kalendárny týždeň/	18. kal. týždeň/	19. kal. týždeň/	20. kal. týždeň/	21. kal. týždeň/	22. kal. týždeň/
-	Január				
Riadiaci pracovníci na stavbe	3	3	3	3	3
Projekt manažéri	0	1	1	1	0
Geodeti	1	1	1	1	1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci	12	12	13	13	12

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje	18. kal. týždeň/	19. kal. týždeň/	20. kal. týždeň/	21. kal. týždeň/	22. kal. týždeň/
Zariadenia na rýpanie vrátane drviča kameňa a betónu	0	3	3	3	3
Nákladný automobil na odvoz vykopaného materiálu	4	4	4	4	4

Odvodňovacie a čerpacie zariadenia	0	2	2	2	2
Betonárky a domiešavače	-	-	-	-	-
Betónové pumpy a zariadenia na uskladnenie betónu	-	-	-	-	-
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie zariadenie	-	-	-	-	-
Zariadenia na zhutňovanie a valce	3	3	4	4	4
Zváracie zariadenia na spájanie polyetylénových rúr	-	-	-	-	-

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek objednávateľa.

- Vid'. príloha „*Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním stavebnému dozoru na odsúhlasenie*“

f) Zmeny, Nároky objednávateľa a Nároky zhotoviteľa.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Vid'. „Požiadavky na schválenie zmeny“

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Vid'. „Pokyny na zmenu“

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** žiadna nehoda.

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hľadiska kvality sa **proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.**

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

- Vid'. príloha „*Plán finančného plnenia*“

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných dôvodov:

- na doposiaľ odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

I) Geodetický elaborát:

- Vid'. príloha „**Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných prípojok**“

j) Skúšky tesností:

- Vid'. príloha „**Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revízných šácht a kanalizačných prípojok**“

k) Monitoring stôk:

- Vid'. príloha „**Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov**“

Príloha:

- Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.05.2011 (Príloha 1)
- Monitoring prác, stav k 31.05.2011 (Príloha 2)
- Plán finančného plnenia, stav k 31.05.2011 (Príloha 3)
- Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
- Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revízných šácht a prípojok (Príloha 5)
- Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov(Príloha 6)
- v(Príloha 5)

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.05.2011

Obdobie od 01.05.2011 do 31.05.2011



Vydané dňa 31.05.2011



22 JÚN 2011






Fotografia č. 1 – SO L. Mikuláš Stošice – rezanie krytu z asfaltu



Fotografia č. 2 –SO L. Mikuláš Stošice – postupný zásyp frakciou 0/8 DN 300

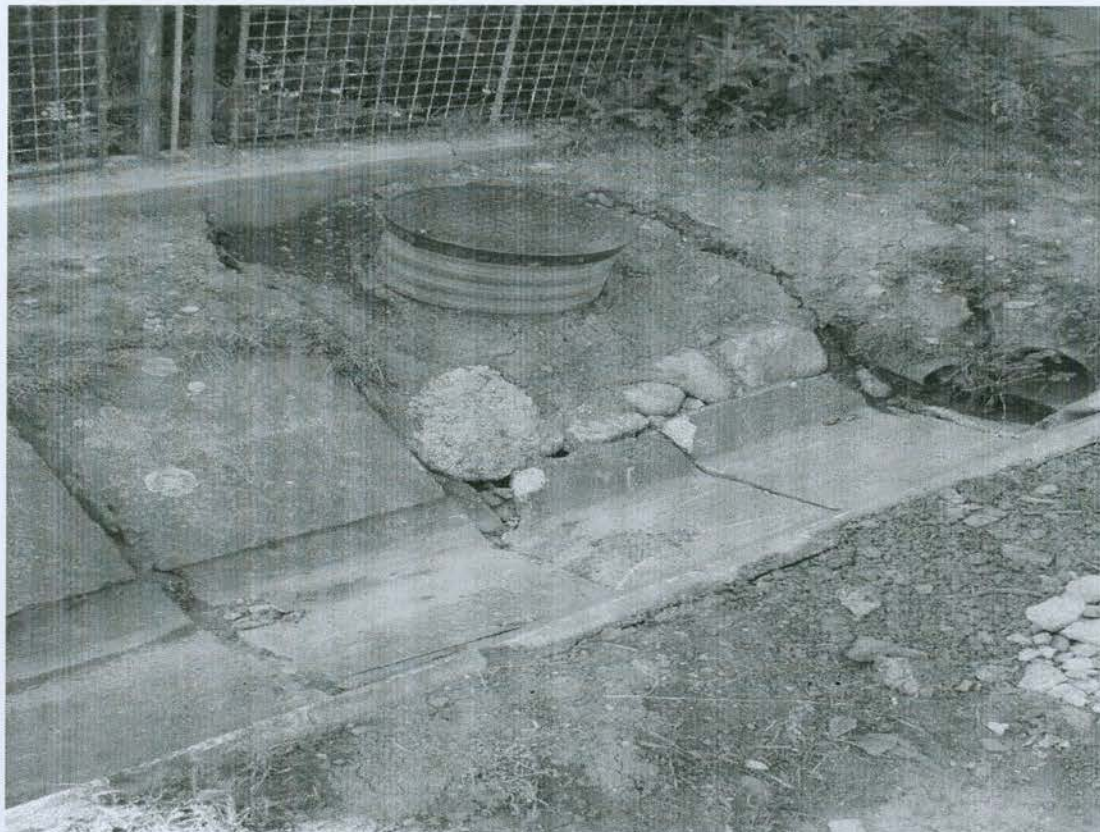


Fotografia č. 3 –SO L. Mikuláš Stošice – osadenie domovej šachtice mimo vozovky



Fotografia č. 4 –SO L. Mikuláš Stošice – hutnenie rýh



Fotografia č. 5 –SO Závažná Poruba– obsyp DN 300 materiálom frakcie 0/8 v pažiacom boxe

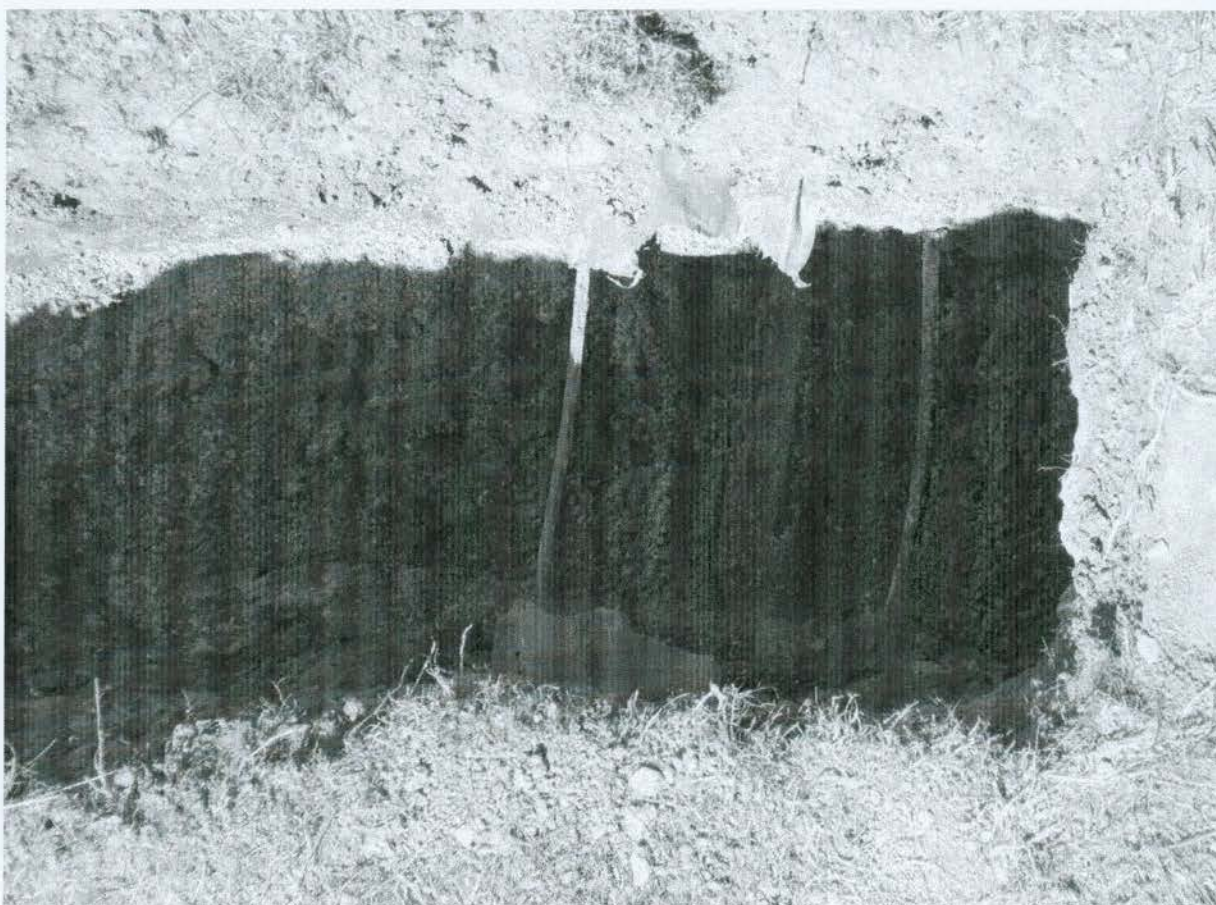

Fotografia č. 6 –SO Závažná Poruba – inžinierske siete T-COM, voda, elektro



Fotografia č. 7 – SO Závažná Poruba – zásyp rýh



Fotografia č. 8 – SO Závažná Poruba – založenie plastovej šachty
