

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel: Sa, vložka č. register: 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo 21103007 Variabilný symbol : 21103007 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 14.07.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 15.04.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.03.2011
--	--

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"
 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac marec 2011
 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	9 760.00 EUR
DPH 20% :	1 952.00 EUR
Celkom s DPH:	11 712.00 EUR
=====	
Zádržné 10%:	976.00 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
 v plnej výške 976.00 EUR.

K úhrade bez DPH :	9 760.00 EUR
K úhrade celkom s DPH:	11 712.00 EUR
	=====

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
Došlo:	18-04-2011
Číslo: 1788	Pril.:
Pridelené ref.:	

15-04-2011

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Komárňarska 2, 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -
 - ekologický podnik a.s.,
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 finančná účtárka

Akcia č.:212
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

16 APR. 2011

**LIPTOVSKÁ
 vodárenská
 spoločnosť, a.s.**
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Číslo faktúry: 21101007

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069
Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 949 452,97 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	92 506,35	9 760,00	102 266,35
3	zádržné EUR:	9 250,64	976,00	10 226,64
4	vyplatené zádržné EUR:	9 250,64	976,00	10 226,64
5	k úhrade EUR:	92 506,35	9 760,00	102 266,35

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacek

podpis:

pečiatka:

V L.Mikuláši 31.03.2011

Za stavebný dozor: 15 -04- 2011

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

16 APR. 2011

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:



Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	1 789 989,54	75 811,29	0,00	75 811,29	1 714 178,25	
		Domové prípojky	402 231,31	16 695,06	0,00	16 695,06	385 536,25	
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	189 069,82	0,00	0,00	0,00	189 069,82	
		Domové prípojky	24 620,01	0,00	0,00	0,00	24 620,01	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	1 030 578,87	0,00	0,00	0,00	1 030 578,87	
		Domové prípojky	168 992,57	0,00	0,00	0,00	168 992,57	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	124 197,29	0,00	0,00	0,00	124 197,29	
		Domové prípojky	34 575,90	0,00	0,00	0,00	34 575,90	
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)			3 764 255,31	92 506,35	0,00	92 506,35	3 671 748,96
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			112 927,66	0,00	0,00	0,00	112 927,66
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
Celkový rozpočet Diela								
	[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]		3 949 452,97	92 506,35	9 760,00	102 266,35	3 847 186,62	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

12-04-2011



12.04.2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	5 410,00	m3	29,82	161 326,20	540,23	16 109,66		0,00	540,23	16 109,66	4 869,77	145 216,54
2.	Detto, tr.4	4 420,00	m3	32,66	144 357,20	394,39	12 880,78		0,00	394,39	12 880,78	4 025,61	131 476,42
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	550,00	m3	38,46	21 153,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	550,00	21 153,00
4.	Paženie záťažné do 4 m	9 050,00	m2	9,53	86 246,50	781,19	7 444,74		0,00	781,19	7 444,74	8 268,81	78 801,76
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	7 365,00	m2	16,85	124 100,25	639,15	10 769,68		0,00	639,15	10 769,68	6 725,85	113 330,57
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9												
7.	Obsyp potrubia	1 636,00	m3	32,93	53 873,48	222,20	7 317,05		0,00	222,20	7 317,05	1 413,80	46 556,43
8.	Dodávka piesku na obsyp	654,00	m3	32,93	21 536,22	90,76	2 988,73		0,00	90,76	2 988,73	563,24	18 547,49
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	6 562,00	m3	27,30	179 142,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 562,00	179 142,60
10.	Štrkodra fr. 0-8	3 050,00	t	16,35	49 867,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 050,00	49 867,50
11.	Čerpanie vody	1 450,00	hod	11,90	17 255,00	11,00	130,90		0,00	11,00	130,90	1 439,00	17 124,10
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	80,00	m	87,00	6 960,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	6 960,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,73	km	800,00	2 184,00	0,31623	252,98		0,00	0,31623	252,98	2,41377	1 931,02
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	2 461,00	m2	23,75	58 448,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 461,00	58 448,75
	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	15 810,00	m2	5,02	79 366,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 810,00	79 366,20
15.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	1 640,00	m2	9,30	15 252,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 640,00	15 252,00
16.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	180,00	m3	38,50	6 930,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	180,00	6 930,00
17.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	1 250,00	m	10,12	12 650,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 250,00	12 650,00
18.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 728,50	m	3,50	9 549,75	316,23	1 106,81		0,00	316,23	1 106,81	2 412,27	8 442,94
19.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	15,75	m3	112,50	1 771,88	1,36	153,00		0,00	1,36	153,00	14,39	1 618,88
20.	Debnenie dosiek	47,25	m2	13,58	641,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47,25	641,66
21.	Podklad z kameniva obalov. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8	4 123,00	m2	35,00	144 305,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 123,00	144 305,00
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	4 123,00	m2	5,77	23 789,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 123,00	23 789,71
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	45,00	t	13,09	589,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	589,05
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	93,00	m2	4,47	415,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	93,00	415,71
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	15 810,00	m2	15,00	237 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 810,00	237 150,00
27.	Postrek živичný spojovací	15 810,00	m2	1,00	15 810,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 810,00	15 810,00
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	10 252,00	m	4,52	46 339,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 252,00	46 339,04
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	335,00	m	2,51	840,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	335,00	840,85
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	2 750,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 324,50	m	30,50	70 897,25	316,23	9 645,02		0,00	316,23	9 645,02	2 008,27	61 252,23
32.a	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 500	24,00	m	125,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,00	3 000,00
32.b	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 150	50,00	m	23,80	1 190,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,00	1 190,00
32.c	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 80	40,00	m	19,80	792,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40,00	792,00
32.d	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 63	290,00	m	17,20	4 988,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	290,00	4 988,00
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	126,00	ks	59,15	7 452,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	126,00	7 452,90
34.	Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	56,24	m3	115,50	6 495,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	56,24	6 495,72



12. 07. 2011

[Handwritten signature]

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	63,00	ks	750,00	47 250,00	8,00	6 000,00		0,00	8,00	6 000,00	55,00	41 250,00
36.	Skúška tesnosti kanalizácie	2 728,50	m	3,20	8 731,20	316,23	1 011,94		0,00	316,23	1 011,94	2 412,27	7 719,26
37.	Zabezpečenie koncov	8,00	ks	149,00	1 192,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,00	1 192,00
38.	Preložky nadzemných vedení	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	8,00	ks	72,74	581,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,00	581,92
40.	Čerpacia stanica ČS1 - stavebná časť, elektrické pripojka, prevádzkový rozvod silnoprádu vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	23 755,00	23 755,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	23 755,00
41.	Čerpacia stanica ČS1 - strojnotechnologická časť, , meranie a regulácia, napojenie na dispečing,	1,00	kpl	29 734,00	29 734,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	29 734,00
42.	Čerpacia stanica ČS2 - stavebná časť, elektrické pripojka, vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	24 986,00	24 986,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	24 986,00
43.	Čerpacia stanica ČS2 - strojnotechnologická časť, , meranie a regulácia, napojenie na dispečing,	1,00	kpl	31 342,00	31 342,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	31 342,00
44.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Čelkom				1 789 989,54		75 811,29		0,00		75 811,29		1 714 178,25

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	1 641,00	m3	29,82	48 934,62	85,33	2 544,54		0,00	85,33	2 544,54	1 555,67	46 390,08
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	236,00	m3	41,02	9 680,72	11,94	489,78		0,00	11,94	489,78	224,06	9 190,94
3.	Detto, tr. 4	1 382,00	m3	32,66	45 136,12	73,36	2 395,94		0,00	73,36	2 395,94	1 308,64	42 740,18
4.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	153,00	m3	38,50	5 890,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	153,00	5 890,50
5.	Paženie príložné do 2m	5 460,00	m2	5,10	27 846,00	379,22	1 934,02		0,00	379,22	1 934,02	5 080,78	25 911,98
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	185,00	m	91,66	16 957,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	185,00	16 957,10
7.	Spätné zášypy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zášyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	409,00	m3	27,30	11 165,70	118,12	3 224,68		0,00	118,12	3 224,68	290,88	7 941,02
	- obsyp potrubia	409,00	m3	32,93	13 468,37	37,68	1 240,80		0,00	37,68	1 240,80	371,32	12 227,57
	- pieskové lôžko hr.15 cm	204,00	m3	32,93	6 717,72	12,91	425,13		0,00	12,91	425,13	191,09	6 292,59
	- štrkodry 0+8	655,00	t	16,35	10 709,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	655,00	10 709,25
	- štrkopiesok	682,00	m3	32,93	22 458,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	682,00	22 458,26
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry	585,00	m2	37,20	21 762,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	585,00	21 762,00
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	1,37	km	800,00	1 096,00	0,09563	76,50		0,00	0,09563	76,50	1,27437	1 019,50
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	780,00	m2	5,05	3 939,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	780,00	3 939,00
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	2 340,00	m	4,52	10 576,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 340,00	10 576,80
12.	Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodry hr. 20+23 cm + kamenivo obalované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrubníkov	585,00	m2	80,33	46 993,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	585,00	46 993,05
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom dreveným	83,00	t	13,09	1 086,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	83,00	1 086,47
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	1 365,00	m	3,20	4 368,00	95,63	306,02		0,00	95,63	306,02	1 269,37	4 061,98
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	1 365,00	m	12,20	16 653,00	95,63	1 166,69		0,00	95,63	1 166,69	1 269,37	15 486,31
17.	Domová plastová revízia šachty DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - potrebné - skúšky podšyp a obsyp pieskom zemné práce - komplet vodotesnosti	195,00	ks	361,37	70 467,15	8,00	2 890,96		0,00	8,00	2 890,96	187,00	67 576,19
18.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	53,20	m3	118,90	6 325,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53,20	6 325,48
19.	Neosadené												
	Celkom				402 231,31		16 695,06		0,00		16 695,06		385 536,25

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Oleja

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

12-04-2011



12. 04. 2011

[Handwritten signature]



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-0-2" - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	306,10	m3	29,82	9 127,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	306,10	9 127,90
2.	Detto, tr.4	312,00	m3	32,66	10 189,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	312,00	10 189,92
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	20,00	m3	38,46	769,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20,00	769,20
4.	Paženie záťažné do 4 m	220,00	m2	9,53	2 096,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220,00	2 096,60
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	275,00	m2	16,85	4 633,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	275,00	4 633,75
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	371,00	m3	27,30	10 128,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	371,00	10 128,30
7.	Obsyp potrubia	371,00	m3	32,93	12 217,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	371,00	12 217,03
8.	Dodávka piesku na obsyp	43,73	m3	32,93	1 440,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	43,73	1 440,03
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	31,50	m3	27,30	859,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31,50	859,95
10.	Štrkodra fr. 0-8	165,00	t	16,35	2 697,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	165,00	2 697,75
11.	Čerpanie vody - dažďovej	504,00	hod	11,90	5 997,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	504,00	5 997,60
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	350,00	m	87,00	30 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350,00	30 450,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,22	km	800,00	176,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,22000	176,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	286,20	m2	23,75	6 797,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	286,20	6 797,25
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	1 722,00	m2	5,02	8 644,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 722,00	8 644,44
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	190,80	m2	9,30	1 774,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	190,80	1 774,44
17.	Oceľová chránička DN 500 chránička dl. 16,0 m montáž - objímky nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním	1,00	ks	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	11 200,00
18.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	15,60	m3	38,50	600,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,60	600,60
19.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	221,50	m	10,12	2 241,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	221,50	2 241,58
20.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	221,50	m	3,50	775,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	221,50	775,25
21.	Dosky podkladné z bet. C15/20	1,45	m3	112,50	163,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,45	163,13
22.	Debnenie dosiek	5,28	m2	13,58	71,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,28	71,70
	Podklad z kameniva obojov. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kari sieť 100/100 ø8	477,00	m2	35,00	16 695,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	477,00	16 695,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	318,00	m2	5,77	1 834,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	318,00	1 834,86
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	2,10	t	13,09	27,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,10	27,49



12.04.2011

[Handwritten signature]

26.	Detto, štrkodrvy hr. 150 mm	4,50	m2	4,47	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	20,12
27.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	1 722,00	m2	15,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	25 830,00
28.	Postrek živичný spojovací	1 722,00	m2	1,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
29.	Rezanie krytu vozovky (2x)	1 060,00	m	4,52	4 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	4 791,20
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	28,00	m	2,51	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	70,28
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	221,50	m	30,50	6 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	6 755,75
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	14,00	ks	59,15	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	828,10
35.	Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachtiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	4,20	m3	115,50	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	485,10
36.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	7,00	ks	750,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5 250,00
37.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	221,50	m	3,20	708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	708,80
38.	Zabezpečenie koncov	4,00	ks	149,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	596,00
39.	Obetónovanie potrubia v otvorenom výkope, betón tr. C15/20; dl 1 bm	1,00	kpl	102,70	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	102,70
40.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Celkom				189 069,82	0,00		0,00		0,00		189 069,82

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

12 -04- 2011



12.04.2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-0-2" - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	68,40	m3	29,82	2 039,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,40	2 039,69
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	25,00	m3	41,02	1 025,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	1 025,50
3.	Detto, tr. 4	70,20	m3	32,66	2 292,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70,20	2 292,73
4.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	25,00	m3	38,50	962,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	962,50
5.	Paženie príložené do 2m	140,00	m2	5,10	714,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140,00	714,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	10,00	m	91,66	916,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,00	916,60
7.	Spätné zásypy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	140,00	m3	27,30	3 822,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140,00	3 822,00
	- obsyp potrubia	5,25	m3	32,93	172,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,25	172,88
	- pieskové lôžko hr. 15 cm	18,90	m3	32,93	622,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18,90	622,38
	- štrkodry 0+8	65,00	t	16,35	1 062,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65,00	1 062,75
	- štrkopiesok	37,80	m3	32,93	1 244,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	37,80	1 244,75
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry	24,00	m2	37,20	892,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,00	892,80
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,11	km	800,00	88,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,11000	88,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	75,00	m2	5,05	378,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,00	378,75
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	48,00	m	4,52	216,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	48,00	216,96
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltbetón ABS hr. 5cm	24,00	m2	40,00	960,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,00	960,00
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	2,10	t	13,09	27,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,10	27,49
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	105,00	m	3,20	336,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00	336,00
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	105,00	m	12,20	1 281,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00	1 281,00
16.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - potrebné - skúšky zemné práce - komplet vodotesnosti	15,00	ks	361,37	5 420,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,00	5 420,55
17.	Obetonovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	1,20	m3	118,90	142,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,20	142,68
18.	Neobsadené												
	Celkom				24 620,01		0,00		0,00		0,00		24 620,01

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

12-04-2011



12.04.2011

Handwritten signature



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	4 131,00	m3	29,82	123 186,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 131,00	123 186,42
2.	Detto, tr.4	2 347,00	m3	32,66	76 653,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 347,00	76 653,02
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	82,00	m3	38,46	3 153,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	82,00	3 153,72
4.	Paženie záťažné do 4 m	2 133,00	m2	9,53	20 327,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 133,00	20 327,49
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	4 324,00	m2	16,85	72 859,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 324,00	72 859,40
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 730,00	m3	32,93	56 968,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 730,00	56 968,90
7.	Obsyp potrubia	612,00	m3	32,93	20 153,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	612,00	20 153,16
8.	Dodávka piesku na obsyp	612,00	m3	32,93	20 153,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	612,00	20 153,16
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	2 595,00	m3	27,30	70 843,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 595,00	70 843,50
10.	Štrkodra fr. 0-8	2 196,00	t	16,35	35 904,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 196,00	35 904,60
11.	Čerpanie vody - daždovej	505,00	hod	11,90	6 009,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	505,00	6 009,50
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	35,00	m	87,00	3 045,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,00	3 045,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,22	km	800,00	1 776,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	2,22000	1 776,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 274,00	m2	23,75	30 257,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 274,00	30 257,50
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	6 941,00	m2	5,02	34 843,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 941,00	34 843,82
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	826,00	m2	9,30	7 681,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	826,00	7 681,80
17.	Podchody pod štát. cestou pretláčanie potrubia s dodaním chráničky zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy, s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy, s čerpaním vody a jej odvedením - zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením, s čerpaním vody a jej odvedením - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním - zatiahnutie potrubia do chráničky	12,00	m	800,00	9 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12,00	9 600,00



12. 04. 2011

18.	Pôdchody pod vodným tokom zemné práce - komplet - osadenie a dodávka ocele rúry DN 324x8; obetónovanie 800/800 - zriadenie a odstránenie zemných hrádzok - osadenie a odstránenie ocele potrubia DN 1000 -2x na prevedenie vody dĺ. 13 m - spevnenie svahov - kamenný zához - spevnenie dna tokov - kamenná rovinanina hr. 500 mm	18,00	m	800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	14 400,00
19.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	521,00	m3	38,50	20 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	20 058,50
20.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	1 520,00	m	10,12	15 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	15 382,40
21.	Výčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 223,00	m	3,50	7 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	7 780,50
22.	Dosky podkladné z bet. B 7,5 m3	16,10	m3	112,50	1 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	1 811,25
23.	Debnenie dosiek	54,18	m2	13,58	735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	735,76
24.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8 regionálna cesta, miest. kom., bet. Plocha	2 123,00	m2	35,00	74 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,00	74 305,00
25.	Detto, štrkodrvy hr. 200 mm	1 414,80	m2	5,77	8 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,80	8 163,40
26.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	51,00	t	13,09	667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	667,59
27.	Detto, štrkodrvy hr. 150 mm	149,00	m2	4,47	666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	666,03
28.	Asfaltobetón ABS hr. 5cm I tr.	6 941,00	m2	15,00	104 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,00	104 115,00
29.	Postrek živčný spojovací	6 941,00	m2	1,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,00	6 941,00
30.	Rezanie krytu vozovky (4x)	4 530,00	m	4,52	20 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	20 475,60
31.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	315,00	m	2,51	790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	790,65
32.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00
33.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 223,00	m	30,50	67 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	67 801,50
34.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	164,00	ks	59,15	9 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	9 700,60
35.	ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	32,00	m3	115,50	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	3 696,00
36.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	82,00	ks	750,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	61 500,00
37.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	2 223,00	m	5,70	12 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	12 671,10
38.	Merný objekt vrátane el. pripojky	1,00	kpl	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 500,00
39.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Čelkom				1 030 578,87		0,00		0,00		0,00	1 030 578,87

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa

12-04-2011



Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek

12.04.2011

[Handwritten signature]



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC - Domové prípojky


Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	768,00	m3	29,82	22 901,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	768,00	22 901,76
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	88,00	m3	41,02	3 609,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	88,00	3 609,76
3.	Deľto, tr. 4	620,90	m3	32,66	20 278,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	620,90	20 278,59
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	64,00	m3	38,50	2 464,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	64,00	2 464,00
5.	Paženie prílože do 2m	1 520,00	m2	5,10	7 752,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 520,00	7 752,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	28,00	m	91,66	2 566,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28,00	2 566,48
7.	Spätné zasypy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zasypanie rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 033,00	m3	27,30	28 200,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 033,00	28 200,90
	- obsyp potrubia	36,00	m3	32,93	1 185,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36,00	1 185,48
	- pieskové lôžko hr.15 cm	108,00	m3	32,93	3 556,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	108,00	3 556,44
	- štrkodry 0+8	540,00	t	16,35	8 829,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540,00	8 829,00
	- štrkopiesok	180,00	m3	32,93	5 927,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	180,00	5 927,40
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry	394,24	m2	37,20	14 665,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	394,24	14 665,73
9.	Vytyčenie trasy kanalizácie v rovine	0,60	km	800,00	480,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,60000	480,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	591,40	m2	5,05	2 986,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	591,40	2 986,57
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	716,80	m	4,52	3 239,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	716,80	3 239,94
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	394,24	m2	40,00	15 769,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	394,24	15 769,60
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	8,50	t	13,09	111,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,50	111,27
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150, 200	600,00	m	3,20	1 920,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600,00	1 920,00
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150, 200	600,00	m	12,20	7 320,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600,00	7 320,00
16.	Domová plastová revízia šachty DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka šachty DN 400 + poklop - potrebné - skúšky	40,00	ks	361,37	14 454,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40,00	14 454,80
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	6,50	m3	118,90	772,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,50	772,85
18.	Neosadené												
	Celkom				168 992,57		0,00		0,00		0,00		168 992,57

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Oleksa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

12-04-2011

12.04.2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ - Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	520,30	m3	29,82	15 515,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	520,30	15 515,35
2.	Detto, tr.4	480,40	m3	32,66	15 689,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480,40	15 689,86
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	25,60	m3	38,46	984,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,60	984,58
4.	Paženie záťažné do 4 m	239,25	m2	9,53	2 280,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	239,25	2 280,05
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	717,75	m2	16,85	12 094,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	717,75	12 094,09
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	202,00	m3	32,93	6 651,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202,00	6 651,86
7.	Obsyp potrubia	202,00	m3	32,93	6 651,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202,00	6 651,86
8.	Dodávka piesku na obsyp	35,10	m3	32,93	1 155,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,10	1 155,84
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	456,00	m3	27,30	12 448,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	456,00	12 448,80
10.	Štrkodra fr. 0-8	210,54	t	16,35	3 442,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	210,54	3 442,33
11.	Čerpanie vody - dažďovej	520,00	hod	11,90	6 188,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	520,00	6 188,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	25,00	m	87,00	2 175,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	2 175,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,28	km	800,00	224,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,28000	224,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	75,60	m2	23,75	1 795,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,60	1 795,50
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	385,00	m2	5,02	1 932,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,00	1 932,70
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	50,40	m2	9,30	468,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,40	468,72
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	45,20	m3	38,50	1 740,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,20	1 740,20
18.	Tratívody z drenážnych trubiek DN 150	120,50	m	10,12	1 219,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120,50	1 219,46
19.	Výčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	278,00	m	3,50	973,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,00	973,00
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	1,73	m3	112,50	194,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,73	194,63
21.	Debnenie dosiek	5,76	m2	13,58	78,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,76	78,22
22.	Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 ø8	126,00	m2	35,00	4 410,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	126,00	4 410,00
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	84,00	m2	5,77	484,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	84,00	484,68
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	4,20	t	13,09	54,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4,20	54,98
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	10,20	m2	4,47	45,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,20	45,59
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	385,00	m2	15,00	5 775,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,00	5 775,00
27.	Postrek živичný spojovací	385,00	m2	1,00	385,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	160,00	m	4,52	723,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	160,00	723,20
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	55,00	m	2,51	138,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55,00	138,05
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	278,00	m	30,50	8 479,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,00	8 479,00



12. 04. 2011

32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	35,00	ks	59,15	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2 070,25
33.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr. c20/25	2,30	m3	115,50	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	265,65
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	8,00	ks	750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6 000,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	278,00	m	3,20	889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	889,60
36.	Zabezpečenie koncov	1,00	kpl	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	149,00
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	1,20	m3	102,70	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	123,24
38.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Čelkom				124 197,29		0,00		0,00		0,00	124 197,29

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

12 -04- 2011



Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

12. 04. 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	122,00	m3	29,82	3 638,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	122,00	3 638,04
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	18,20	m3	41,02	746,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18,20	746,56
3.	Detto, tr. 4	108,00	m3	32,66	3 527,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	108,00	3 527,28
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	28,00	m3	38,50	1 078,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28,00	1 078,00
5.	Paženie príložné do 2m	448,00	m2	5,10	2 284,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	448,00	2 284,80
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	15,00	m	91,66	1 374,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,00	1 374,90
7.	Spätné zásypy - zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun) - obsyp potrubia - pieskové lôžko hr.15 cm - štrkodra 0+8 - štrkopiesok	193,00 6,72 20 100 40	m3 m3 m3 t m3	27,30 32,93 32,93 16,35 32,93	5 268,90 221,29 658,60 1 635,00 1 317,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	193,00 6,72 20,00 100,00 40,00	5 268,90 221,29 658,60 1 635,00 1 317,20
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry	36,00	m2	37,20	1 339,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36,00	1 339,20
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,11	km	800,00	88,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,11000	88,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	98,00	m2	5,05	494,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	98,00	494,90
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	134,00	m	4,52	605,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	134,00	605,68
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodra hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	67,00	m2	40,00	2 680,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	67,00	2 680,00
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	1,20	t	13,09	15,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,20	15,71
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	112,00	m	3,20	358,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112,00	358,40
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	112,00	m	12,20	1 366,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112,00	1 366,40
16.	Domová plastová revizná šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsypanie a obsyp pieskom zemné práce - komplet vodočesnosť - potrebné - skúšky	16,00	ks	361,37	5 781,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16,00	5 781,92
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	0,80	m3	118,90	95,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,80	95,12
18.	Neobsadené												
	Celkom				34 575,90		0,00		0,00		0,00		34 575,90

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

12 -04- 2011

12. 04. 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie – Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	NÁZOV	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za mesiac EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
637004	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	1,00	kpl	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	1,00	9 760,00		9 760,00	1,00	0,00
637005	[3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	1,00	kpl	29 510,00	29 510,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1,00	29 510,00
716	Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	1,00	kpl	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1,00	33 000,00
Celkom:					72 270,00		0,00		9 760,00		9 760,00		62 510,00

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa


Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

12-04-2011



12.04.2011



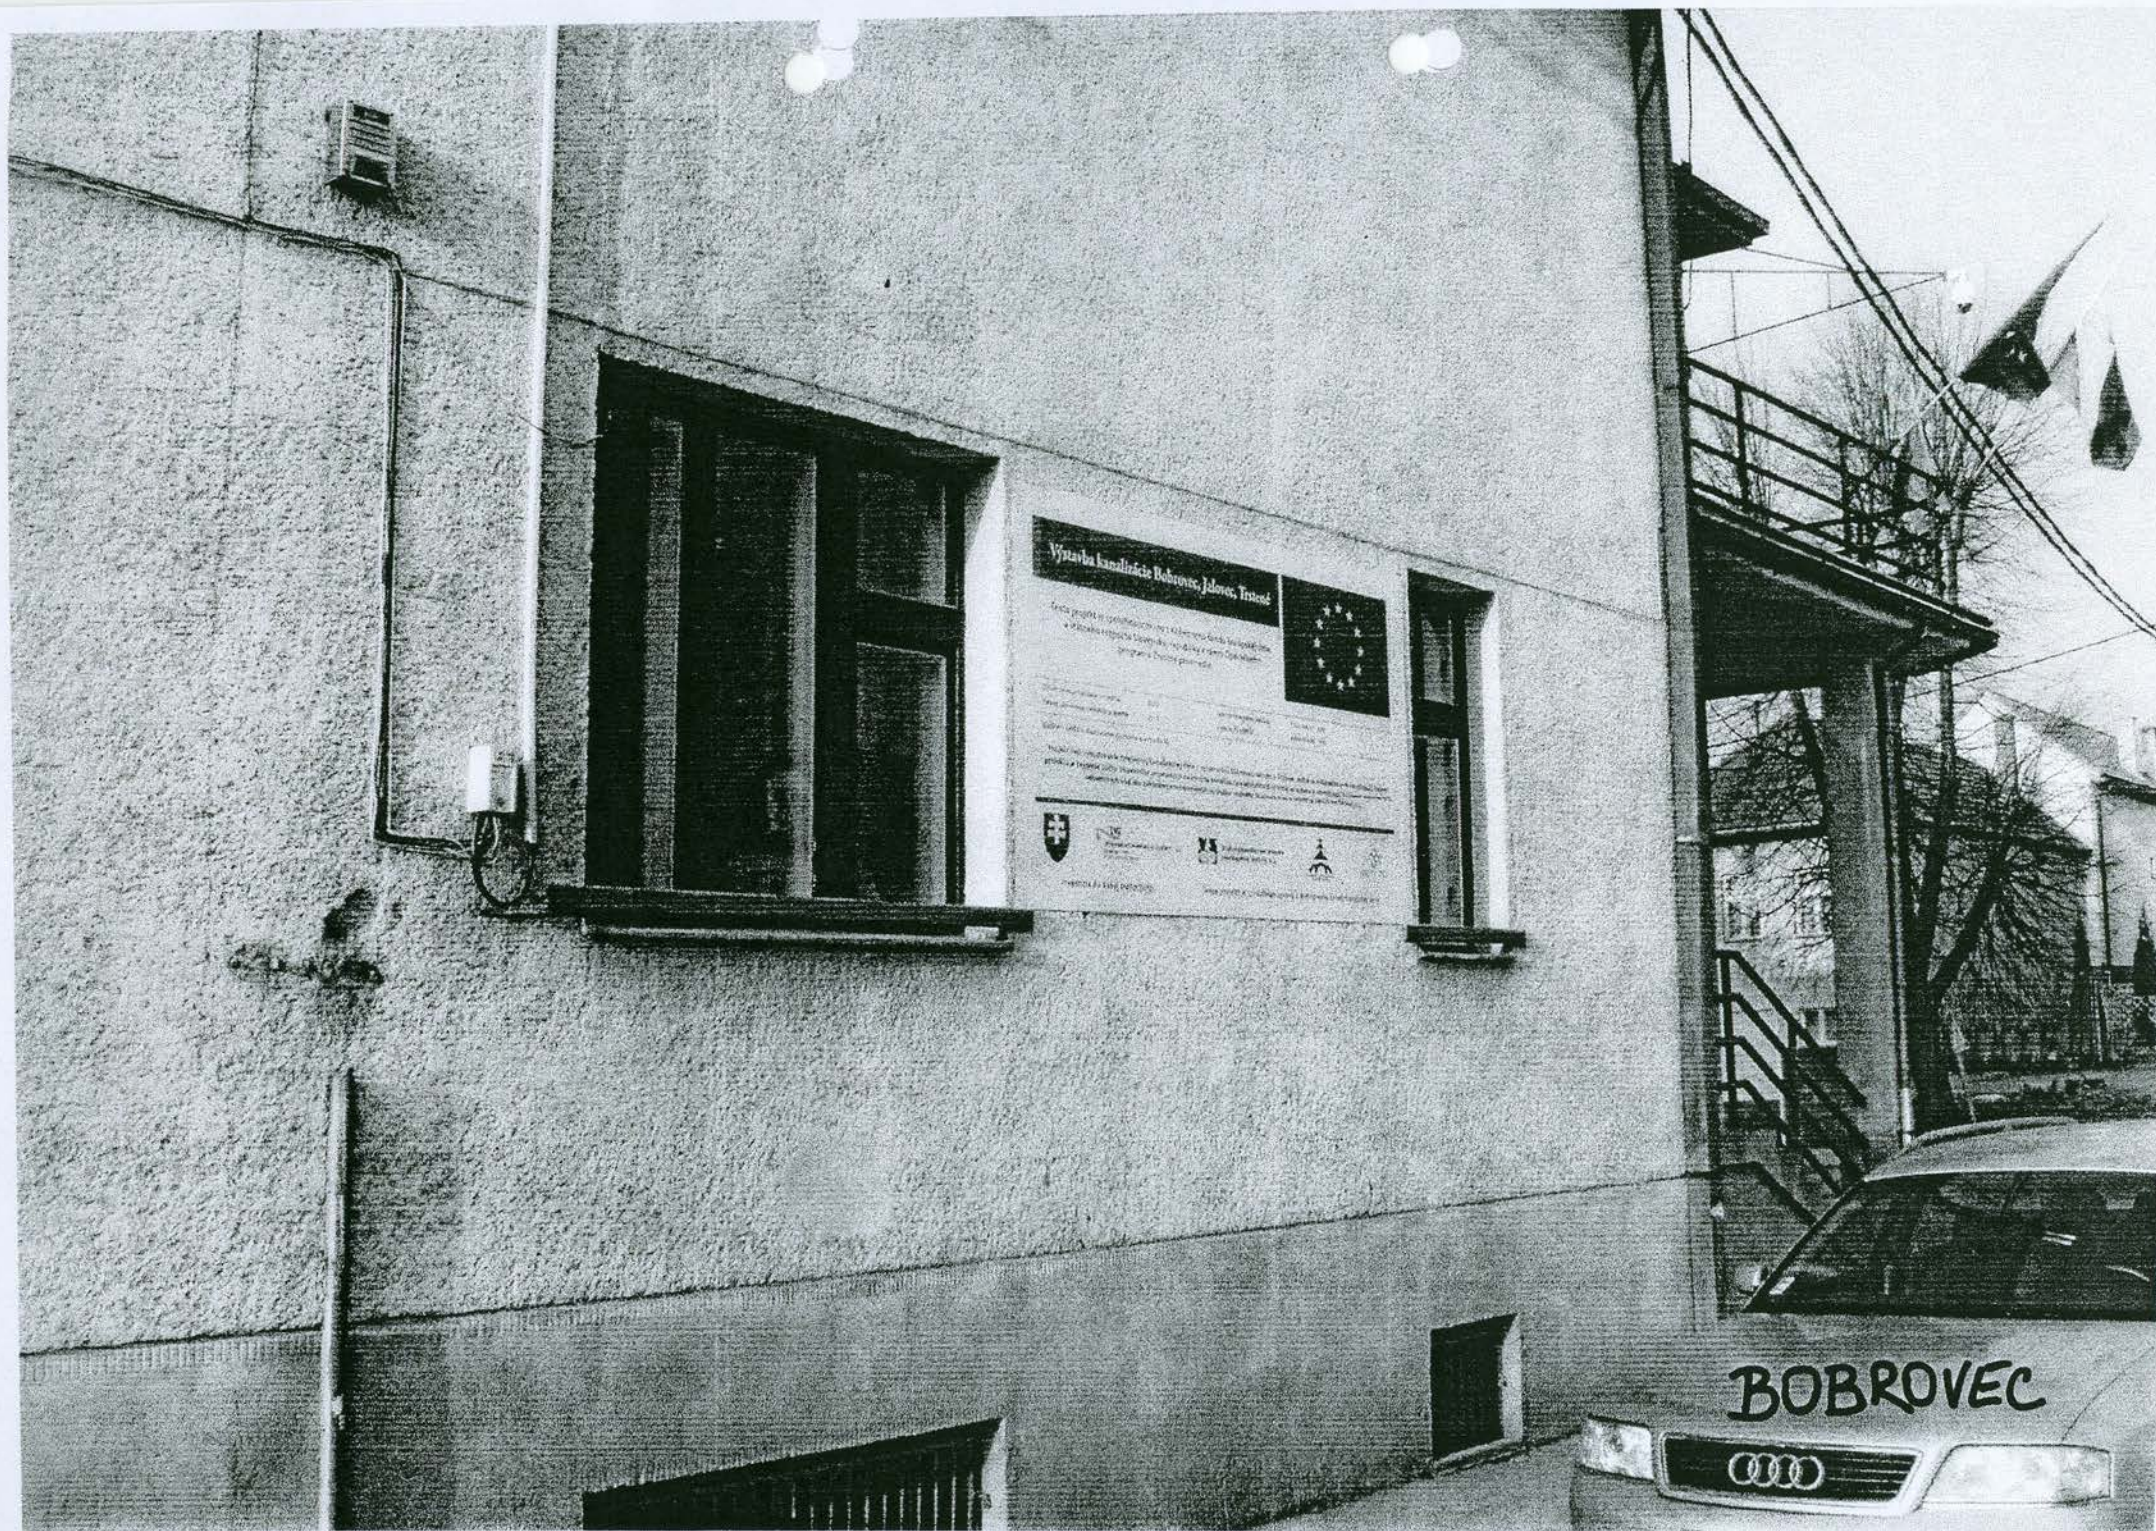

Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného
programu Životné prostredie.



Dátum začatia realizácie projektu: 2010
Dátum ukončenia realizácie projektu: 2012

Celkové investičné náklady: 4 253 036,51 EUR
Dotácia EU z OPŽP: 4 018 053,28 EUR

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR

Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v aglomerácii Bobrovec, Jalovec a Trstené. Jedná sa o dobudovanie kanalizácií. Cieľom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči EÚ.



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš



Vodohospodárske stavby
ekologicky podnik a.s.



Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie


BOBROVEC



YALOVEC

Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohezného fondu Európskej únie
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného
programu Životné prostredie.



Dátum zadania realizácie projektu:	2010	Celkové investičné náklady:	4 257 036,51 EUR
Dátum ukončenia realizácie projektu:	2012	Dotácia EÚ z OPŽP:	4 018 053,28 EUR

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR

Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v aglomerácii Bobrovec, Jalovec a Trstené. Jedná sa o dobudovanie kanalizácií. Cieľom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a obsluhu územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči EÚ.



Investícia do Vašej budúcnosti



OPERAČNÝ PROGRAM
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
2007-2013



Vodohospodárske stavby
ekologický podnik n.o.




Tento projekt je spolufinancovaný z Kohezného fondu Európskej únie

JALOVEC

Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie.

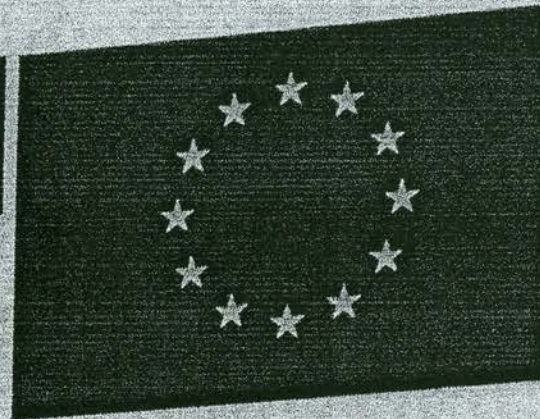

Dátum začatia realizácie projektu:	2010	Celkové investičné náklady:	4 253 036,51 EUR
Dátum ukončenia realizácie projektu:	2012	Dotácia EU z OPŽP:	4 018 053,28 EUR

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR

Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v aglomerácii Bobrovec, Jalovec a Trstené. Jedná sa o dobudovanie kanalizácií. Cieľom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a obsluhu územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči EÚ.



Investícia do Vašej budúcnosti



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Hlavné sídlo: 031 01 Liptovský Mikuláš



Vodohospodárske stavby
ekologicky podnik a.s.



Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

TRSTENÉ
