

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.

Pestovateľská 8

823 53 Bratislava

B.účet: 25071673/7500

IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673

Československá obchodná banka a.s. zahr.

Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č.

register: 339/B

FAKTÚRA číslo 21108009

Variabilný symbol : 21108009

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 36672441

DIČ: 2022236557

IČ DPH: SK2022236557

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

Došlo: 21-09-2011

Číslo: 4049
Príloha: 14.12.2011

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Dátum vystavenia faktúry

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

14.12.2011

PP

15.09.2011

31.08.2011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac august 2011
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH : 297 028.57 EUR

DPH 20% : 59 405.71 EUR

Celkom s DPH: 356 434.28 EUR

Zádržné 10%: 29 702.86 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 29 702.86 EUR.

K úhrade bez DPH : 297 028.57 EUR

K úhrade celkom s DPH: 356 434.28 EUR

Akcia č.:213

Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová

Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Telefón: 02/43424551

fax: 02/43420424

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -
- ekologický podnik a.s.,
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
finančná účtáreň

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2,4 832 03 Bratislava

Stavebný dozor v rámci projektu :

Výstavba kanalizácie - Beňadiková,

Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

15-09-2011

**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.**
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

© DataLock Software

Ing. Ján Kazár

Ben prikázanosť

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

MUDr. Alexander Siatkovský

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Číslo faktúry: 21108009

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068
Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		4 649 882,73 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	1 008 406,48	297 028,57	1 305 435,05
3	zádržné EUR:	100 840,65	29 702,86	130 543,51
4	vyplatené zádržné EUR:	100 840,65	29 702,86	130 543,51
5	k úhrade EUR:	1 008 406,48	297 028,57	1 305 435,05

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:



Za stavebný dozor:

15 -09- 2011

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:



Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

22 SEP. 2011

Handwritten signature of Ing. Ladislav Čupka and a blue circular stamp of 'Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.' with 'SKS' logo and 'Výdaj Slovenská komora stavebných inžinierov' text. The date '22 SEP. 2011' is stamped at the top.

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka	
717001	UHORSKÁ VES BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	850 740,61	296 019,88	107 189,74	403 209,62	447 530,99	
		Domové prípojky	119 630,86	21 087,66	55 235,67	76 323,33	43 307,53	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	633 854,09	250 849,79	0,00	250 849,79	383 004,30	
		Domové prípojky	162 070,37	69 218,04	0,00	69 218,04	92 852,33	
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	783 963,75	0,00	0,00	0,00	783 963,75	
		Domové prípojky	145 827,99	0,00	0,00	0,00	145 827,99	
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	1 447 380,67	243 471,51	117 604,04	361 075,55	1 086 305,12	
		Domové prípojky	241 480,91	58 084,60	16 999,12	75 083,72	166 397,19	
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)			4 384 949,25	938 731,48	297 028,57	1 235 760,05	3 149 189,20
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			131 548,48	0,00	0,00	0,00	131 548,48
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	
Celkový rozpočet Diela								
	CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2]		4 649 882,73	1 008 406,48	297 028,57	1 305 435,05	3 344 447,68	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš



15-09-2011



14 SEP 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	2 183,00	m3	29,82	65 097,06	1 314,82	39 207,93	454,73	13 560,05	1 769,55	52 767,98	413,45	12 329,08
2.	Detto, tr. 4	2 150,00	m3	32,66	70 219,00	1 314,82	42 942,02	454,73	14 851,48	1 769,55	57 793,50	380,45	12 425,50
3.	Dolamovanie hlbenných výkopov	265,00	m3	38,46	10 191,90	167,85	6 455,51	58,05	2 232,60	225,90	8 688,11	39,10	1 503,79
4.	Paženie záťažné do 4 m	4 415,00	m2	9,53	42 074,95	2 254,77	21 487,96	973,21	9 274,69	3 227,98	30 762,65	1 187,02	11 312,30
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	4 206,00	m2	16,85	70 871,10	2 166,34	36 502,83	935,05	15 755,59	3 101,39	52 258,42	1 104,61	18 612,68
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9		m3										
7.	Obsyp potrubia	795,40	m3	32,93	26 192,52	777,68	25 609,00	15,22	501,19	792,90	26 110,19	2,50	82,33
8.	Dodávka piesku na obsyp	249,00	m3	32,93	8 199,57	139,68	4 599,66	5,22	171,89	144,90	4 771,55	104,10	3 428,02
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	3 620,00	m3	27,80	100 636,00	1 060,07	29 469,95	588,99	16 373,92	1 649,06	45 843,87	1 970,94	54 792,13
10.	Štrkodra fr. 0-8	1 714,00	t	16,65	28 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	28 538,10
11.	Čerpanie vody	660,00	hod	11,90	7 854,00	409,50	4 873,05	184,50	2 195,55	594,00	7 068,60	66,00	785,40
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	60,00	m	87,00	5 220,00	37,60	3 271,20	16,40	1 426,80	54,00	4 698,00	6,00	522,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,31	km	800,00	1 048,00	0,81950	655,60	0,37809	302,47	1,19759	958,07	0,11241	89,93
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 240,00	m2	23,75	29 450,00	170,29	4 044,39	0,00	0,00	170,29	4 044,39	1 069,71	25 405,61
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	7 125,00	m2	5,02	35 767,50	599,84	3 011,20	452,03	2 269,19	1 051,87	5 280,39	6 073,13	30 487,11
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	824,00	m2	9,30	7 663,20	734,61	6 831,87	79,71	741,30	814,32	7 573,17	9,68	90,03
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	100,00	m3	38,50	3 850,00	59,00	2 271,50	31,00	1 193,50	90,00	3 465,00	10,00	385,00
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	612,00	m	10,12	6 193,44	590,42	5 975,05	16,66	168,60	607,08	6 143,65	4,92	49,79
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 313,50	m	3,50	4 597,25	819,50	2 868,25	378,09	1 323,32	1 197,59	4 191,57	115,91	405,68
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	9,80	m3	112,50	1 102,50	4,93	554,63	1,53	172,13	6,46	726,76	3,34	375,74
21.	Debnenie dosiek	33,80	m2	13,58	459,00	15,08	204,79	4,68	63,55	19,76	268,34	14,04	190,66
22.	Podklad z kameniva ošaľov. tr. 2, hr. 20 cm	480,00	m2	36,22	17 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	17 385,60
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 ø8	2 059,00	m2	35,00	72 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,00	72 065,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	1 372,00	m2	5,77	7 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	7 916,44
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	33,00	t	13,09	431,97	20,50	268,35	9,20	120,43	29,70	388,78	3,30	43,19
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	45,00	m2	4,47	201,15	27,90	124,71	12,60	56,32	40,50	181,03	4,50	20,12
27.	Asfaltobetón ABS hr. 5cm I tr.	7 125,00	m2	15,00	106 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125,00	106 875,00
28.	Postrek živичný spojovací	7 125,00	m2	1,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	5 254,00	m	4,52	23 748,08	949,08	4 289,84	729,38	3 296,80	1 678,46	7 586,64	3 575,54	16 161,44
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	216,00	m	2,51	542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	542,16
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00	0,00	0,00	1,00	1 200,00	0,00	0,00
32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 313,50	m	28,55	37 500,43	785,28	22 419,74	366,29	10 457,58	1 151,57	32 877,32	161,93	4 623,11
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	18,00	ks	59,15	1 064,70	18,00	1 064,70	46,00	2 720,90	64,00	3 785,60	18,00	1 064,70



15-09-2011



14 SEP 2011

34.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	20,50	m3	115,50	2 367,75	12,50	1 443,75	0,00	0,00	12,50	1 443,75	8,00	924,00
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	41,00	ks	750,00	30 750,00	29,00	21 750,00	9,00	6 750,00	38,00	28 500,00	3,00	2 250,00
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 313,50	m	3,20	4 203,20	819,50	2 622,40	378,09	1 209,89	1 197,59	3 832,29	115,91	370,91
37.	Zabezpečenie koncov	33,00	ks	149,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	4 917,00
38.	Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dĺžky vodovodu	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	6,00	ks	72,74	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	436,44
40.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				850 740,61		296 019,88		107 189,74		403 209,62		447 530,99

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	325,00	m3	29,82	9 691,50	62,93	1 876,57	204,61	6 101,47	267,54	7 978,04	57,46	1 713,46
2.	Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	72,00	m3	41,02	2 953,44	13,68	561,15	44,50	1 825,39	58,18	2 386,54	13,82	566,90
3.	Delto, tr. 4	308,00	m3	32,66	10 059,28	62,20	2 031,45	195,66	6 390,26	257,86	8 421,71	50,14	1 637,57
4.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	61,10	m3	38,50	2 352,35	9,20	354,20	27,40	1 054,90	36,60	1 409,10	24,50	943,25
5.	Paženie príložené do 2m	642,00	m2	4,90	3 145,80	343,82	1 684,72	295,87	1 449,76	639,69	3 134,48	2,31	11,32
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	63,00	m	91,66	5 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	5 774,58
7.	Spätné zásypy - zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun) - obsyp potrubia - pieskové lôžko hr. 15 cm - štrkodry 0-8 - štrkopiesok	103,00 103,00 62,00 278,00 202,00	m3 m3 m3 t m3	27,80 32,93 32,93 16,65 32,93	2 863,40 3 391,79 2 041,66 4 628,70 6 651,86	30,16 30,63 7,09 0,00 56,66	838,45 1 008,65 233,47 0,00 1 865,81	71,50 71,52 33,78 0,00 143,82	1 987,70 2 355,15 1 112,38 0,00 4 735,99	101,66 102,15 40,87 0,00 200,48	2 826,15 3 363,80 1 345,85 0,00 6 601,80	1,34 0,85 21,13 278,00 1,52	37,25 27,99 695,81 4 628,70 50,06
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	195,00	m2	37,20	7 254,00	45,79	1 703,39	148,48	5 523,46	194,27	7 226,85	0,73	27,15
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,53	km	800,00	424,00	0,07902	63,22	0,25941	207,53	0,33843	270,75	0,19157	153,25
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	162,00	m2	5,05	818,10	22,09	111,55	71,60	361,58	93,69	473,13	68,31	344,97
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	355,00	m	4,52	1 604,60	28,80	130,18	325,50	1 471,26	354,30	1 601,44	0,70	3,16
12.	Podklad zo štrkopiesku hr. 60 cm, štrkodry hr. 20+23 cm + kamenivo obaľované hr. 4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrúbnikov	195,00	m2	80,33	15 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	15 664,35
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	26,00	t	13,09	340,34	3,90	51,05	11,70	153,15	15,60	204,20	10,40	136,14
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	532,00	m	3,20	1 702,40	79,02	252,86	259,41	830,11	338,43	1 082,97	193,57	619,43
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	532,00	m	12,20	6 490,40	75,82	925,00	250,21	3 052,56	326,03	3 977,56	205,97	2 512,84
16.	Domová revízia šachta DN 1000	8,00	ks	700,00	5 600,00	2,00	1 400,00	0,00	0,00	2,00	1 400,00	6,00	4 200,00
17.	Domová plastová revízia šachta DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom - potrebné zemné práce - komplet - skúšky	68,00	ks	361,37	24 573,16	16,00	5 781,92	46,00	16 623,02	62,00	22 404,94	6,00	2 168,22
18.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	13,50	m3	118,90	1 605,15	1,80	214,02	0,00	0,00	1,80	214,02	11,70	1 391,13
19.	Neosadené												
	Celkom				119 630,86		21 087,66		55 235,67		76 323,33		43 307,53

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa :



14 SEP 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš


Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	1 791,80	m3	29,82	53 431,48	1 083,44	32 308,18	0,00	0,00	1 083,44	32 308,18	708,36	21 123,30
2.	Detto, tr.4	1 791,80	m3	32,66	58 520,19	1 086,52	35 485,75	0,00	0,00	1 086,52	35 485,75	705,28	23 034,44
3.	Dolamovanie hlbenných výkopov	24,50	m3	38,46	942,27	13,05	501,90	0,00	0,00	13,05	501,90	11,45	440,37
4.	Paženie záťažné do 4 m	698,90	m2	9,53	6 660,52	653,01	6 223,18	0,00	0,00	653,01	6 223,18	45,89	437,34
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	2 795,12	m2	16,85	47 097,77	2 662,05	44 855,54	0,00	0,00	2 662,05	44 855,54	133,07	2 242,23
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	850,50	m3	27,80	23 643,90	845,77	23 512,41	0,00	0,00	845,77	23 512,41	4,73	131,49
7.	Obsyp potrubia	850,50	m3	32,93	28 006,97	548,84	18 073,30	0,00	0,00	548,84	18 073,30	301,66	9 933,67
8.	Dodávka piesku na obsyp	137,28	m3	32,93	4 520,63	136,82	4 505,48	0,00	0,00	136,82	4 505,48	0,46	15,15
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	1 769,77	m3	27,80	49 199,61	506,19	14 072,08	0,00	0,00	506,19	14 072,08	1 263,58	35 127,53
10.	Štrkodra fr. 0-8	728,73	t	16,65	12 133,35	353,18	5 880,45	0,00	0,00	353,18	5 880,45	375,55	6 252,90
11.	Čerpanie vody - dažďovej	125,00	hod	11,90	1 487,50	74,50	886,55	0,00	0,00	74,50	886,55	50,50	600,95
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	25,00	m	87,00	2 175,00	15,50	1 348,50	0,00	0,00	15,50	1 348,50	9,50	826,50
13.	Výtyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,25	km	800,00	1 000,00	0,77842	622,73	0,00	0,00	0,77842	622,73	0,47158	377,27
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 347,90	m2	23,75	32 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,90	32 012,63
	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	6 234,50	m2	5,02	31 297,19	478,54	2 402,27	0,00	0,00	478,54	2 402,27	5 755,96	28 894,92
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	898,60	m2	9,30	8 356,98	681,42	6 337,20	0,00	0,00	681,42	6 337,20	217,18	2 019,78
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	135,00	m3	38,50	5 197,50	44,58	1 716,33	0,00	0,00	44,58	1 716,33	90,42	3 481,17
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	430,50	m	10,12	4 356,66	96,73	978,91	0,00	0,00	96,73	978,91	333,77	3 377,75
19.	Výčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 248,00	m	3,50	4 368,00	778,42	2 724,48	0,00	0,00	778,42	2 724,48	469,58	1 643,52
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	8,64	m3	112,50	972,00	3,75	421,88	0,00	0,00	3,75	421,88	4,89	550,12
21.	Debnenie dosiek	30,24	m2	13,58	410,66	10,60	143,95	0,00	0,00	10,60	143,95	19,64	266,71
22.	Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm, miest. kom., bet. plocha	2 246,50	m2	19,51	43 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,50	43 829,22
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	1 497,60	m2	5,77	8 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,60	8 641,15
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	14,20	t	13,09	185,88	9,90	129,59	0,00	0,00	9,90	129,59	4,30	56,29
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	20,20	m2	4,47	90,29	14,80	66,16	0,00	0,00	14,80	66,16	5,40	24,13
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm l tr.	6 234,50	m2	15,00	93 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,50	93 517,50
27.	Postrek živичný spojovací	6 234,50	m2	1,00	6 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,50	6 234,50
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	4 992,00	m	4,52	22 563,84	386,85	1 748,56	0,00	0,00	386,85	1 748,56	4 605,15	20 815,28
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zalievka	315,00	m	2,51	790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	790,65
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 100,00	1 100,00	1,00	1 100,00	0,00	0,00	1,00	1 100,00	0,00	0,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 248,00	m	28,55	35 630,40	752,46	21 482,73	0,00	0,00	752,46	21 482,73	495,54	14 147,67
32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	80,00	ks	59,15	4 732,00	52,00	3 075,80	0,00	0,00	52,00	3 075,80	28,00	1 656,20
33.	Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachtet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	5,50	m3	115,50	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	635,25



15-09-2011



14 SEP 2011

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	40,00	ks	750,00	30 000,00	22,00	16 500,00	0,00	0,00	22,00	16 500,00	18,00	13 500,00
35.	Skušba tesnosti kanalizácie DN 300	1 248,00	m	4,70	5 865,60	778,42	3 658,58	0,00	0,00	778,42	3 658,58	469,58	2 207,02
36.	Spádisková časť šachty - dodávka a montáž	2,00	ks	1189,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2 378,00
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	1,20	m3	102,70	123,24	0,85	87,30	0,00	0,00	0,85	87,30	0,35	35,94
38.	Porealizačné zameranie, geometrický plán, dokumentácia skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	24,00	ks	72,74	1 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1 745,76
39.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				633 854,09		250 849,79		0,00		250 849,79		383 004,30

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



15-09-2011



14 SEP 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	474,32	m3	29,82	14 144,22	223,70	6 670,74	0,00	0,00	223,70	6 670,74	250,62	7 473,48
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	125,20	m3	41,02	5 135,70	55,99	2 296,71	0,00	0,00	55,99	2 296,71	69,21	2 838,99
3.	Detto, tr. 4	484,64	m3	32,66	15 828,34	227,84	7 441,25	0,00	0,00	227,84	7 441,25	256,80	8 387,09
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	68,60	m3	38,50	2 641,10	30,50	1 174,26	0,00	0,00	30,50	1 174,26	38,10	1 466,84
5.	Paženie príložné do 2m	985,60	m2	4,90	4 829,44	980,00	4 802,00	0,00	0,00	980,00	4 802,00	5,60	27,44
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	35,00	m	91,66	3 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3 208,10
7.	Spätné zášypy												
	- zášyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	765,00	m3	27,80	21 267,00	297,97	8 283,57	0,00	0,00	297,97	8 283,57	467,03	12 983,43
	- obšyp potrubia	36,96	m3	32,93	1 217,09	36,01	1 185,81	0,00	0,00	36,01	1 185,81	0,95	31,28
	- pieskové lôžko hr.15 cm	110,00	m3	32,93	3 622,30	35,53	1 170,00	0,00	0,00	35,53	1 170,00	74,47	2 452,30
	- štrkodry 0+8	554,00	t	16,65	9 224,10	127,47	2 122,38	0,00	0,00	127,47	2 122,38	426,53	7 101,72
	- štrkopiesok	220,00	m3	32,93	7 244,60	119,77	3 944,03	0,00	0,00	119,77	3 944,03	100,23	3 300,57
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	271,60	m2	37,20	10 103,52	135,42	5 037,62	0,00	0,00	135,42	5 037,62	136,18	5 065,90
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,62	km	800,00	496,00	0,27340	218,72	0,00	0,00	0,27340	218,72	0,34660	277,28
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	406,00	m2	5,05	2 050,30	40,52	204,63	0,00	0,00	40,52	204,63	365,48	1 845,67
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	1 478,40	m	4,52	6 682,37	281,00	1 270,12	0,00	0,00	281,00	1 270,12	1 197,40	5 412,25
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	271,04	m2	46,43	12 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,04	12 584,39
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	9,50	t	13,09	124,36	4,20	54,98	0,00	0,00	4,20	54,98	5,30	69,38
14.	Skuška tesnosti kanalizácie DN 150	616,00	m	3,20	1 971,20	273,40	874,88	0,00	0,00	273,40	874,88	342,60	1 096,32
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	616,00	m	12,20	7 515,20	272,00	3 318,40	0,00	0,00	272,00	3 318,40	344,00	4 196,80
16.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - podsyp a obšyp pieskom potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	88,00	ks	361,37	31 800,56	52,00	18 791,24	0,00	0,00	52,00	18 791,24	36,00	13 009,32
17.	Obetonovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	3,20	m3	118,90	380,48	3,00	356,70	0,00	0,00	3,00	356,70	0,20	23,78
18.	Neosadené												
	Celkom				162 070,37		69 218,04		0,00		69 218,04		92 852,33

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



15 -09- 2011

Za zhotoviteľa :



14 SEP 2011

Prehľad zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné - Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	3 394,20	m3	29,82	101 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,20	101 215,04
2.	Detto, tr.4	2 262,80	m3	32,66	73 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,80	73 903,05
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	46,00	m3	38,46	1 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	1 769,16
4.	Paženie záťažné do 4 m	3 270,75	m2	9,53	31 170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,75	31 170,25
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	6 074,30	m2	16,85	102 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,30	102 351,96
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 125,40	m3	27,80	31 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,40	31 286,12
7.	Obsyp potrubia	1 125,40	m3	32,93	37 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,40	37 059,42
8.	Dodávka piesku na obsyp	224,30	m3	32,93	7 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,30	7 386,20
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	1 691,40	m3	27,80	47 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,40	47 020,92
10.	Štrkodra fr. 0-8	1 122,70	t	16,65	18 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,70	18 692,96
11.	Čerpanie vody - dažďovej	195,00	hod	11,90	2 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	2 320,50
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	45,00	m	87,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3 915,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,87	km	800,00	1 496,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,87000	1 496,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	0,00	m2	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	0,00	m2	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	0,00	m2	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	231,00	m3	38,50	8 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	8 893,50
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	1 869,00	m	10,12	18 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	18 914,28
19.	Výčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 869,00	m	3,50	6 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	6 541,50
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	11,25	m3	112,50	1 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	1 265,63
21.	Debnenie dosiek	34,25	m2	13,58	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	465,12
22.	Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm, miest. kom., bet. plocha	0,00	m2	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	0,00	m2	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	41,00	t	13,09	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	536,69
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	104,00	m2	4,47	464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	464,88
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	0,00	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Postrek živичný spojovací	0,00	m2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	0,00	m	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt zálievka	0,00	m	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 600,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 224,00	m	28,55	34 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	34 945,20
31.a	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 250	0,00	m	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.b	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PE DN 100	645,00	m	51,48	33 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	33 204,60



15-09-2011



14 SEP 2011

31.c	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1 - 4 - pretláčanie potrubia s dodaním chráničky, zriadenie a odstránenie pretlačacej jamy s čerpaním vody a jej odvedením, zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením, s čerpaním vody a jej odvedením, nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním, utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním, zatiahnutie potrubia do chráničky	1,00	kpl	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 480,00
32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	78,00	ks	59,15	4 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	4 613,70
33.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachtiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	7,40	m3	115,50	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	854,70
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového sítia D 48	39,00	ks	750,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	29 250,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 224,00	m	5,64	6 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	6 903,36
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 100, DN150, DN250	645,00	m	2,81	1 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	1 812,45
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	6,80	m3	102,70	698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	698,36
38.	Cerpacia stanica ČS1 Stošice - stavebná časť, vodovodná prípojka, elektrické prípojka, oplotenie, spevnená plocha, strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprádu, meranie a regulácia, napojenie na dispečing, vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl		36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	36 614,00
39.	Cerpacia stanica ČS1 Stošice - , strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprádu, meranie a regulácia, napojenie na dispečing,	1,00	kpl		130 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	130 319,20
40.	Neobsadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie, montáže												
	Čelkom				783 963,75	0,00		0,00		0,00			783 963,75

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



15 -09- 2011



14 SEP 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ - Okoliché - Domové pripojky


Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	762,30	m3	29,82	22 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,30	22 731,79
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	277,00	m3	41,02	11 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	11 362,54
3.	Detto, tr. 4	346,00	m3	32,66	11 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	11 300,36
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	105,00	m3	38,50	4 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	4 042,50
5.	Paženie príložné do 2m	2 110,00	m2	4,90	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	10 339,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	35,00	m	91,66	3 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3 208,10
7.	Spätne zášypy												
	- zášyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 040,00	m3	27,80	28 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	28 912,00
	- obsyp potrubia	31	m3	32,93	1 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	1 020,83
	- pieskové lôžko hr. 15 cm	95	m3	32,93	3 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	3 128,35
	- štrkodra 0+8	470	t	16,65	7 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	7 825,50
	- štrkopiesok	170	m3	32,93	5 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	5 598,10
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	0,00	m2	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,53	km	800,00	424,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,53000	424,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	0,00	m2	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	0,00	m	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodra hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr. 5cm	0,00	m2	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	10,30	t	13,09	134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	134,83
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	525,00	m	3,20	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	1 680,00
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	525,00	m	12,20	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	6 405,00
16.	Domová plastová revízia šachta DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom potrebné zemné práce - komplet skúšky vodotesnosti	75,00	ks	361,37	27 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	27 102,75
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	5,15	m3	118,90	612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	612,34
18.	Neosadené												
	Celkom				145 827,99		0,00		0,00		0,00		145 827,99

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



15 -09-2011



14 SEP 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	4 079,90	m3	29,82	121 662,62	1 069,94	31 905,62	530,82	15 829,05	1 600,76	47 734,67	2 479,14	73 927,95
2.	Detto, tr.4	3 679,90	m3	32,66	120 185,53	969,24	31 655,38	486,58	15 891,70	1 455,82	47 547,08	2 224,08	72 638,45
3.	Dolamovanie hlbenných výkopov	680,00	m3	38,46	26 152,80	113,87	4 379,44	88,48	3 402,94	202,35	7 782,38	477,65	18 370,42
4.	Paženie záťažné do 4 m	7 114,00	m2	9,53	67 796,42	2 064,60	19 675,64	1 121,75	10 690,28	3 186,35	30 365,92	3 927,65	37 430,50
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	5 819,00	m2	16,85	98 050,15	1 689,21	28 463,19	917,79	15 464,76	2 607,00	43 927,95	3 212,00	54 122,20
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9												
7.	Obsyp potrubia	1 755,00	m3	32,93	57 792,15	676,10	22 263,97	369,50	12 167,64	1 045,60	34 431,61	709,40	23 360,54
8.	Dodávka piesku na obsyp	542,00	m3	32,93	17 848,06	526,10	17 324,47	14,97	492,96	541,07	17 817,43	0,93	30,63
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	6 652,00	m3	27,80	184 925,60	345,31	9 599,62	215,72	5 997,02	561,03	15 596,64	6 090,97	169 328,96
10.	Štrkodra fr. 0-8	3 077,00	t	16,65	51 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	51 232,05
11.	Čerpanie vody	1 450,00	hod	11,90	17 255,00	137,00	1 630,30	0,00	0,00	137,00	1 630,30	1 313,00	15 624,70
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	80,00	m	87,00	6 960,00	8,00	696,00	0,00	0,00	8,00	696,00	72,00	6 264,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,75	km	800,00	2 200,00	0,84584	676,67	0,46322	370,58	1,30906	1 047,25	1,44094	1 152,75
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	2 128,00	m2	23,75	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	50 540,00
	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	10 187,80	m2	5,02	51 142,76	884,73	4 441,35	548,19	2 751,91	1 432,92	7 193,26	8 754,88	43 949,50
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	1 418,60	m2	9,30	13 192,98	884,73	8 227,99	508,19	4 726,17	1 392,92	12 954,16	25,68	238,82
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	160,00	m3	38,50	6 160,00	32,00	1 232,00	5,60	215,60	37,60	1 447,60	122,40	4 712,40
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	543,00	m	10,12	5 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	5 495,16
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 754,00	m	3,50	9 639,00	845,84	2 960,45	463,22	1 621,27	1 309,06	4 581,72	1 444,94	5 057,28
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	26,50	m3	112,50	2 981,25	4,42	497,26	0,00	0,00	4,42	497,26	22,08	2 483,99
21.	Debnenie dosiek	78,40	m2	13,58	1 064,67	13,52	183,60	0,00	0,00	13,52	183,60	64,88	881,07
22.	Podklad z kameniva obaf. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 ø8	3 546,60	m2	35,00	124 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,60	124 131,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	2 364,40	m2	5,77	13 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,40	13 642,59
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	45,00	t	13,09	589,05	9,00	117,81	12,10	158,39	21,10	276,20	23,90	312,85
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	93,00	m2	4,47	415,71	18,60	83,14	25,10	112,20	43,70	195,34	49,30	220,37
27.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	10 187,80	m2	15,00	152 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,80	152 817,00
28.	Postrek živичný spojovací	10 187,80	m2	1,00	10 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,80	10 187,80
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	7 881,20	m	4,52	35 623,02	1 415,86	6 399,69	443,39	2 004,12	1 859,25	8 403,81	6 021,95	27 219,21
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	352,00	m	2,51	883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	883,52
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 300,00	2 300,00	1,00	2 300,00	0,00	0,00	1,00	2 300,00	0,00	0,00



15-09-2011



14 SEP 2011

32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 754,00	m	28,55	78 626,70	815,16	23 272,82	445,52	12 719,60	1 260,68	35 992,42	1 493,32	42 634,28
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	208,00	ks	59,15	12 303,20	56,00	3 312,40	17,00	1 005,55	73,00	4 317,95	135,00	7 985,25
34.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachtiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	56,24	m3	115,50	6 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	6 495,72
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	104,00	ks	750,00	78 000,00	26,00	19 500,00	14,00	10 500,00	40,00	30 000,00	64,00	48 000,00
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	2 754,00	m	3,20	8 812,80	835,22	2 672,70	463,22	1 482,30	1 298,44	4 155,00	1 455,56	4 657,80
37.	Zabezpečenie koncov	42,00	ks	149,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	6 258,00
38.	Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dĺžky vodovodu	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	14,00	ks	72,74	1 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 018,36
40.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				1 447 380,67		243 471,51		117 604,04		361 075,55		1 086 305,12

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



15-09-2011



14 SEP 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	563,00	m3	29,82	16 788,66	136,71	4 076,70	39,13	1 166,86	175,84	5 243,56	387,16	11 545,10
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	118,00	m3	41,02	4 840,36	28,00	1 148,56	8,00	328,16	36,00	1 476,72	82,00	3 363,64
3.	Detto, tr. 4	612,00	m3	32,66	19 987,92	146,06	4 770,32	41,80	1 365,19	187,86	6 135,51	424,14	13 852,41
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	103,00	m3	38,50	3 965,50	16,48	634,48	18,54	713,79	35,02	1 348,27	67,98	2 617,23
5.	Paženie príložné do 2m	1 120,00	m2	4,90	5 488,00	796,16	3 901,18	224,28	1 098,97	1 020,44	5 000,15	99,56	487,85
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	78,40	m	91,66	7 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	7 186,14
7.	Spätné zásypy												
	- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	213,50	m3	27,80	5 935,30	140,03	3 892,83	65,70	1 826,46	205,73	5 719,29	7,77	216,01
	- obsyp potrubia	213,50	m3	32,93	7 030,56	89,06	2 932,75	21,27	700,42	110,33	3 633,17	103,17	3 397,39
	- pieskové lôžko hr.15 cm	130,80	m3	32,93	4 307,24	29,64	976,04	7,31	240,72	36,95	1 216,76	93,85	3 090,48
	- štrkodry 0+8	485,30	t	16,65	8 080,25	74,96	1 248,08	0,00	0,00	74,96	1 248,08	410,34	6 832,17
	- štrkopiesok	528,00	m3	32,93	17 387,04	136,57	4 497,25	36,26	1 194,04	172,83	5 691,29	355,17	11 695,75
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	512,00	m2	37,20	19 046,40	108,76	4 045,87	19,26	716,47	128,02	4 762,34	383,98	14 284,06
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,81	km	800,00	648,00	0,21940	175,52	0,05744	45,95	0,27684	221,47	0,53316	426,53
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	364,00	m2	5,05	1 838,20	82,24	415,31	32,44	163,82	114,68	579,13	249,32	1 259,07
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	1 861,00	m	4,52	8 411,72	241,60	1 092,04	42,80	193,46	284,40	1 285,50	1 576,60	7 126,22
12.	Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodry hr. 20+23 cm + kamenivo obalované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrubníkov	512,00	m2	80,33	41 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	41 128,96
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	62,70	t	13,09	820,74	10,16	132,99	4,30	56,29	14,46	189,28	48,24	631,46
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	802,00	m	3,20	2 566,40	219,40	702,08	57,44	183,81	276,84	885,89	525,16	1 680,51
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	802,00	m	12,20	9 784,40	208,20	2 540,04	54,04	659,29	262,24	3 199,33	539,76	6 585,07
17.	Domová plastová revizná šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - podsyp a obsyp pieskom - potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	145,00	ks	361,37	52 398,65	56,00	20 236,72	17,00	6 143,29	73,00	26 380,01	72,00	26 018,64
18.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	32,30	m3	118,90	3 840,47	5,60	665,84	1,70	202,13	7,30	867,97	25,00	2 972,50
19.	Neobsadené												
	Celkom				241 480,91		58 084,60		16 999,12		75 083,72		166 397,19

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



15 -09-2011

Za zhotoviteľa :



14 SEP 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Názov		Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za mesiac EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiasťka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiasťka EUR
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	1,00	kpl	59 915,00	59 915,00	1,00	59 915,00	0,00	0,00	1,00	59 915,00	0,00	0,00
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	1,00	kpl	9 760,00	9 760,00	1,00	9 760,00	0,00	0,00	1,00	9 760,00	0,00	0,00
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	1,00	kpl	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	29 850,00
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	1,00	kpl	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33 860,00
Celkom:						133 385,00		69 675,00		0,00		69 675,00		63 710,00

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš



15-09-2011



MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



Obdobie od 01.08.2011 do 31.08.2011

Vydané dňa 31.08.2011



15-09-2011



p. Mutiš Albín

14 SEP 2011



MESAČNÁ SPRÁVA

Obsah

- a) Postup prác
 - Projekt
 - Dokumentácia zhotoviteľa
 - Vzorky a atesty
 - Výroba
 - Dodávka na stavenisko
 - Stavebné práce
 - Časový harmonogram
- b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
- c) Výroba technologických zariadení a materiálov
- d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
- e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
- f) Zmeny nároky objednávateľa, a Nároky zhotoviteľa
- g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
- h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
- i) Geodetický elaborát
- j) Skúšky tesností
- k) Monitoring stôk

a) Postup prác

Projekt:

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa **24.11.2010 uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska**. Následne bol vydaný **pokyn k začatiu prác** na uvedenej stavbe dňa **24.11.2010**.

Dokumentácia zhotoviteľa:

Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná **realizačná projektová dokumentácia** pre daný projekt.

Vzorky a atesty:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:

V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Beňadiková- kanalizácia

Beňadiková - domové prípojky

Závažná Poruba - kanalizácia

Závažná Poruba - domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode vid'. príloha „Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie“

Stavebné práce realizované v období od **01.08.2011 do 31.08.2011**

(vid'. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Beňadiková- kanalizácia

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A DN 300 mm a časť kanalizačného zberača A-2 DN 300mm v celkovej dĺžke 378,09 m včítane 10 ks kanalizačných šácht DN 1000 mm.

Beňadiková- domové prípojky

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači A DN 160 mm a časť kanalizačných prípojok na zberači A-2 DN 160 mm v celkovom počte 46 ks domových prípojok v celkovej dĺžke 259,41 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami, z toho 42 ks DN 400 a 4 ks DN 1000.

Závažná Poruba - kanalizácia

Na tomto objekte bol zrealizovaný kanalizačný zberač B3 DN 300mm, kanalizačný zberač B1 DN 300mm, kanalizačný zberač G1 DN 300mm a kanalizačný zberač G1-1 DN 300mm v celkovej dĺžke 463,22 m včítane 14 ks kanalizačných šácht DN 1000 mm.

Závažná Poruba – domové prípojky

Na tomto objekte boli zrealizované kanalizačné prípojky na zberači B2 DN 160 mm, kanalizačné prípojky na zberači B3 DN 160 mm, kanalizačné prípojky na zberači B1 DN 160 mm a kanalizačné prípojky na zberači G1 DN 160 mm v celkovom počte 17 ks domových prípojek v celkovej dĺžke 57,44 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami DN 400.

Časový harmonogram:

V priebehu mesiaca 04/2011 Zhotoviteľ v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác – revízia č. 1 Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V období august 2011 bola vykonávaná Fotodokumentácia prác pri výstavbe kanalizácie na SO Beňadiková a na SO Závažná Poruba.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:

(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

- V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Liptovský Mikuláš Stošice a Závažná Poruba

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia **nebola** výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci kalendárny týždeň/	31. kal. týždeň/	32. kal. týždeň/	33. kal. týždeň/	34. kal. týždeň/	35. kal. týždeň/
-	Júl				
Riadiaci pracovníci na stavbe	1	1	1	1	1
Projekt manažéri	1	1	1	1	1
Geodeti	1	1	1	1	1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci	2	2	2	2	2
Pracovníci	30	30	30	30	30

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje	31. kal. týždeň/	32. kal. týždeň/	33. kal. týždeň/	34. kal. týždeň/	35. kal. týždeň/
Zariadenia na rýpanie vrátane drviča kameňa a betónu	4	4	6	6	6
Nákladný automobil na odvoz vykopaného materiálu	8	8	8	8	8

Odvodňovacie a čerpacie zariadenia	5	5	6	6	5
Betonárky a domiešavače	-	-	-	-	-
Betónové pumpy a zariadenia na uskladnenie betónu	-	-	-	-	-
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie zariadenie	-	1	1	-	1
Zariadenia na zhutňovanie a valce	5	5	5	5	5
Zváracie zariadenia na spájanie polyetylénových rúr	-	-	-	-	-

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek objednávateľa.

- Vid'. príloha „*Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním stavebnému dozoru na odsúhlasenie*“

f) Zmeny, Nároky objednávateľa a Nároky zhotoviteľa.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Vid'. „Požiadavky na schválenie zmeny“

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Vid'. „Pokyny na zmenu“

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** žiadna nehoda.

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hľadiska kvality sa proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

- Vid'. príloha „*Plán finančného plnenia*“

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných dôvodov:

- na doposiaľ odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

I) Geodetický elaborát:

- Vid'. príloha „*Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných prípojok*“

j) Skúšky tesností:

- Vid'. príloha „*Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revízných šácht a kanalizačných prípojok*“

k) Monitoring stôk:

- Vid'. príloha „*Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov*“

Príloha:

- Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.08.2011 (Príloha 1)
- Monitoring prác, stav k 31.08.2011 (Príloha 2)
- Plán finančného plnenia, stav k 31.08.2011 (Príloha 3)
- Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
- Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revízných šácht a prípojok (Príloha 5)
- Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov(Príloha 6)

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.08.2011

Obdobie od 01.08.2011 do 31.08.2011

Vydané dňa 31.08.2011



15 -09-2011



14 SEP 2011





Fotografia č. 1 – SO Beňadiková – Výkop kanalizácie




Fotografia č. 2 – SO Beňadiková – Hutnenie po vrstvách



Fotografia č. 3 – SO Beňadiková – Odstraňovanie asfaltu hrúbky 60 cm




Fotografia č. 4 – SO L. Mikuláš Stošice – Hutnenie po vrstvách

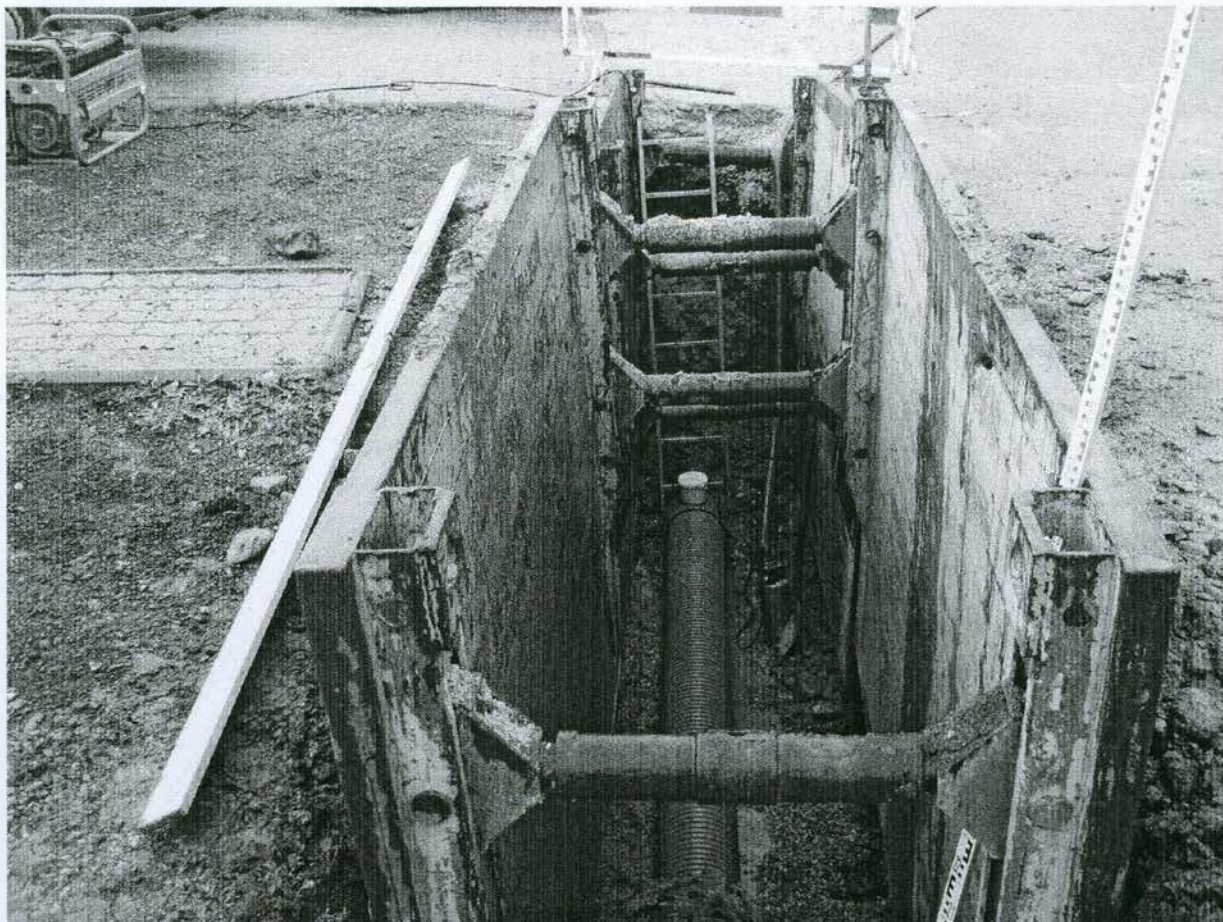

Fotografia č. 5 – SO Závažná Poruba – Položenie rúry pripravenej na obsyp a čerpanie vody



Fotografia č. 6 – SO Závažná Poruba – Odstraňovanie asfaltovej vrstvy

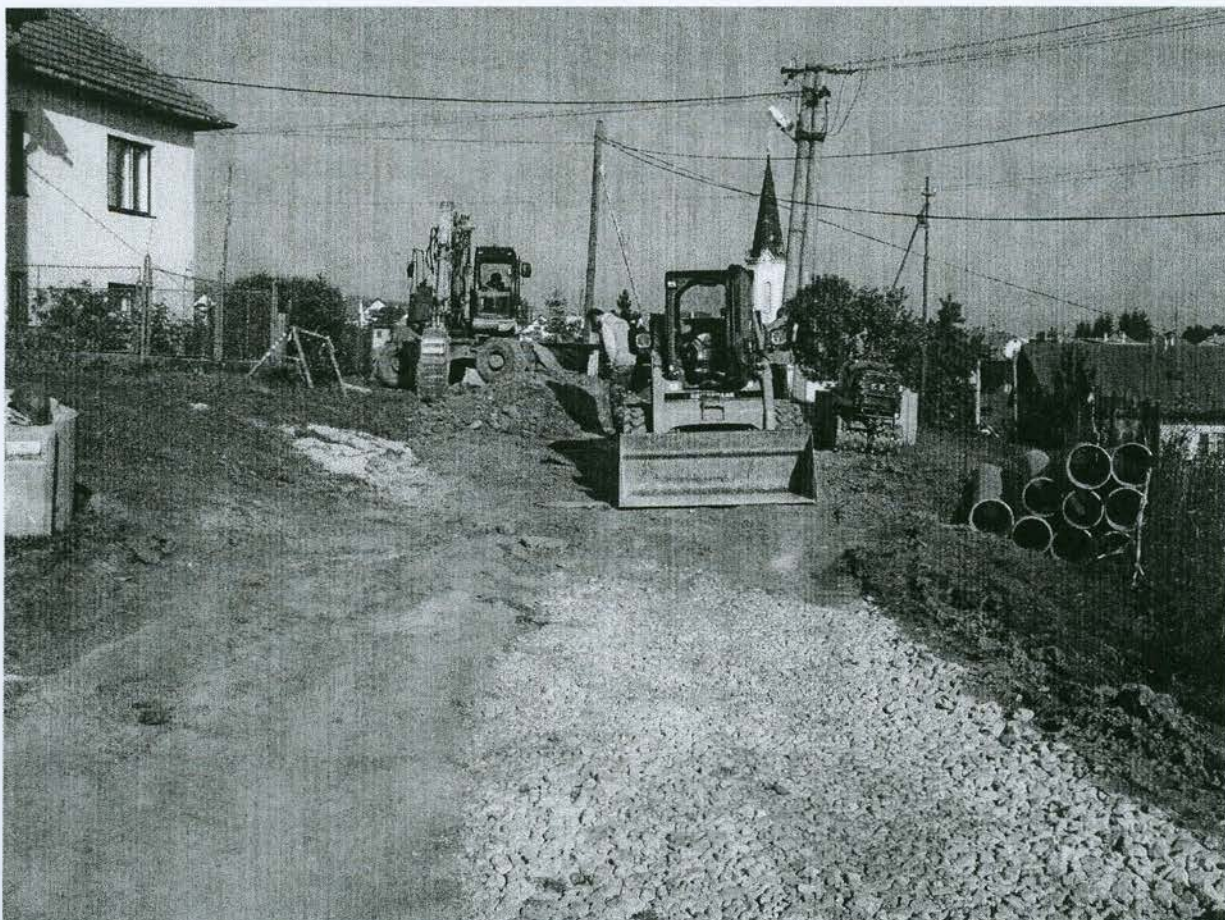

Fotografia č. 7 – SO Závažná Poruba – Úprava cesty



Fotografia č. 8 – SO Závažná Poruba – Úprava záhrady po výkope kanalizácie
